




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Outubro

- Objeto da Obra: Reforma da Unidade Básica de Saúde de Referência da Zona Rural
- Nome do Contratado: Real Construtora Eireli
- Local de Execução da Obra: Avenida Américo Lopes, sn.
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Carta Convite
- Número do Processo Licitatório: Convite – nº 01/2021-008
- Número do Contrato: 20210329
- Data de Início da Obra: 01 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 27 de Fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 180.010,34
- Valor total aplicado: R\$ 90.005,17
- Percentual aplicado: 50,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 90.005,17
- Percentual aplicado no mês vigente: 50,00 %



- Objeto da Obra: Reforma do Mercado Municipal
- Nome do Contratado: M & B Engenharia LTDA.
- Local de Execução da Obra: Praça Bernardo Carvalho, beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: Tomada de Preço – nº 02/2021-001
- Número do Contrato: 20210274
- Data de Início da Obra: 01 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 27 de fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 297.393,25
- Valor total aplicado: R\$ 101.113,71
- Percentual aplicado: 34,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 101.113,71
- Percentual aplicado no mês vigente: 34,00 %

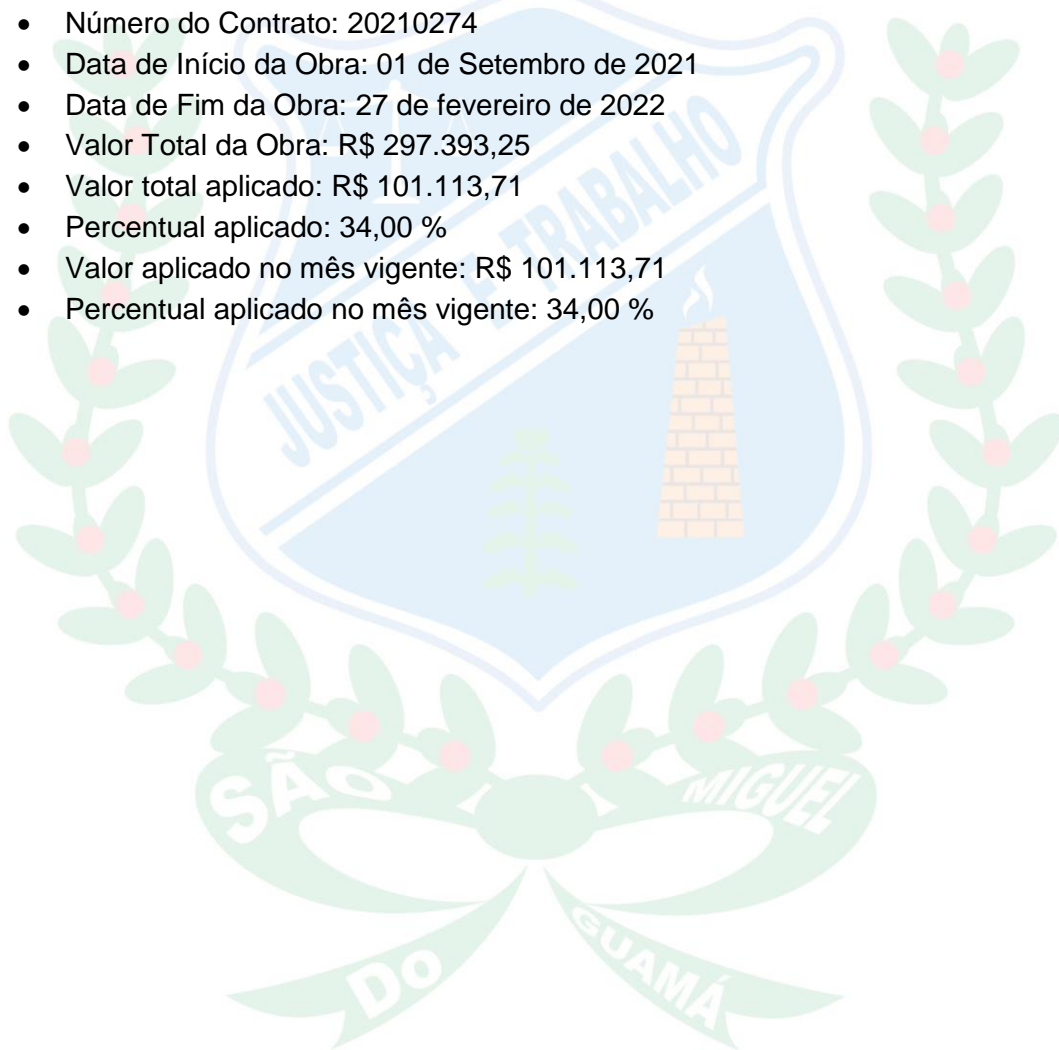



- Objeto da Obra: Revitalização da Orla do Rio Guamá
- Nome do Contratado: W e M Construções e Serviços LTDA - EPP.
- Local de Execução da Obra: Orla beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: Tomada de Preço – nº 02/2021-001
- Número do Contrato: 20210273
- Data de Início da Obra: 01 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 27 de fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 244.223,12
- Valor total aplicado: R\$ 80.593,63
- Percentual aplicado: 33,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 80.593,63
- Percentual aplicado no mês vigente: 33,00 %

