



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Novembro

- Objeto da Obra: Reforma da Unidade Básica de Saúde de Referência da Zona Rural
- Nome do Contratado: Real Construtora Eireli
- Local de Execução da Obra: Avenida Américo Lopes, sn.
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Carta Convite
- Número do Processo Licitatório: Convite – nº 01/2021-008
- Número do Contrato: 20210329
- Data de Início da Obra: 01 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 27 de Fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 180.010,34
- Valor total aplicado: R\$ 180.010,34
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 90.005,17
- Percentual aplicado no mês vigente: 50,00 %




- Objeto da Obra: Recuperação e ampliação da Praça Licurgo Peixoto e Construção de rotatória
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli
- Local de Execução da Obra: Praça Licurgo Peixoto, beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Carta Convite
- Número do Processo Licitatório: Convite – nº 01/2021-007
- Número do Contrato: 20210328
- Data de Início da Obra: 30 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 29 de março de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 112.057,92
- Valor total aplicado: R\$ 44.823,17
- Percentual aplicado: 40,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 44.823,17
- Percentual aplicado no mês vigente: 40,00 %






- Objeto da Obra: Reforma do Mercado Municipal
- Nome do Contratado: M & B Engenharia LTDA.
- Local de Execução da Obra: Praça Bernardo Carvalho, beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: Tomada de Preço – nº 02/2021-001
- Número do Contrato: 20210274
- Data de Início da Obra: 01 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 27 de fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 297.393,25
- Valor total aplicado: R\$ 202.227,42
- Percentual aplicado: 68,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 101.113,71
- Percentual aplicado no mês vigente: 34,00 %






- Objeto da Obra: Revitalização da Orla do Rio Guamá
- Nome do Contratado: W e M Construções e Serviços LTDA - EPP.
- Local de Execução da Obra: Orla beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: Tomada de Preço – nº 02/2021-001
- Número do Contrato: 20210273
- Data de Início da Obra: 01 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 27 de fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 244.223,12
- Valor total aplicado: R\$ 161.187,26
- Percentual aplicado: 66,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 80.593,63
- Percentual aplicado no mês vigente: 33,00 %

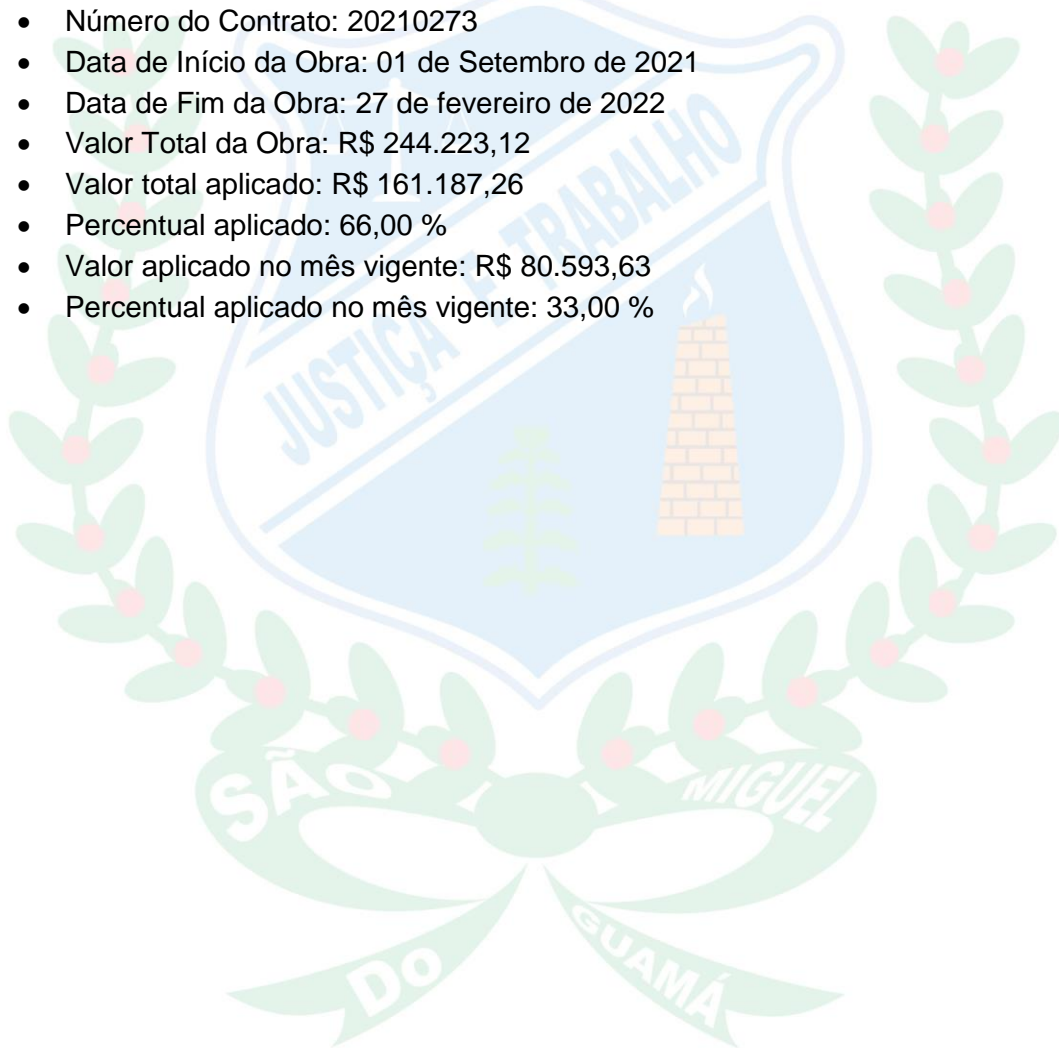



- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Demanda da Secretaria de Infraestrutura.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor total aplicado: R\$ 73.541,53
- Percentual aplicado: 5,49 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 73.541,53
- Percentual aplicado no mês vigente: 5,49 %





- Objeto da Obra: Recuperação de vias urbanas com recapeamento e tapa buraco com massa asfáltica
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Pio XII, Rua 7 de Setembro, Rua Capitão Dutra, Travessa Inácio Neto, Travessa Jorge Carneiro, Rua Conselheiro João Alfredo.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 046/2021
- Número do Contrato: 20210385
- Data de Início da Obra: 21 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total da Obra: R\$ 898.627,50
- Valor total aplicado: R\$ 898.627,50
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 898.627,50
- Percentual aplicado no mês vigente: 100,00 %

