




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Abril

- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: UBS da comunidade do Recreio
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 09 de Junho de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 119.320,14
- Percentual aplicado: 8,91 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 70.116,62
- Percentual aplicado no mês vigente: 5,24 %




- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Manutenção da EMEIF Castelo Branco
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 09 de Junho de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 275.572,22
- Percentual aplicado: 18,53 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 119.880,55
- Percentual aplicado no mês vigente: 8,06 %

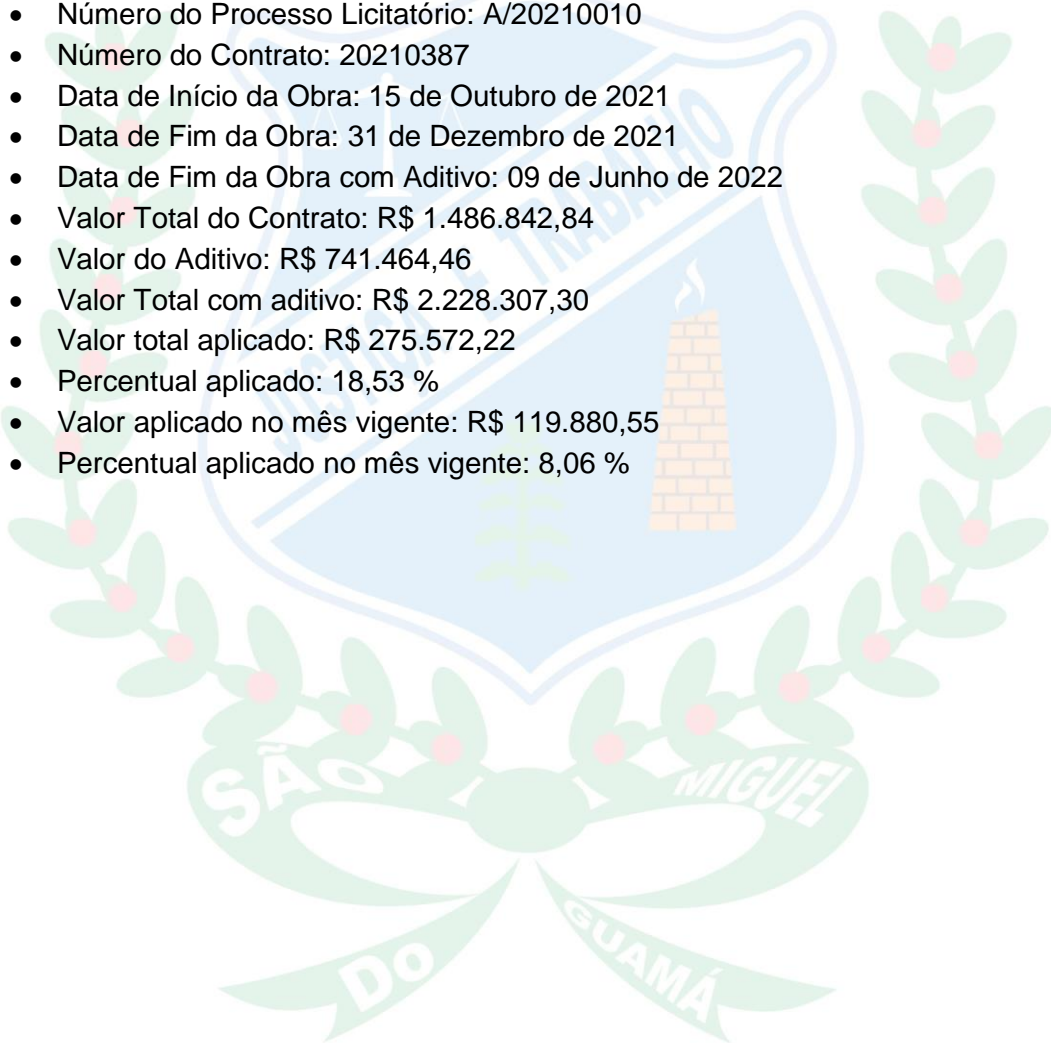




- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Alacid da Silva Nunes
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 09 de Junho de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 254.697,91
- Percentual aplicado: 17,13 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 80.862,70
- Percentual aplicado no mês vigente: 5,44 %

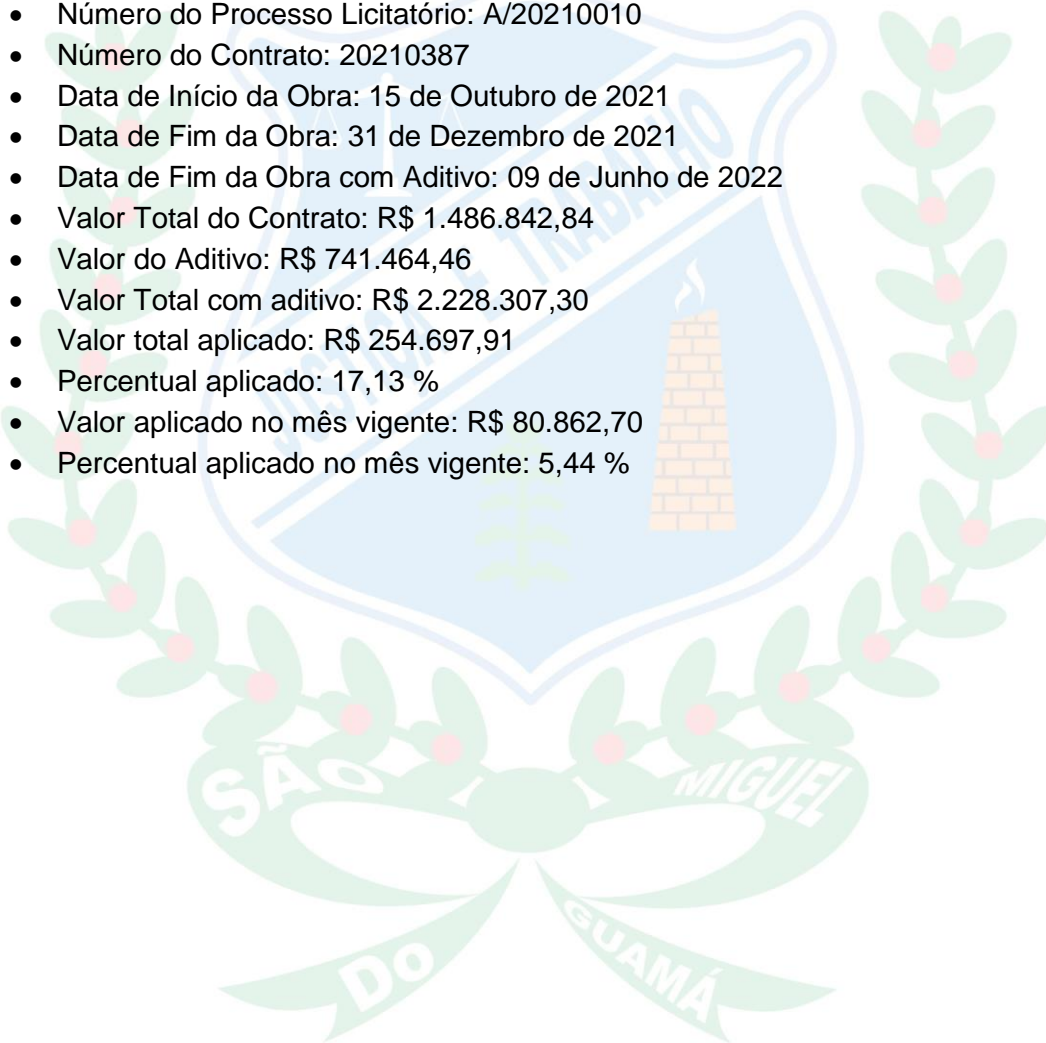




- Objeto da Obra: Reforma do Posto de Saúde do Perpétuo Socorro.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel Com Agostinho Siqueira.
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-001
- Número do Contrato: 20221647
- Data de Início da Obra: 10 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Setembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 461.271,93
- Valor total aplicado: R\$ 103.094,27
- Percentual aplicado: 22,35 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 50.048,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 10,85 %

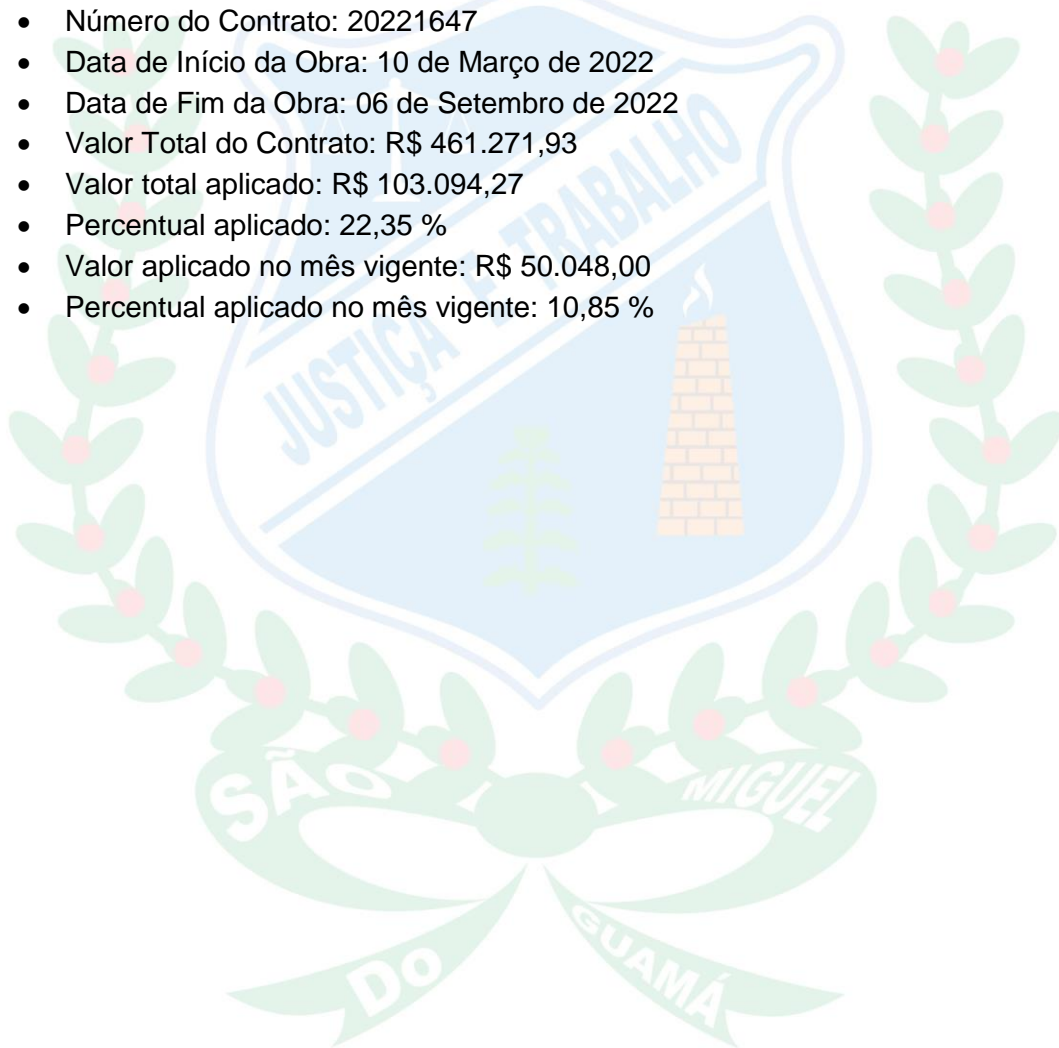




- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua da Vitória – Moacir Neto
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 174.047,52
- Percentual aplicado: 55,01 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 12.022,40
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,80 %

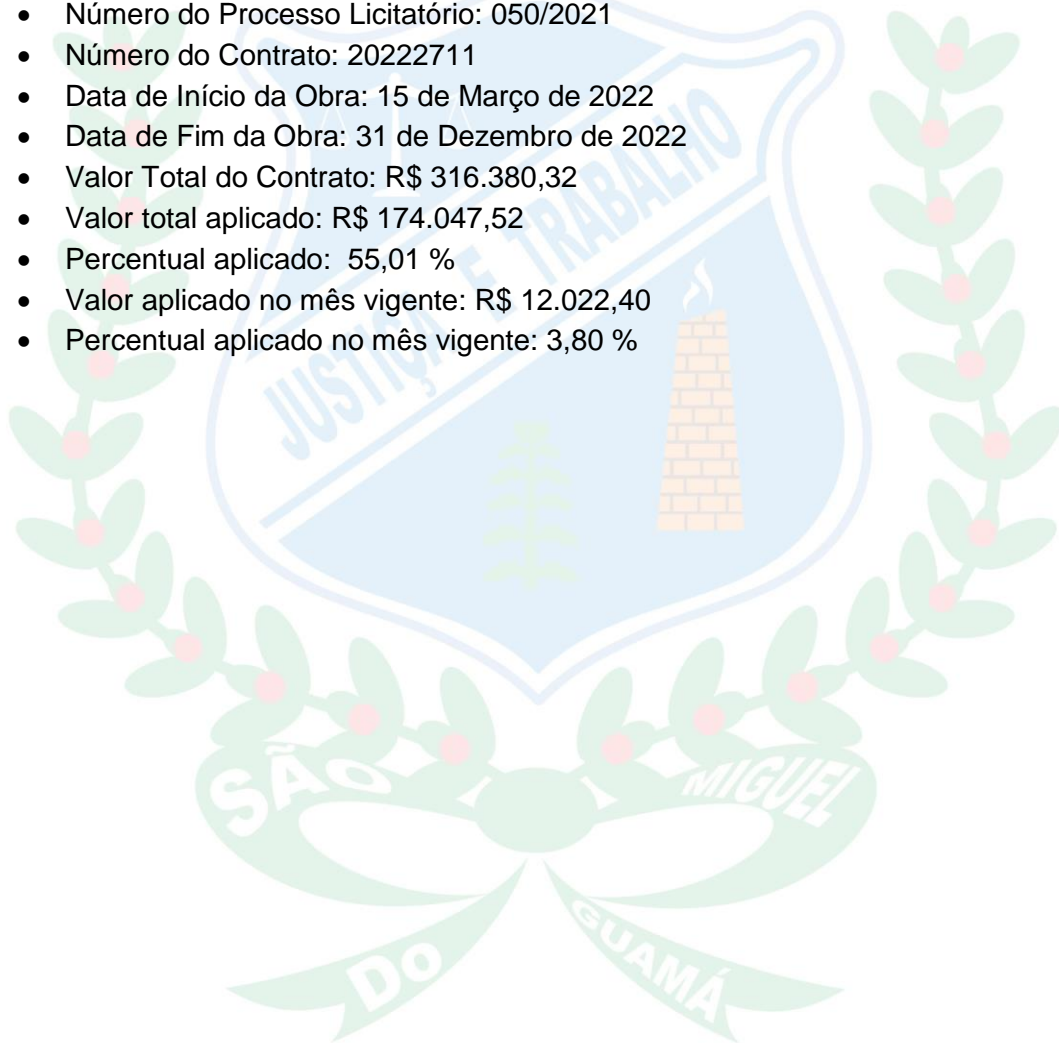




- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Inácio Neto – Vila Nova
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 174.047,52
- Percentual aplicado: 55,01 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 28.358,40
- Percentual aplicado no mês vigente: 8,92 %

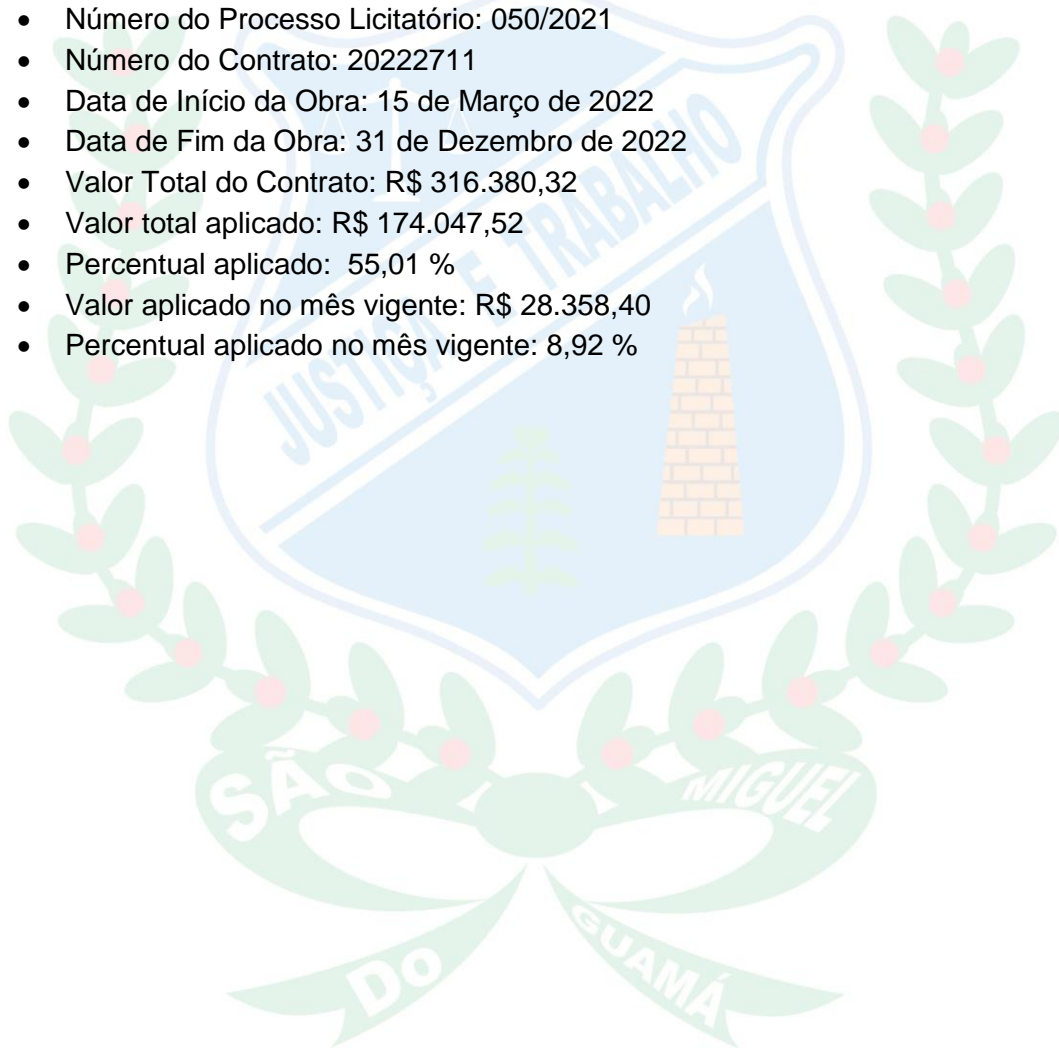




- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Jonas Pacheco – Maurício Ataíde
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 174.047,52
- Percentual aplicado: 55,01 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 47.769,78
- Percentual aplicado no mês vigente: 15,10 %

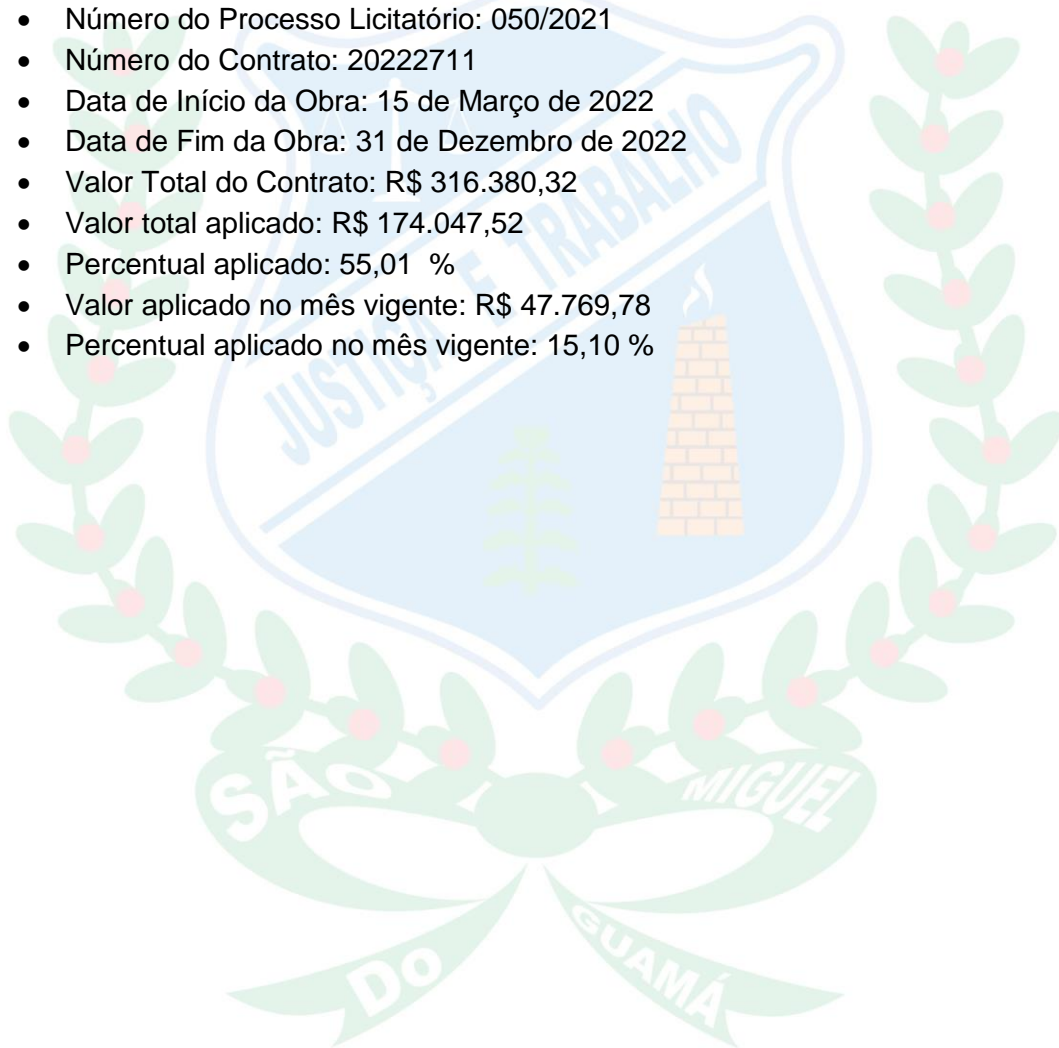




- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Santo Expedito – Moacir Neto
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 174.047,52
- Percentual aplicado: 55,01 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 7.680,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 2,43 %

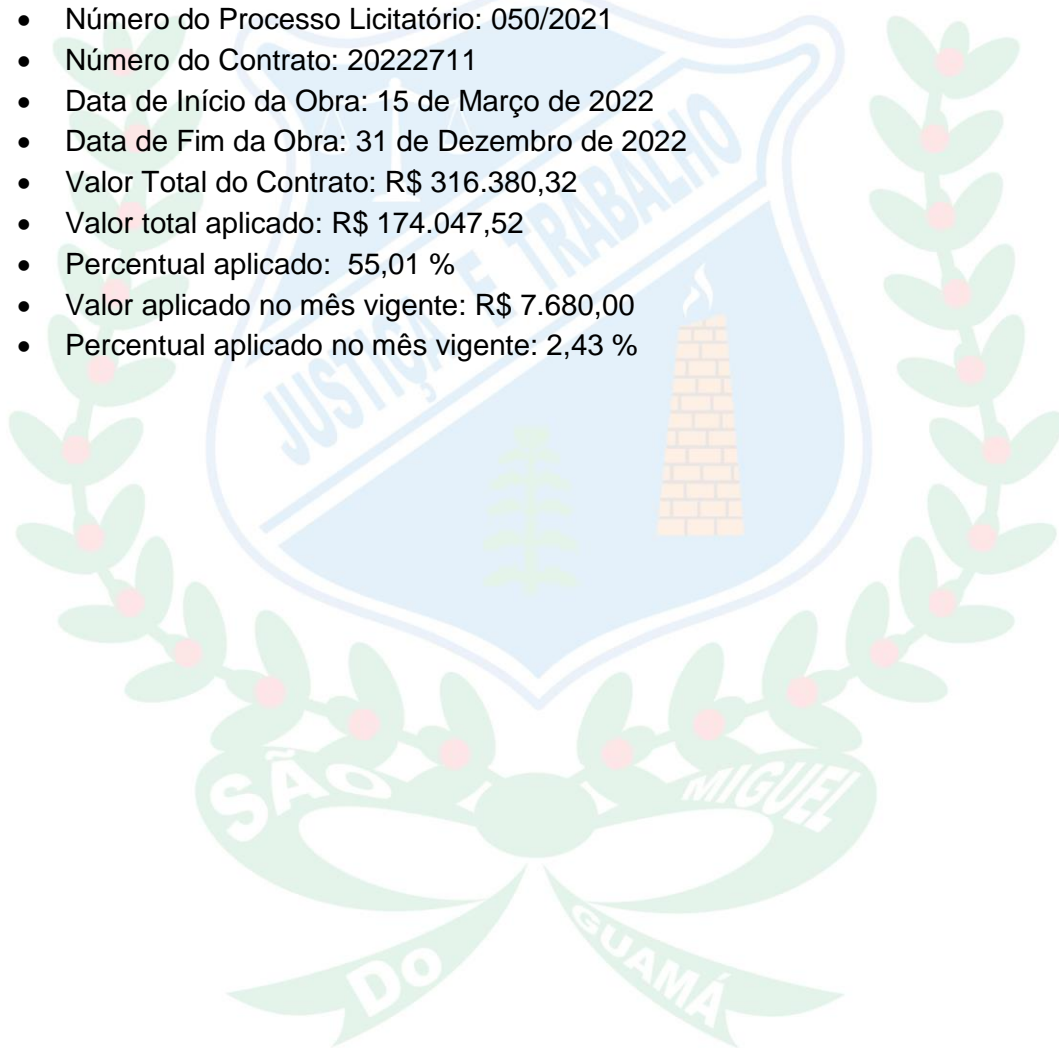



- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Luiz Francisco de Almeida - Palmeiras
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 174.047,52
- Percentual aplicado: 55,01 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 30.256,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 9,56 %

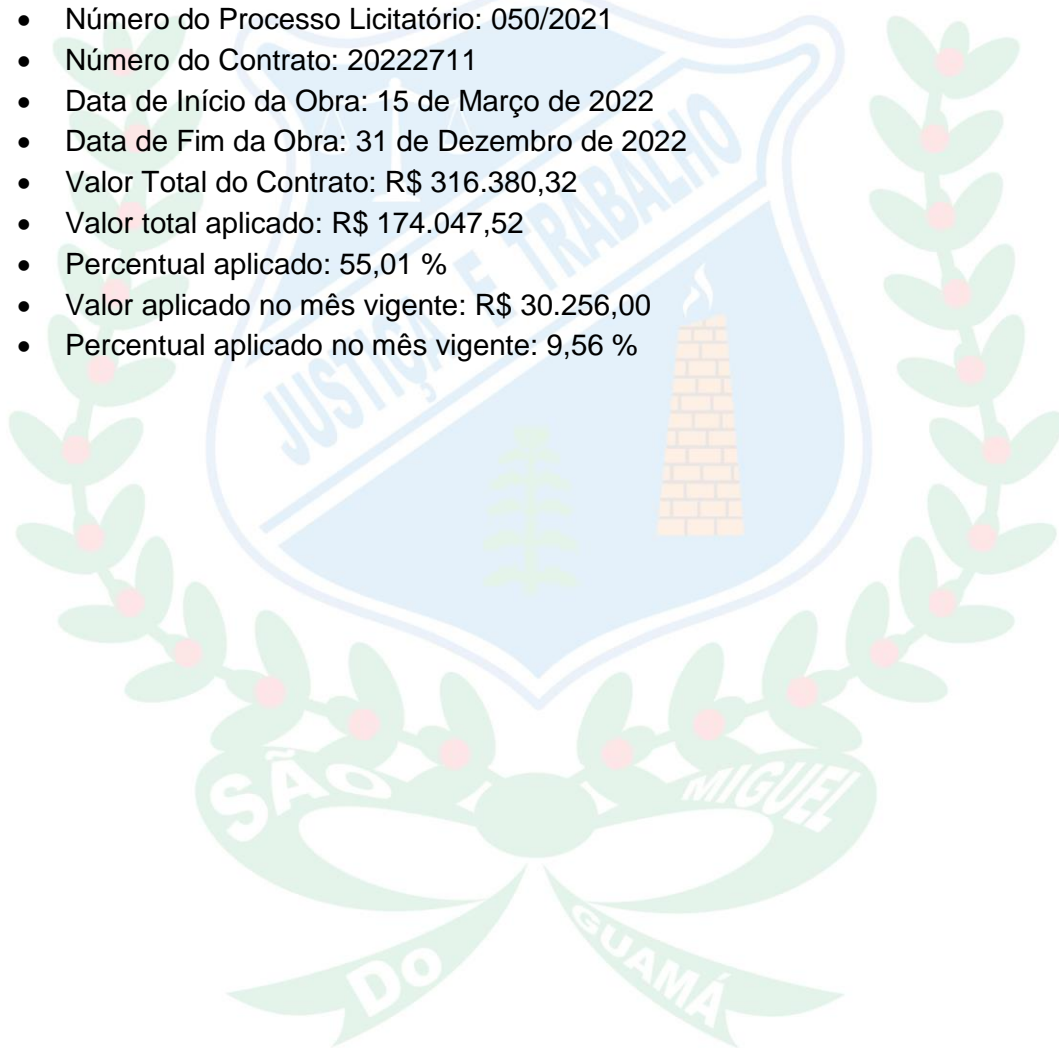



- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Avenida João Teixeira Barbosa – Vila França
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 174.047,52
- Percentual aplicado: 55,01 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 22.752,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 7,19 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Socorro Machado – Maurício Ataíde
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 174.047,52
- Percentual aplicado: 55,01 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 7.360,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 2,33 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua do Beco do Muro Alto – Padre Ângelo
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 174.047,52
- Percentual aplicado: 55,01 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 17.848,94
- Percentual aplicado no mês vigente: 5,64 %






- Objeto da Obra: Recuperação e ampliação da Praça Licurgo Peixoto e Construção de rotatória
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli
- Local de Execução da Obra: Praça Licurgo Peixoto, beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Carta Convite
- Número do Processo Licitatório: Convite – nº 01/2021-007
- Número do Contrato: 20210328
- Data de Início da Obra: 30 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 29 de março de 2022
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 27 de Junho de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 112.057,92
- Valor do Aditivo: R\$ 40.901,14
- Valor Total com Aditivo: R\$ 152.959,06
- Valor total aplicado: R\$ 152.952,34
- Percentual aplicado: 136,49 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 52.100,21
- Percentual aplicado no mês vigente: 46,49 %





- Objeto da Obra: Reforma do Mercado Municipal
- Nome do Contratado: M & B Engenharia LTDA.
- Local de Execução da Obra: Praça Bernardo Carvalho, beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: Tomada de Preço – nº 02/2021-001
- Número do Contrato: 20210274
- Data de Início da Obra: 01 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 27 de fevereiro de 2022
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 28 de maio de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 297.393,25
- Valor do Aditivo: R\$ 118.462,80
- Valor Total com Aditivo: R\$ 415.856,05
- Valor total aplicado: R\$ 415.834,30
- Percentual aplicado: 139,83 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 124.388,90
- Percentual aplicado no mês vigente: 42,83 %

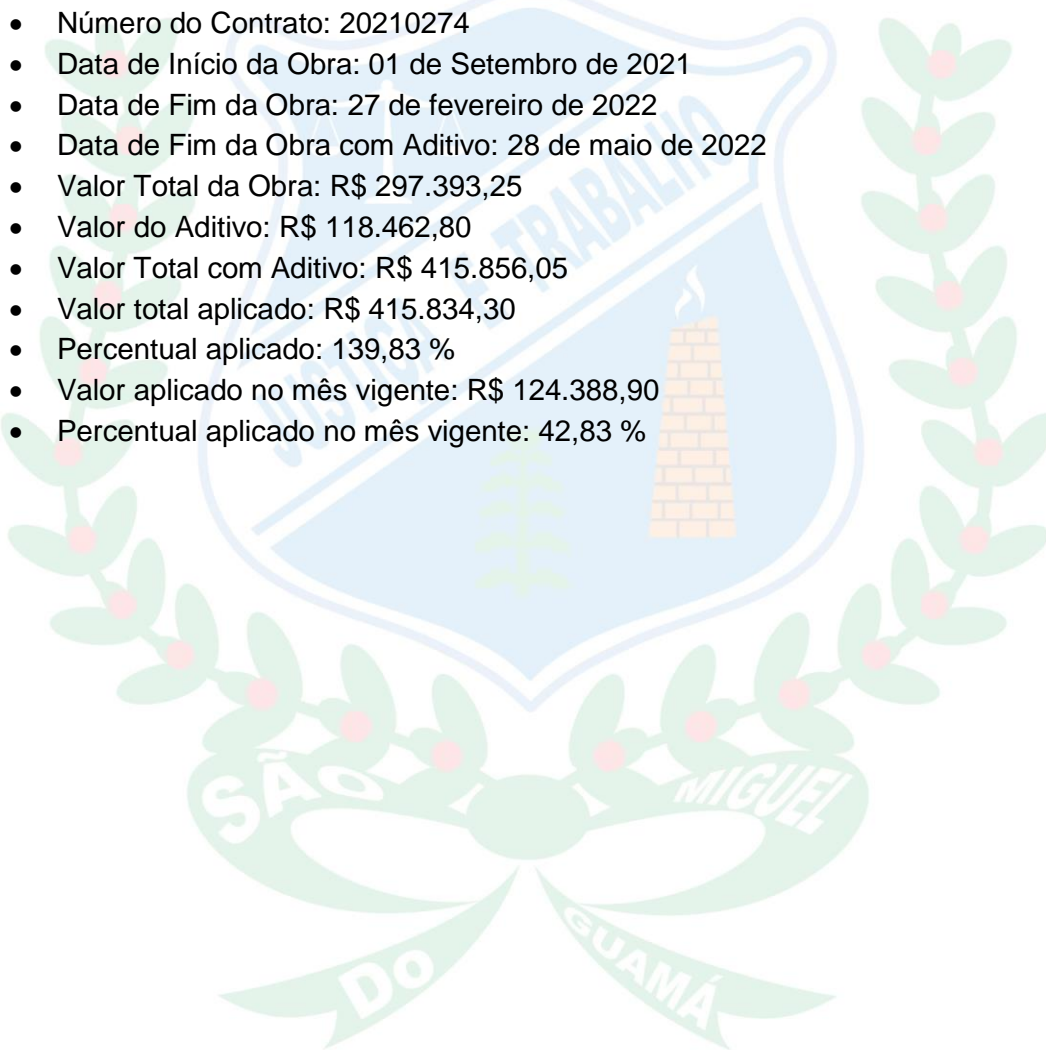



- Objeto da Obra: Revitalização da Orla do Rio Guamá
- Nome do Contratado: W e M Construções e Serviços LTDA - EPP.
- Local de Execução da Obra: Orla beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: Tomada de Preço – nº 02/2021-001
- Número do Contrato: 20210273
- Data de Início da Obra: 01 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 27 de fevereiro de 2022
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 28 de maio de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 244.223,12
- Valor do Aditivo: R\$ 60.137,78
- Valor Total com Aditivo: R\$ 304.360,90
- Valor total aplicado: R\$ 304.344,99
- Percentual aplicado: 124,62 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 69.890,80
- Percentual aplicado no mês vigente: 28,62 %

