




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Junho

- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Agostinho Siqueira entre Pio XII e 7 de Setembro.
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 120.641,47
- Percentual aplicado: 41,61 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 48.242,89
- Percentual aplicado no mês vigente: 16,64 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 14.433,93
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 4,98 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Sem Denominação 2
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 120.641,47
- Percentual aplicado: 41,61 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 48.242,89
- Percentual aplicado no mês vigente: 16,64 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 18.083,88
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 6,24 %

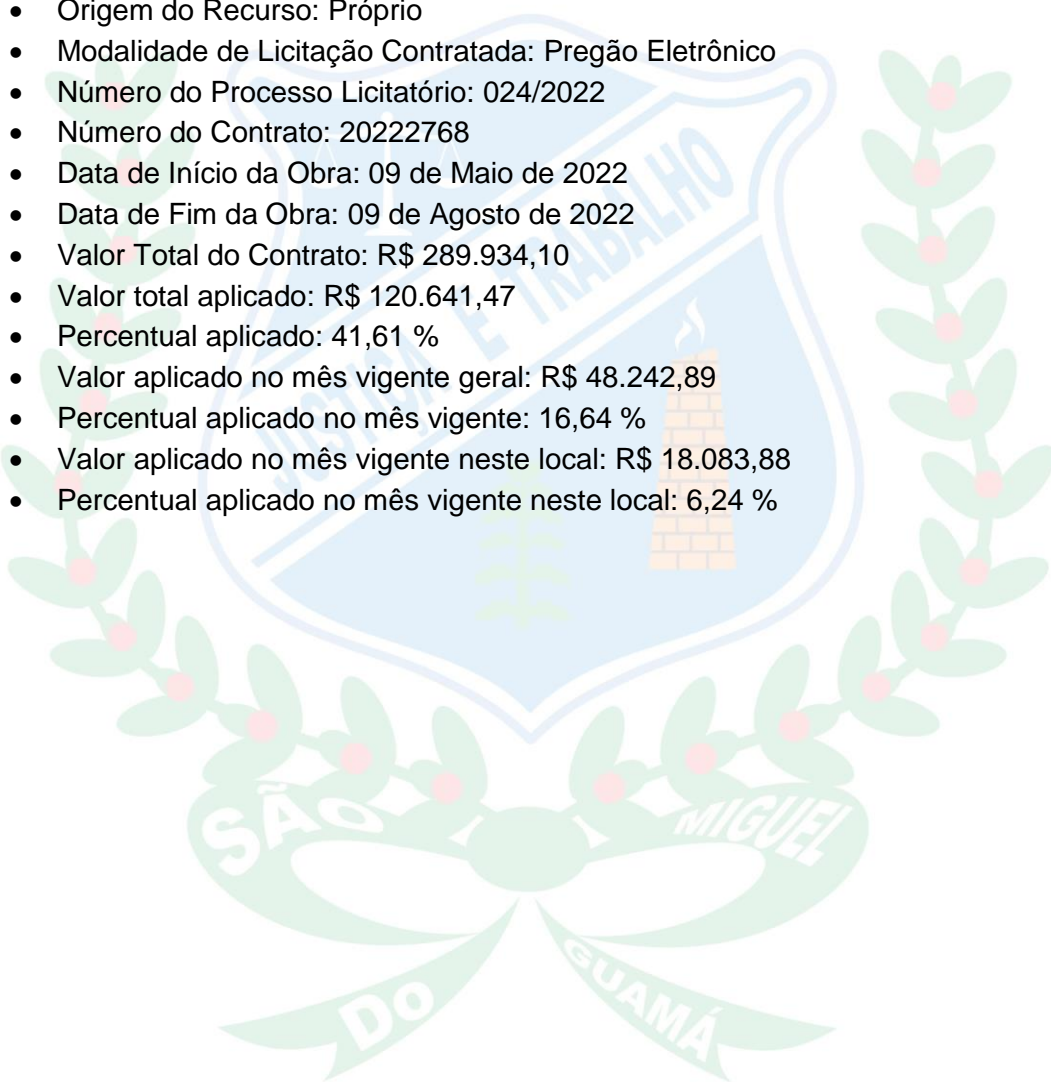




- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua 7 de Janeiro (Fortalezinha)
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 120.641,47
- Percentual aplicado: 41,61 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 48.242,89
- Percentual aplicado no mês vigente: 16,64 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 15.725,08
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 5,42 %





- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Passagem Felipe Brito (EMEF Raimunda Pinho).
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222765
- Data de Início da Obra: 06 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 904.659,52
- Valor total aplicado: R\$ 721.314,13
- Percentual aplicado: 79,73 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 301.109,26
- Percentual aplicado no mês vigente: 33,28 %

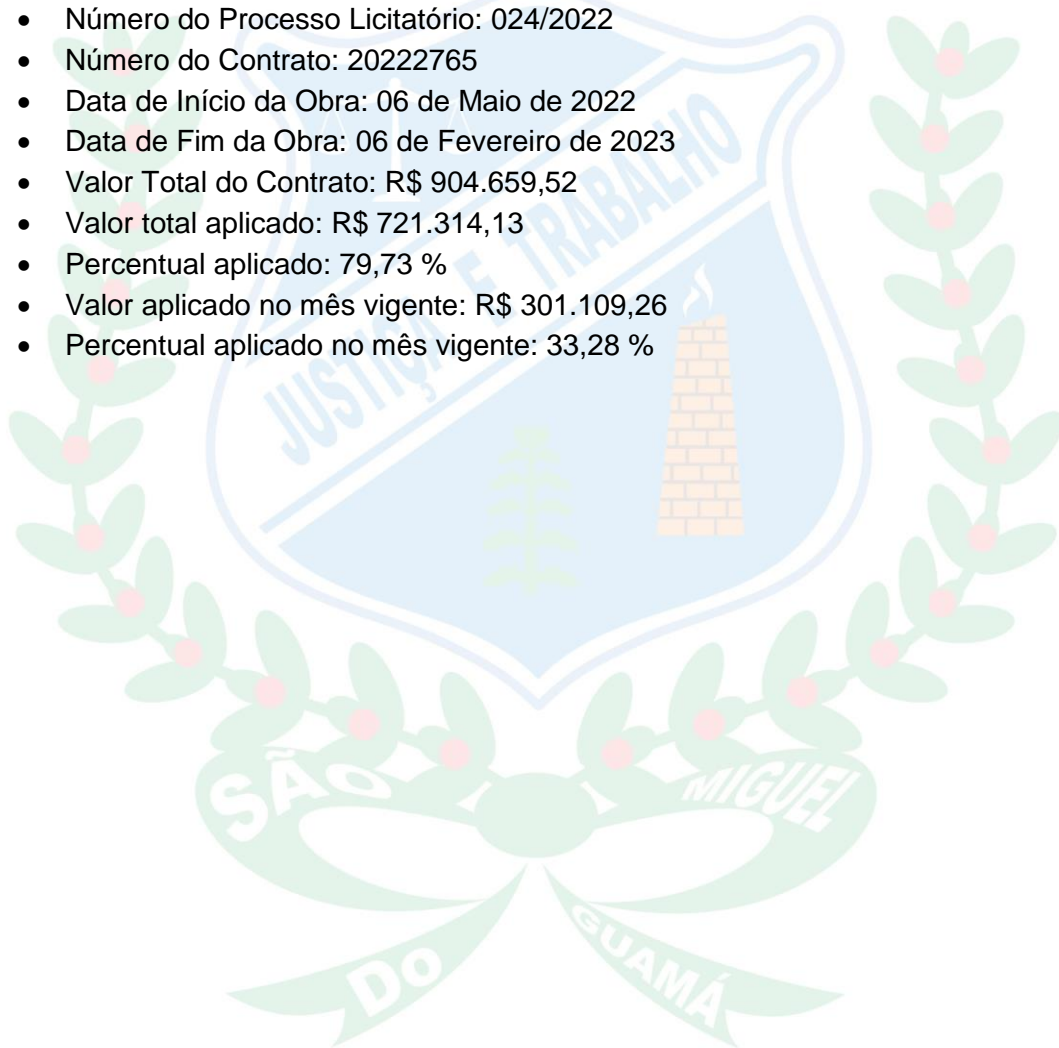



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Fernando Cruz (EMEF Padre Leandro Pinheiro).
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222773
- Data de Início da Obra: 10 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 10 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.122.215,47
- Valor total aplicado: R\$ 704.230,75
- Percentual aplicado: 62,75 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 704.230,75
- Percentual aplicado no mês vigente: 62,75 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Agostinho Siqueira
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 297.633,76
- Percentual aplicado: 94,07 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 23.064,64
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 7,29 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 4.352,00
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 1,38 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Aparecida
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 297.633,76
- Percentual aplicado: 94,07 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 23.064,64
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 7,29 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 8.211,20
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 2,60 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua 7 de Janeiro (Fortalezinha)
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 297.633,76
- Percentual aplicado: 94,07 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 23.064,64
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 7,29 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 3.328,00
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 1,05 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Sem denominação entre Miguel Getúlio de Feliciano da Costa
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 297.633,76
- Percentual aplicado: 94,07 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 23.064,64
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 7,29 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 7.173,44
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 2,27 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua da Vitória (Moacir Neto)
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20221683
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 139.502,70
- Valor total aplicado: R\$ 110.259,64
- Percentual aplicado: 79,04 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 13.893,56
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 9,96 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 13.893,56
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 9,96 %





- Objeto da Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde no bairro Padre Ângelo, no município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel de Bulhões s/n, Padre Ângelo
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-002
- Número do Contrato: 20210476
- Data de Início da Obra: 17 de novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 17 de maio de 2022
- Data de Fim da Obra com aditivo: 17 de novembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.172.412,70
- Valor total aplicado: R\$ 1.016.481,81
- Percentual aplicado: 86,70 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 500.620,22
- Percentual aplicado no mês vigente: 42,70 %






- Objeto da Obra: Reforma do Posto de Saúde do Perpétuo Socorro.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel Com Agostinho Siqueira.
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-001
- Número do Contrato: 20221647
- Data de Início da Obra: 10 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Setembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 461.271,93
- Valor total aplicado: R\$ 174.591,42
- Percentual aplicado: 37,85 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 71.497,15
- Percentual aplicado no mês vigente: 15,50 %






- Objeto da Obra: Construção do Prédio da EMEF Raimunda de Oliveira Machado – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Transterra Logística e Empreendimentos LTDA.
- Local de Execução da Obra: Av Cipriano Mendes – sn.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20217818
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.655.510,74
- Valor total aplicado: R\$ 173.828,63
- Percentual aplicado: 10,50 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 69.531,45
- Percentual aplicado no mês vigente: 4,20 %






- Objeto da Obra: Recuperação de vias urbanas com recapeamento e tapa buraco com massa asfáltica
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas ruas de São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 046/2021
- Número do Contrato: 20220002
- Data de Início da Obra: 01 de Janeiro de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.407.210,55
- Valor total aplicado: R\$ 1.366.072,38
- Percentual aplicado: 97,08 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 265.792,33
- Percentual aplicado no mês vigente: 24,16 %

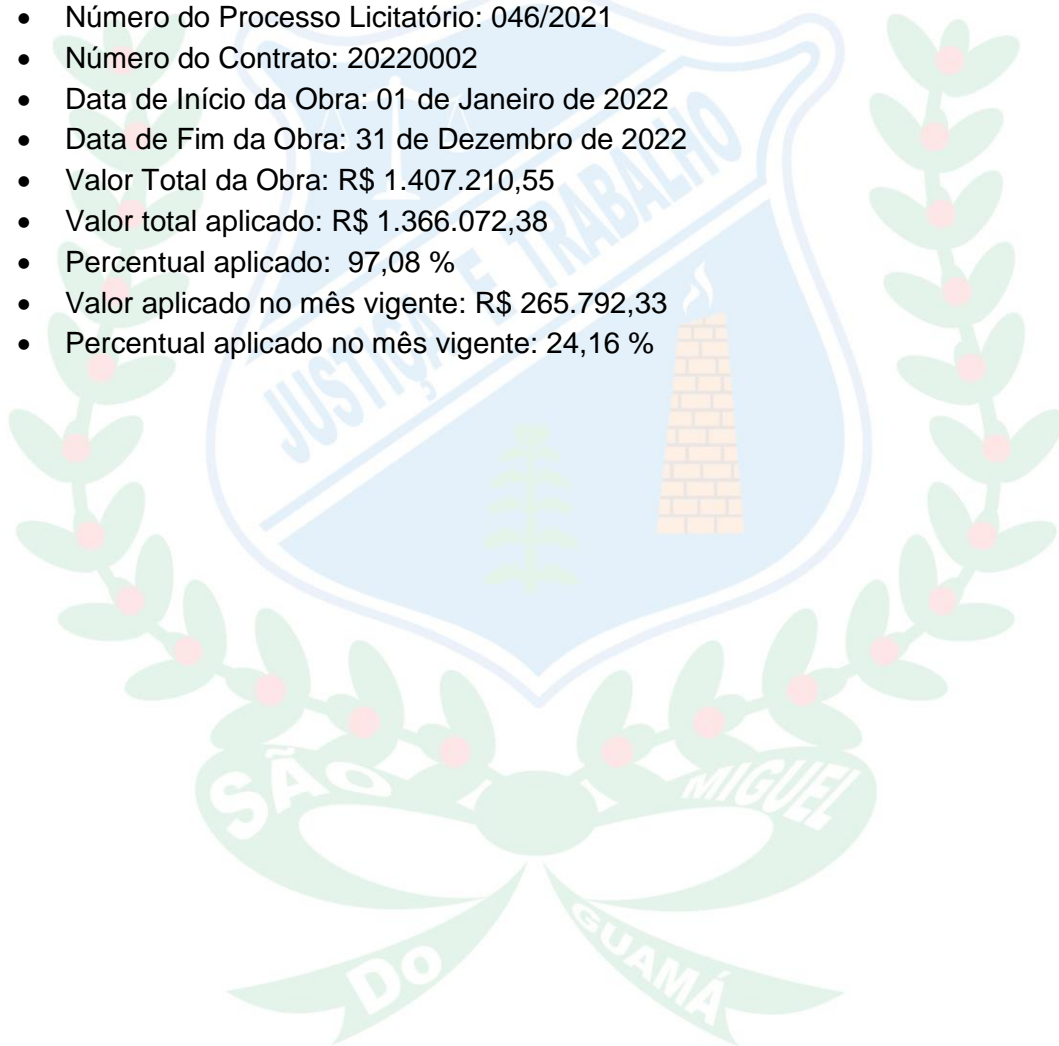



- Objeto da Obra: Recuperação das vicinais de acesso às comunidades quilombolas da região do Crauateua – Zona Rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Ramal da Região do Crauateua – Zona Rural de São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Governo Federal - INCRA
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-006
- Número do Contrato: 20217874
- Data de Início da Obra: 29 de dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 24 de dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.005.679,60
- Valor total aplicado: R\$ 142.203,10
- Percentual aplicado: 14,14 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 142.203,10
- Percentual aplicado no mês vigente: 14,14 %

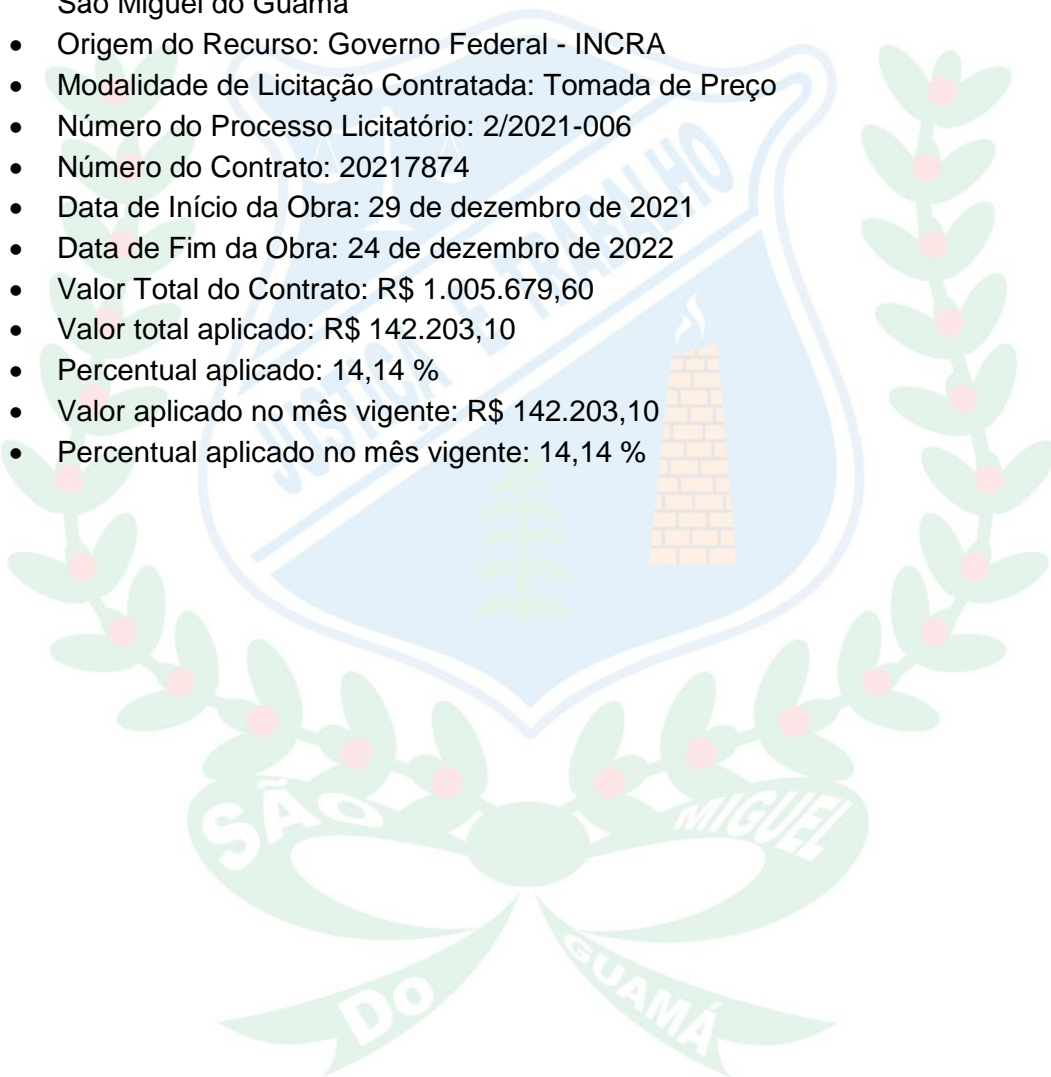



- Objeto da Obra: Reconstrução da Ponte de Madeira do Ramal da Bacabeira – Zona Rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Top Level Construtora.
- Local de Execução da Obra: Ramal da Bacabeira – Zona Rural de São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Dispensa de Licitação
- Número do Processo Licitatório: 7/2022-0026
- Número do Contrato: 20222801
- Data de Início da Obra: 02 de Junho de 2022
- Data de Fim da Obra: 01 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 113.129,43
- Valor total aplicado: R\$ 113.129,43
- Percentual aplicado: 100 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 113.129,43
- Percentual aplicado no mês vigente: 100 %

