



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Agosto

---

- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Jardinagem e Estacionamento em frente a EMEF Hilda de Oliveira
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 268.516,78
- Percentual aplicado: 92,61 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 11.217,91
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,87 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 11.217,91
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 3,87 %




- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Jardinagem na EMEIF Maria Raimunda
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222870
- Data de Início da Obra: 20 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 20 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 336.606,35
- Valor total aplicado: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado no mês vigente: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 3.728,00
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 1,11 %






- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Moacir Neto
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222870
- Data de Início da Obra: 20 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 20 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 336.606,35
- Valor total aplicado: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado no mês vigente: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 12.760,94
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 3,79 %

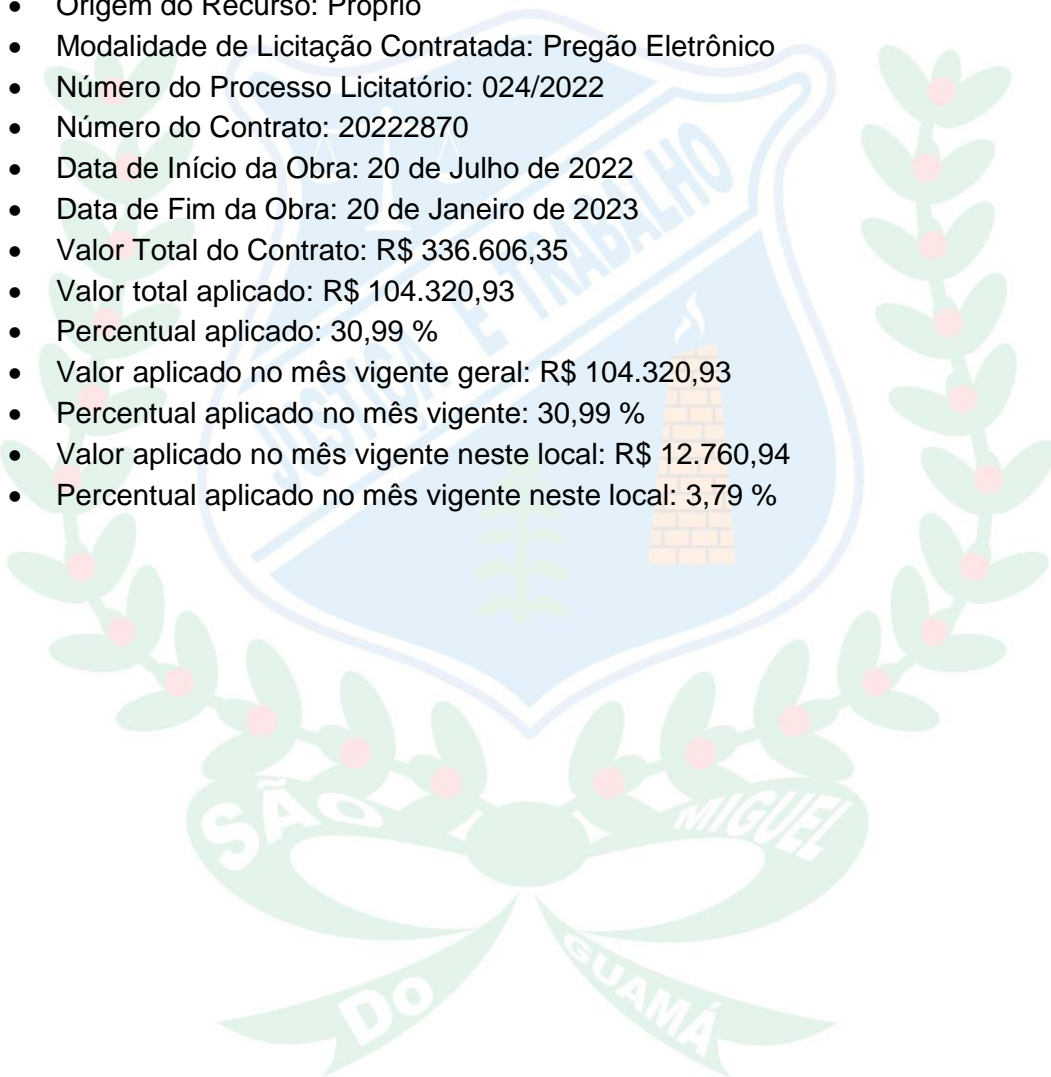




- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua da Bomba
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222870
- Data de Início da Obra: 20 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 20 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 336.606,35
- Valor total aplicado: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado no mês vigente: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 10.078,26
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 2,99 %

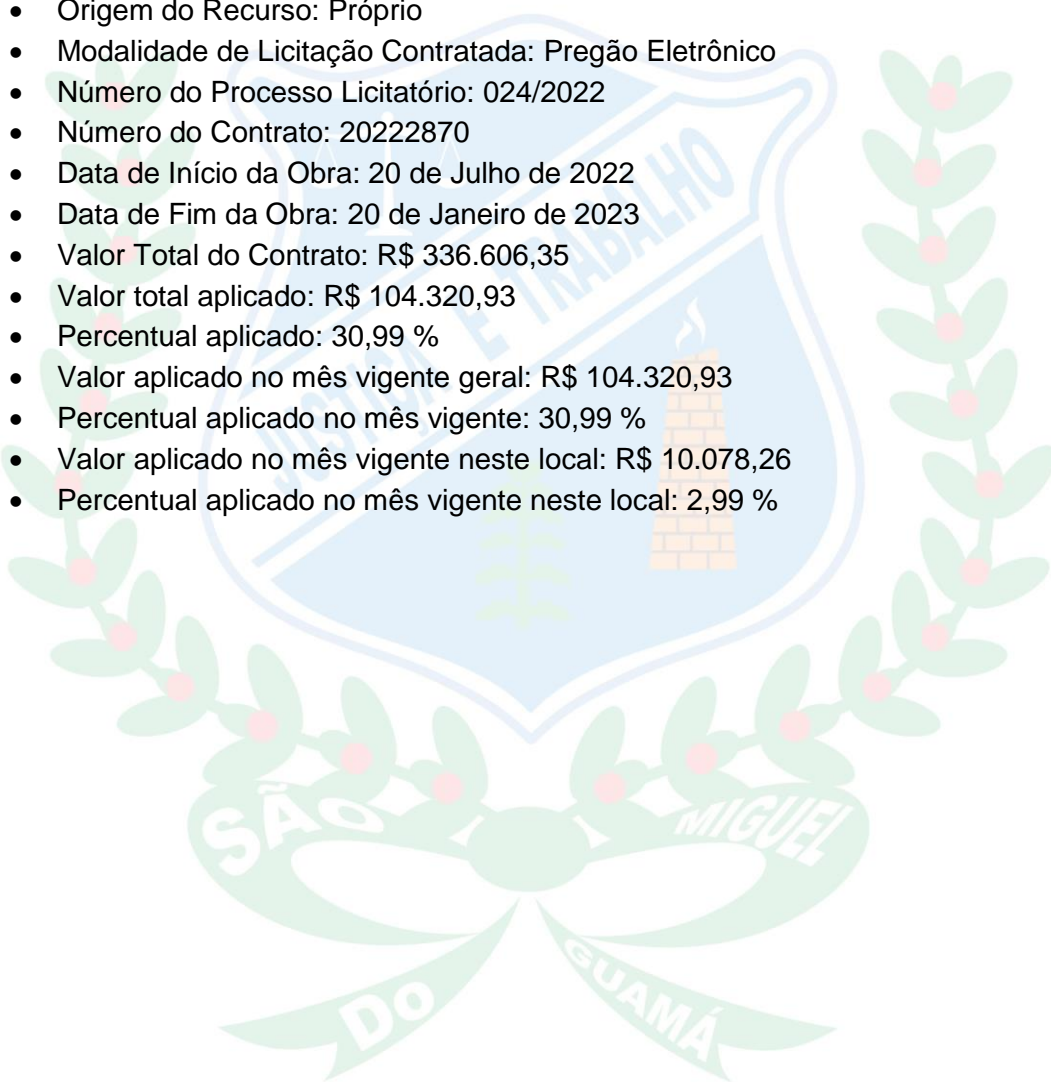



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Estevão de Araújo
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222870
- Data de Início da Obra: 20 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 20 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 336.606,35
- Valor total aplicado: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado no mês vigente: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 13.187,13
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 3,92 %

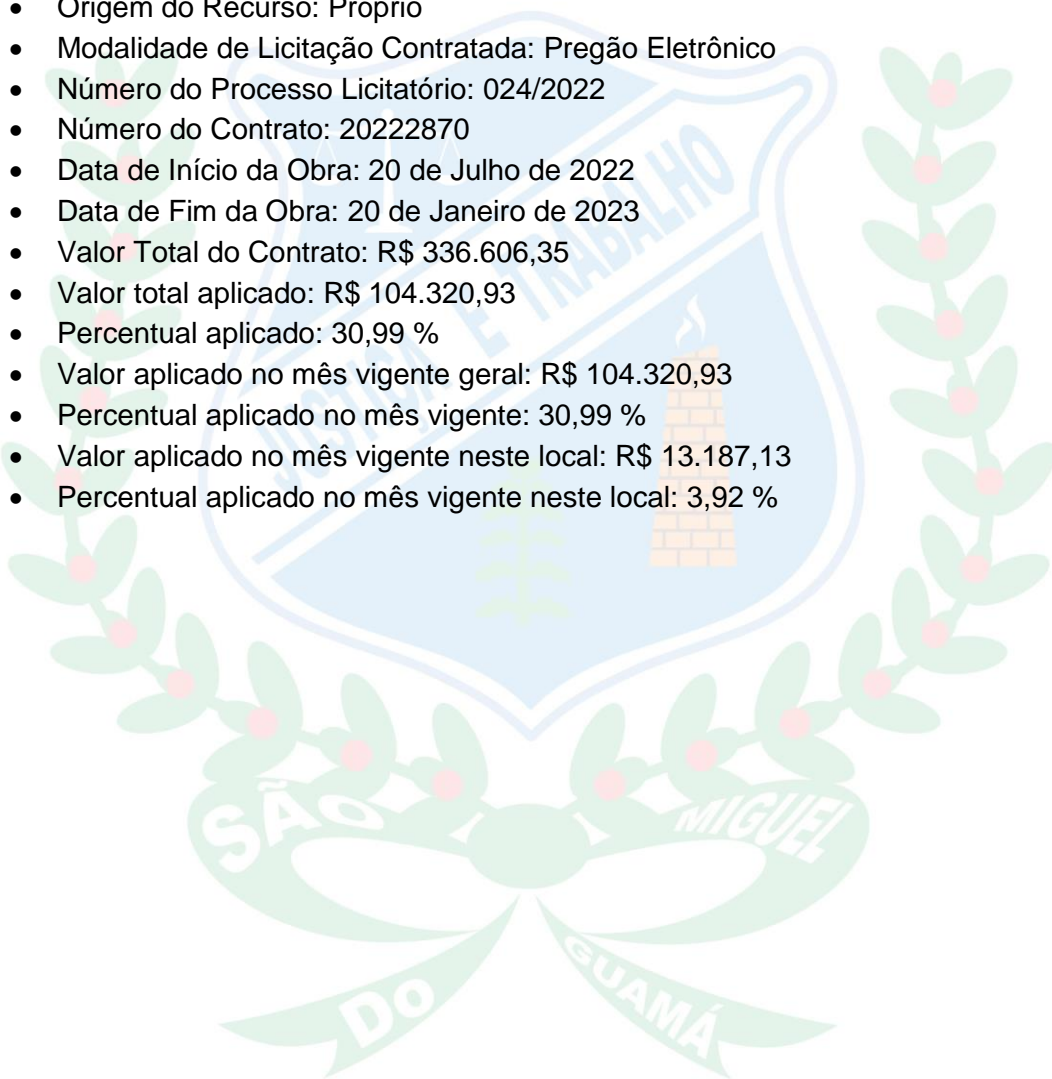




- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Final da Rua Coca Cola
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222870
- Data de Início da Obra: 20 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 20 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 336.606,35
- Valor total aplicado: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado no mês vigente: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 17.065,80
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 5,07 %






- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Jardim América
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222870
- Data de Início da Obra: 20 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 20 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 336.606,35
- Valor total aplicado: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 104.320,93
- Percentual aplicado no mês vigente: 30,99 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 17.065,80
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 5,07 %

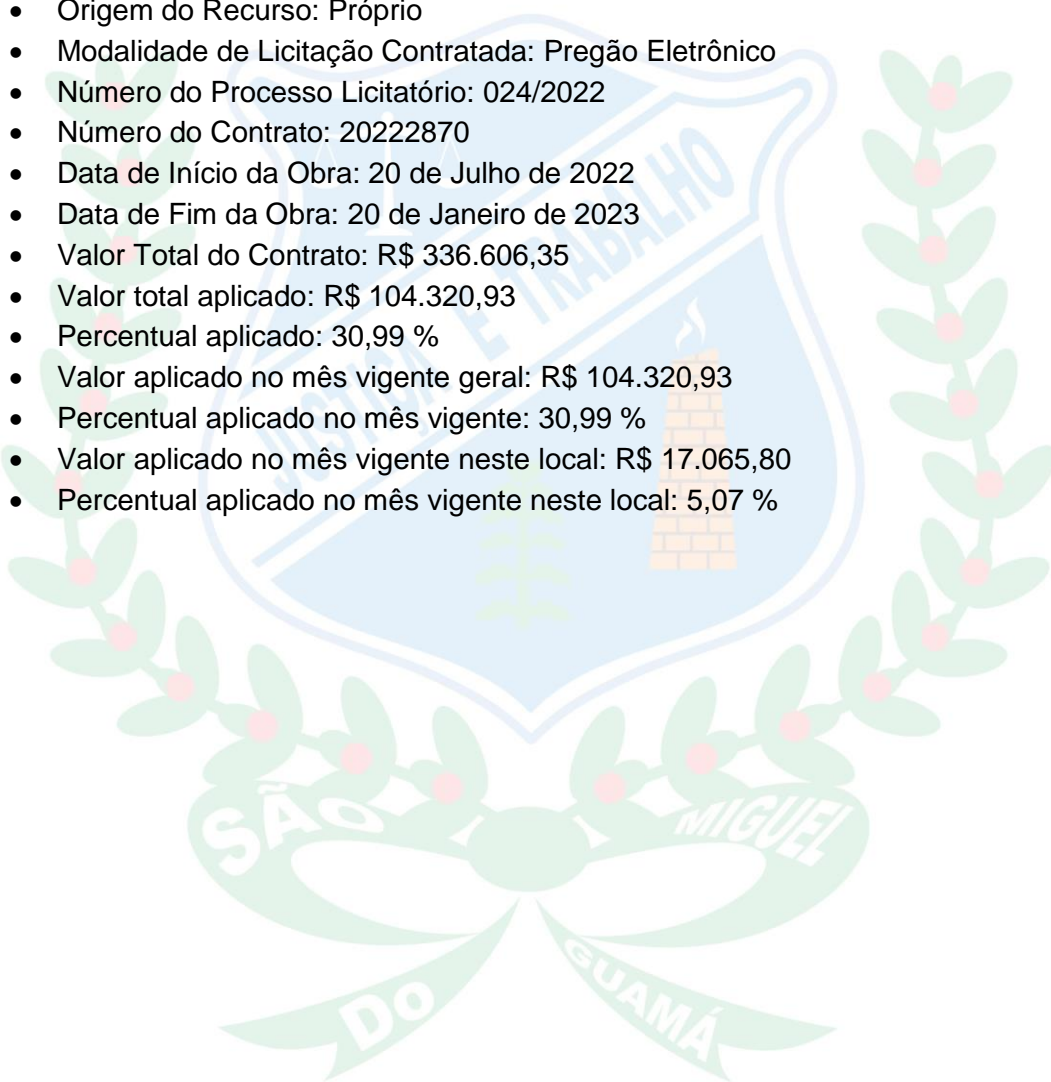



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Mão de Obra para Construção do Posto de Saúde de Santa Rita de Barreiras
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222824
- Data de Início da Obra: 14 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 15 de Maio de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 87.359,24
- Valor total aplicado: R\$ 43.088,10
- Percentual aplicado: 49,32 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 43.088,10
- Percentual aplicado no mês vigente: 49,32 %

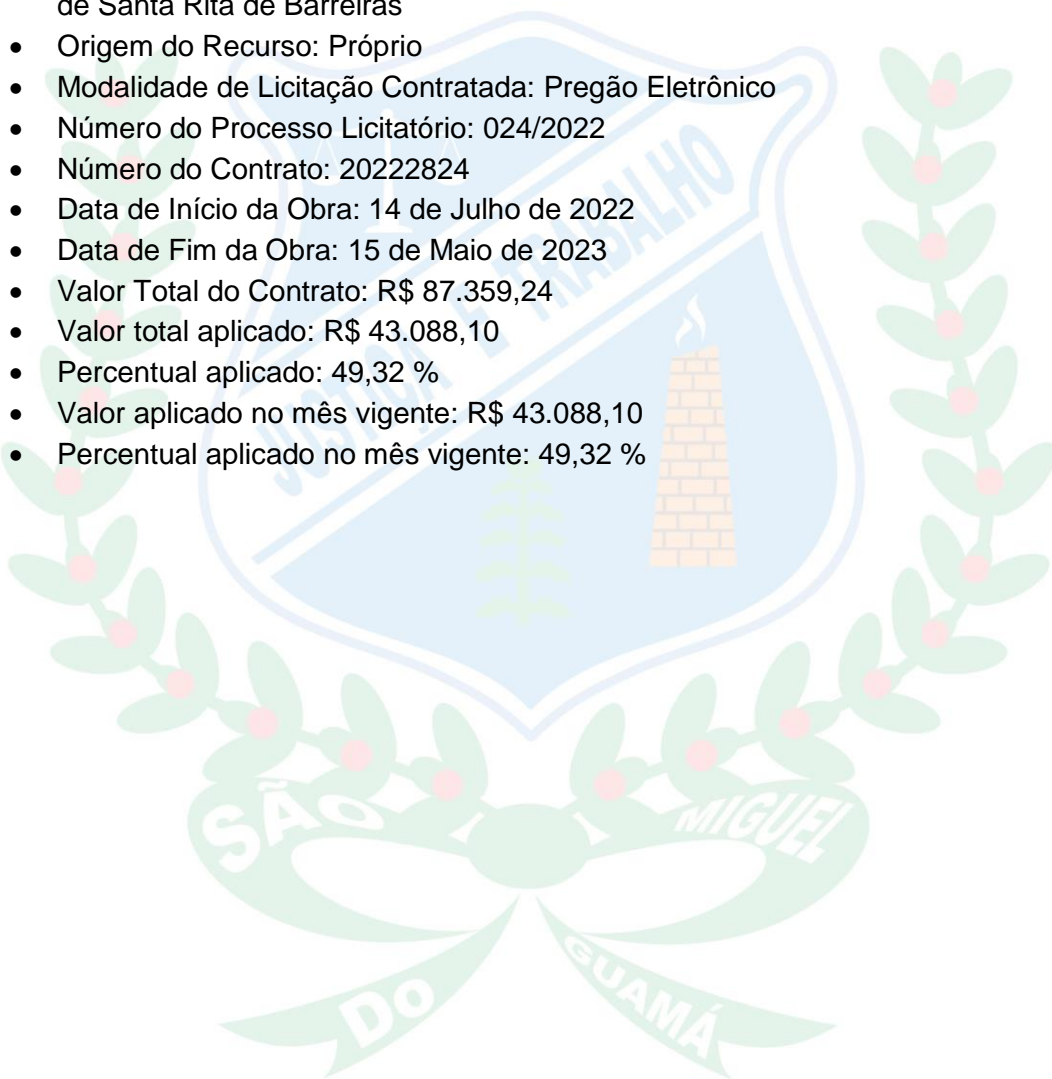





- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Passagem Felipe Brito (EMEF Raimunda Pinho).
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222765
- Data de Início da Obra: 06 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 904.659,52
- Valor total aplicado: R\$ 904.659,52
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 18.080,69
- Percentual aplicado no mês vigente: 2,00 %






- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Fernando Cruz (EMEF Padre Leandro Pinheiro).
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222773
- Data de Início da Obra: 10 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 10 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.122.215,47
- Valor total aplicado: R\$ 1.122.215,47
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 16.268,81
- Percentual aplicado no mês vigente: 1,45 %






- Objeto da Obra: Reforma do Posto de Saúde do Perpétuo Socorro.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel Com Agostinho Siqueira.
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-001
- Número do Contrato: 20221647
- Data de Início da Obra: 10 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Setembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 461.271,93
- Valor total aplicado: R\$ 224.870,06
- Percentual aplicado: 48,75 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 50.278,64
- Percentual aplicado no mês vigente: 10,90 %

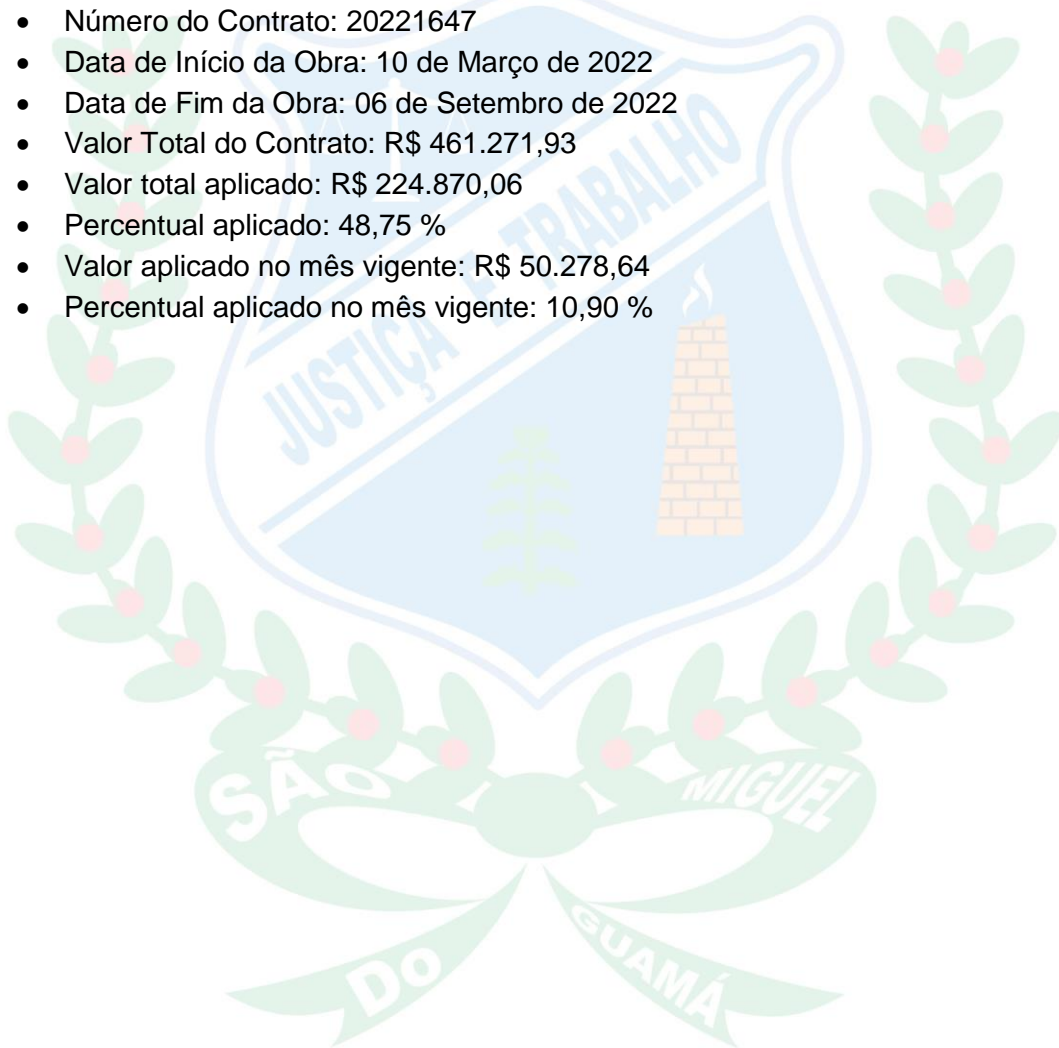




- Objeto da Obra: Construção do Prédio da EMEF Raimunda de Oliveira Machado – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Transterra Logística e Empreendimentos LTDA.
- Local de Execução da Obra: Av Cipriano Mendes – sn.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20217818
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.655.510,74
- Valor total aplicado: R\$ 293.356,51
- Percentual aplicado: 17,72 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 119.527,88
- Percentual aplicado no mês vigente: 7,22 %

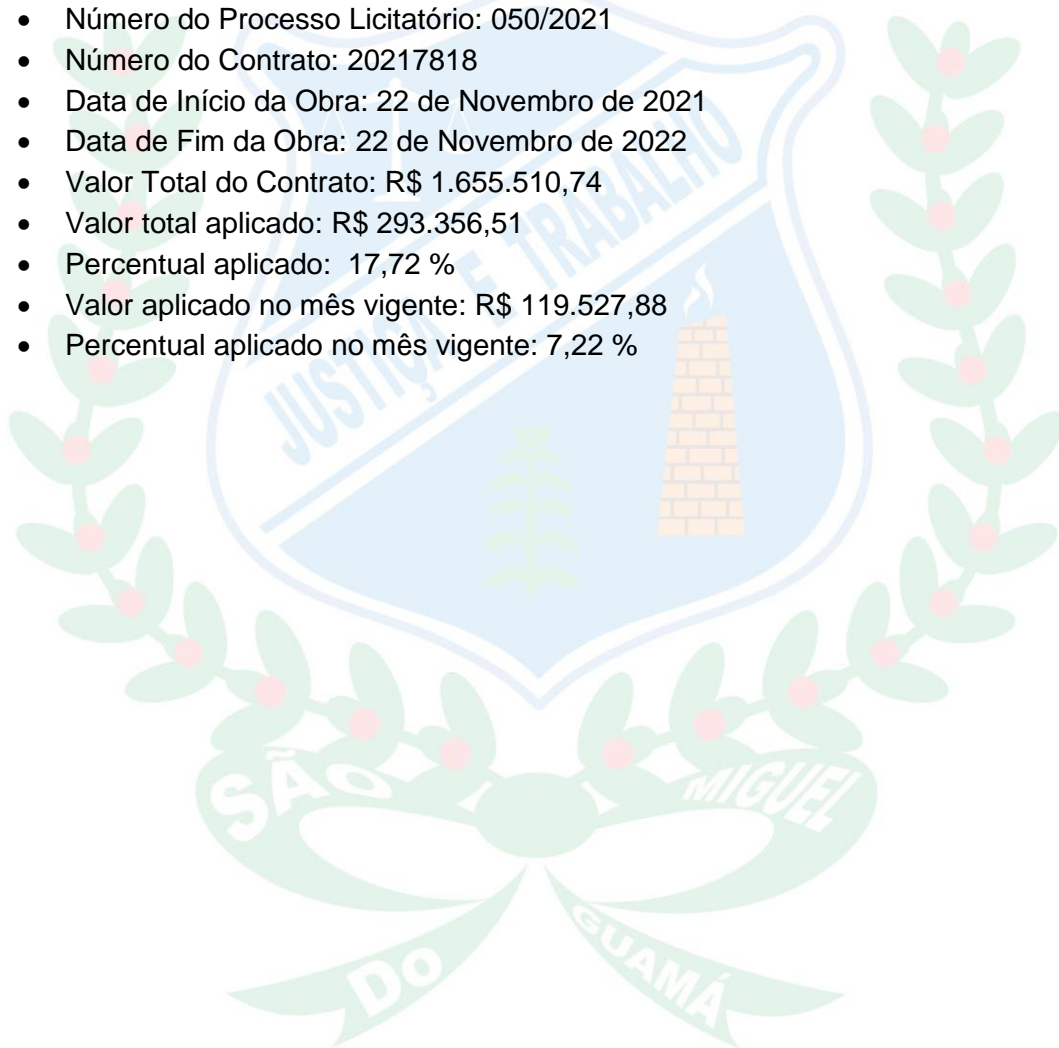




- Objeto da Obra: Revitalização da orla do Rio Guamá (2ª Etapa)
- Nome do Contratado: M & B Engenharia LTDA
- Local de Execução da Obra: Orla do Rio Guamá
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-006
- Número do Contrato: 20222803
- Data de Início da Obra: 21 de Junho de 2021
- Data de Fim da Obra: 21 de dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 968.890,03
- Valor total aplicado: R\$ 249.876,75
- Percentual aplicado: 25,79 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 136.322,83
- Percentual aplicado no mês vigente: 14,07 %

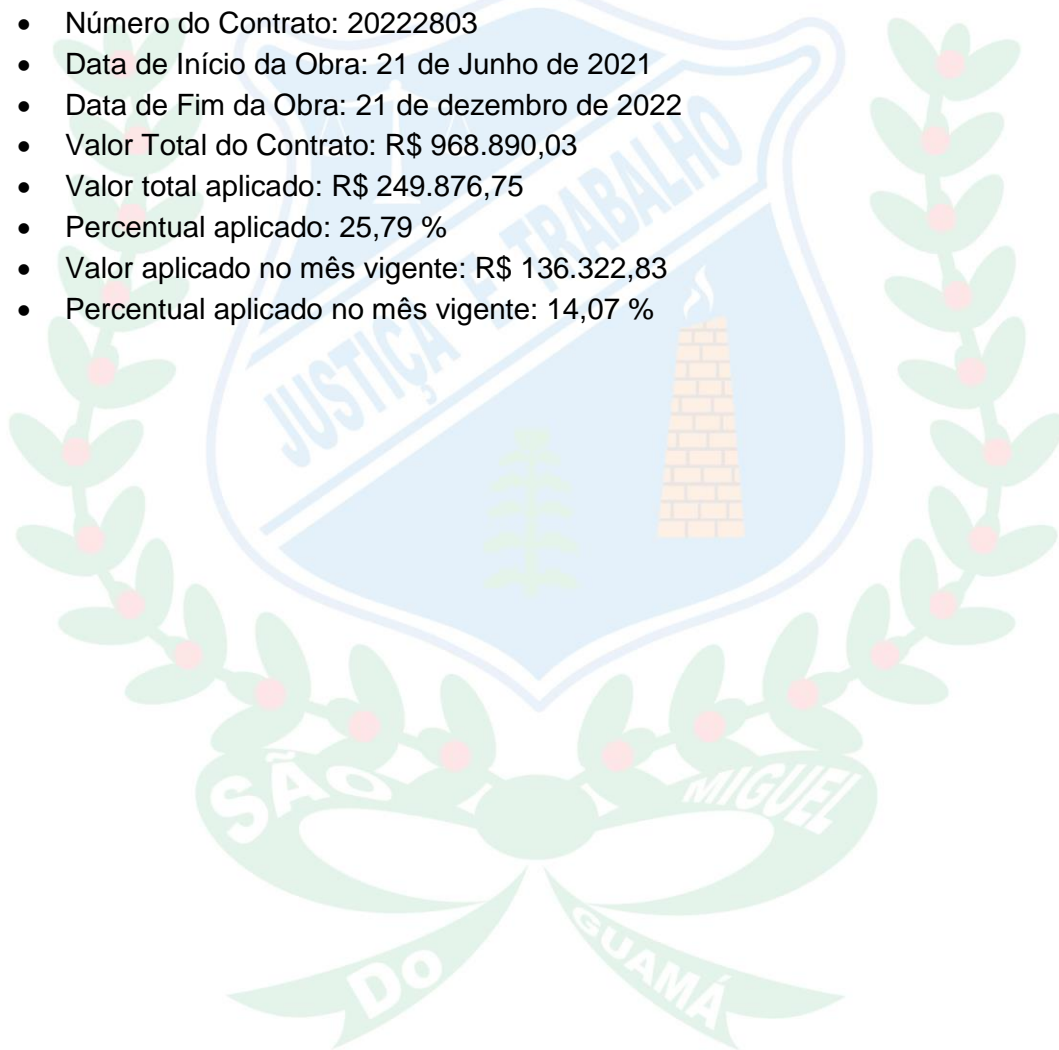



- Objeto da Obra: Recuperação Asfáltica de vias urbanas do bairro Perpétuo Socorro e Raimundo Guerreiro – São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Vias urbanas do bairro Perpétuo Socorro e Raimundo Guerreiro – São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Governo do Estado - SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-003
- Número do Contrato: 20222807
- Data de Início da Obra: 30 de Junho de 2022
- Data de Fim da Obra: 27 de Dezembro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 2.085.021,96
- Valor total aplicado: R\$ 1.081.709,40
- Percentual aplicado: 51,88 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 212.255,24
- Percentual aplicado no mês vigente: 10,18 %

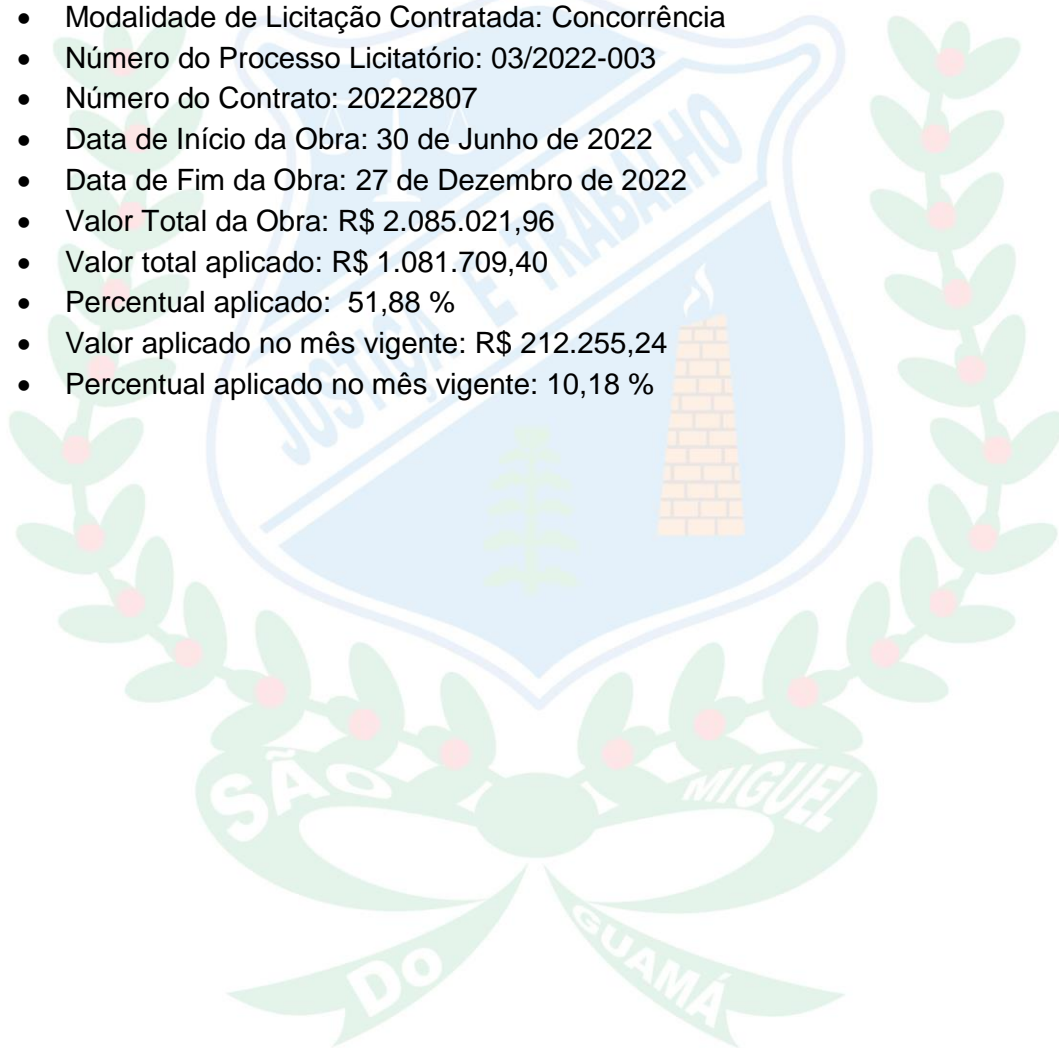



- Objeto da Obra: Recuperação das vicinais de acesso ao Ramal da Santana – Zona Rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Ramal da Santana – Zona Rural de São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Governo do Estado – SETRAN
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-002
- Número do Contrato: 20221666
- Data de Início da Obra: 16 de março de 2022
- Data de Fim da Obra: 12 de setembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.051.618,08
- Valor total aplicado: R\$ 399.614,87
- Percentual aplicado: 38,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 399.614,87
- Percentual aplicado no mês vigente: 38,00 %





- Objeto da Obra: Pavimentação Asfáltica, Drenagem superficial, e sinalização do bairro das Palmeiras, no município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas Ruas do Bairro das Palmeiras
- Origem do Recurso: Convênio entre Prefeitura de São Miguel do Guamá e SEDOP.
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-001
- Número do Contrato: 20222684
- Data de Início da Obra: 12 de Abril de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Outubro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 5.207.750,23
- Valor total aplicado: R\$ 941.713,72
- Percentual aplicado: 18,08 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 517.129,60
- Percentual aplicado no mês vigente: 9,93 %

