




## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Outubro

---

- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Pavimentação e Bloquetagem da Rua Filemon da Cunha Bicho
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222870
- Data de Início da Obra: 20 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 20 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 336.606,35
- Valor total aplicado: R\$ 212.721,91
- Percentual aplicado: 63,20 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 57.917,03
- Percentual aplicado no mês vigente: 17,21 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 57.917,03
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 17,21 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Mão de Obra para Construção do Posto de Saúde de Santa Rita de Barreiras
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222824
- Data de Início da Obra: 14 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 15 de Maio de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 87.359,24
- Valor total aplicado: R\$ 74.473,64
- Percentual aplicado: 85,25 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 18.824,73
- Percentual aplicado no mês vigente: 21,55 %

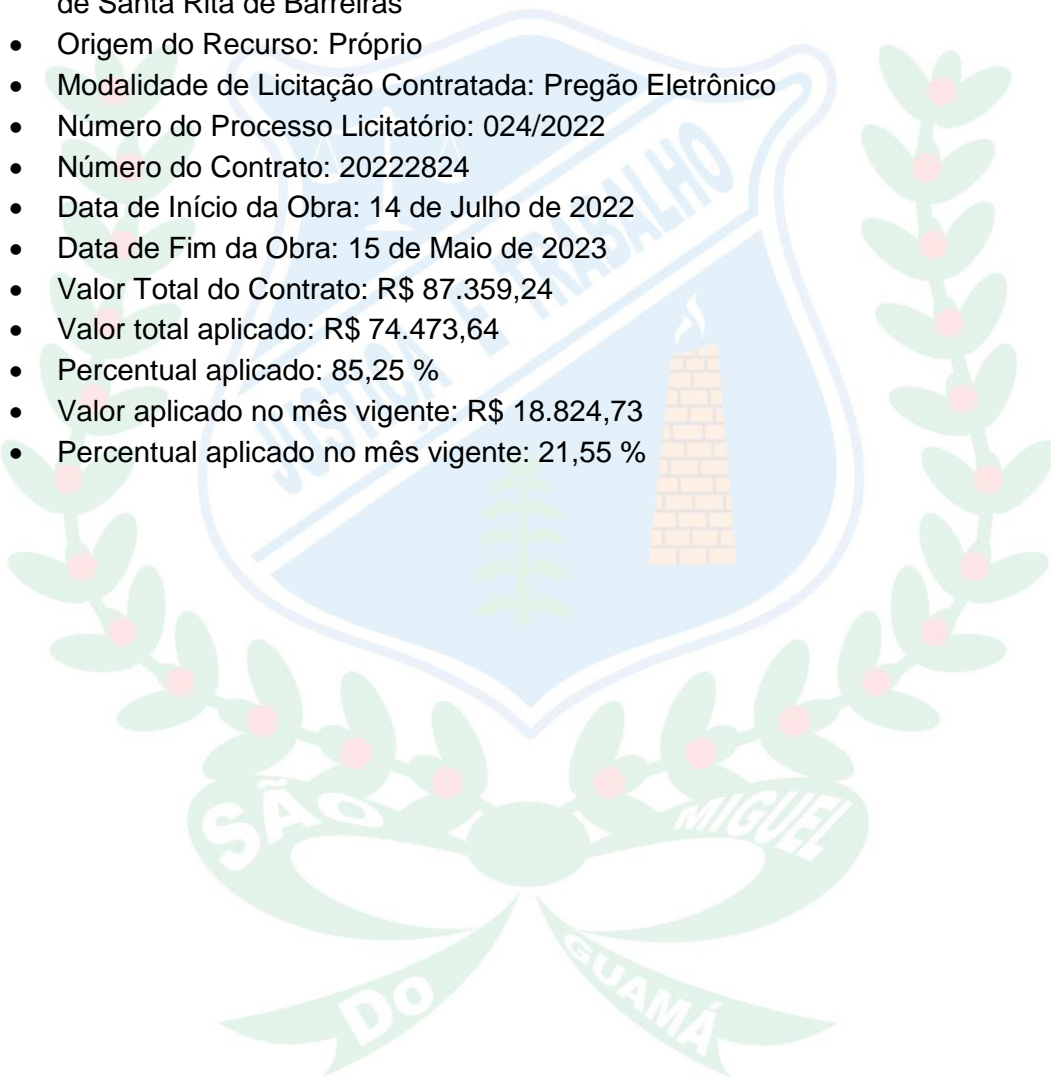



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Revitalização da Praça Vila Sorriso
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222880
- Data de Início da Obra: 22 de Agosto de 2022
- Data de Fim da Obra: 28 de fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 176.885,07
- Valor total aplicado: R\$ 70.716,67
- Percentual aplicado: 39,98 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 70.716,07
- Percentual aplicado no mês vigente: 39,98 %






- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Revitalização da Prédio sede da Secretaria de Cultura
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222899
- Data de Início da Obra: 06 de Setembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 99.778,92
- Valor total aplicado: R\$ 99.778,92
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 99.778,92
- Percentual aplicado no mês vigente: 100,00 %








- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Fernando Cruz (EMEF Padre Leandro Pinheiro).
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222773
- Data de Início da Obra: 10 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 10 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.122.215,47
- Valor do Aditivo: R\$ 390.791,64
- Percentual do Aditivo: 34,82 %
- Valor Total com Aditivo: R\$ 1.513.007,11
- Valor total aplicado: R\$ 1.487.222,45
- Percentual aplicado: 122,36 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 114.134,96
- Percentual aplicado no mês vigente: 4,24 %

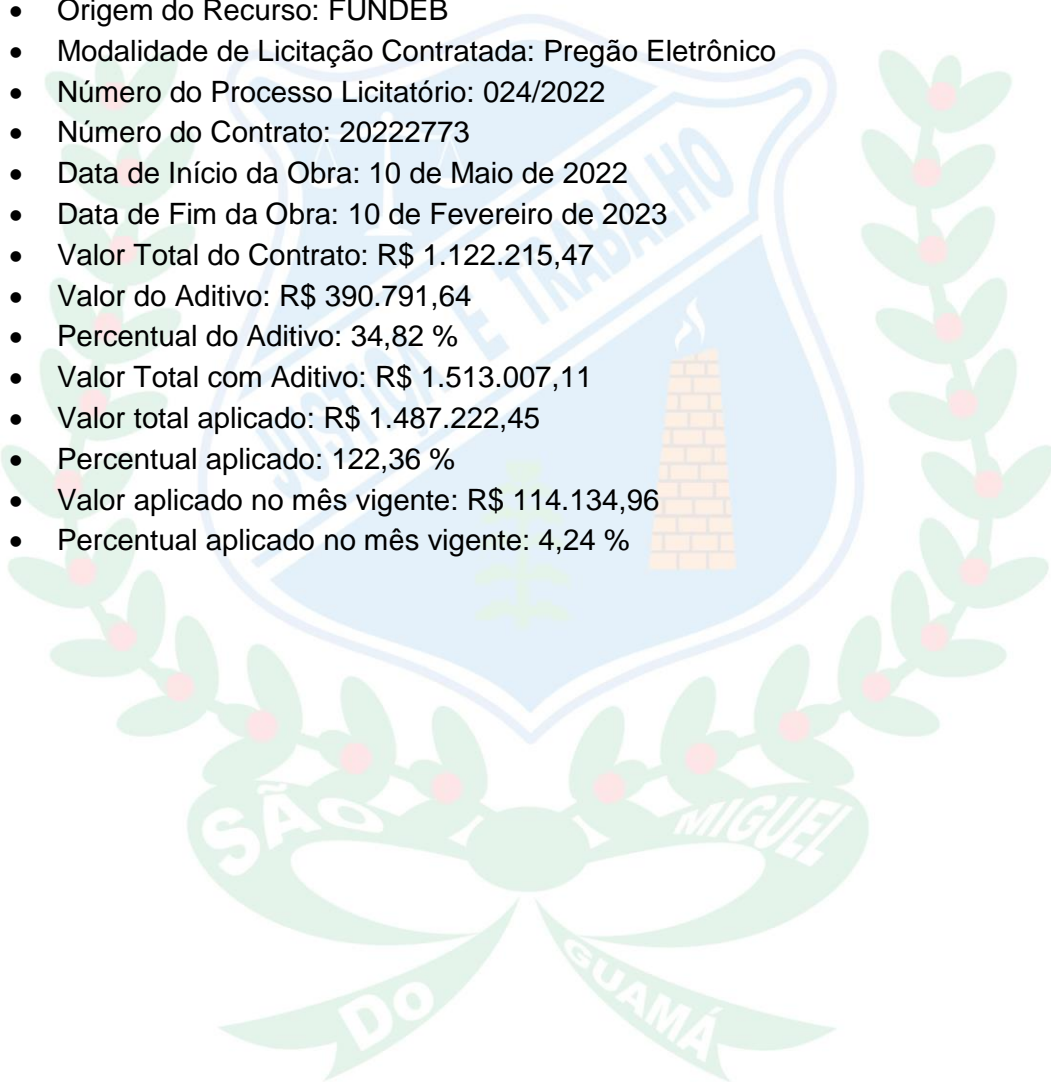




- Objeto da Obra: Reforma do Posto de Saúde do Perpétuo Socorro.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel Com Agostinho Siqueira.
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-001
- Número do Contrato: 20221647
- Data de Início da Obra: 10 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Setembro de 2022
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 06 de março de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 461.271,93
- Valor do Aditivo: R\$ 104.593,22
- Percentual do Aditivo: 22,67%
- Valor Total com aditivo: R\$ 565.865,15
- Valor total aplicado: R\$ 430.182,19
- Percentual aplicado: 93,26 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 104.616,47
- Percentual aplicado no mês vigente: 22,68 %

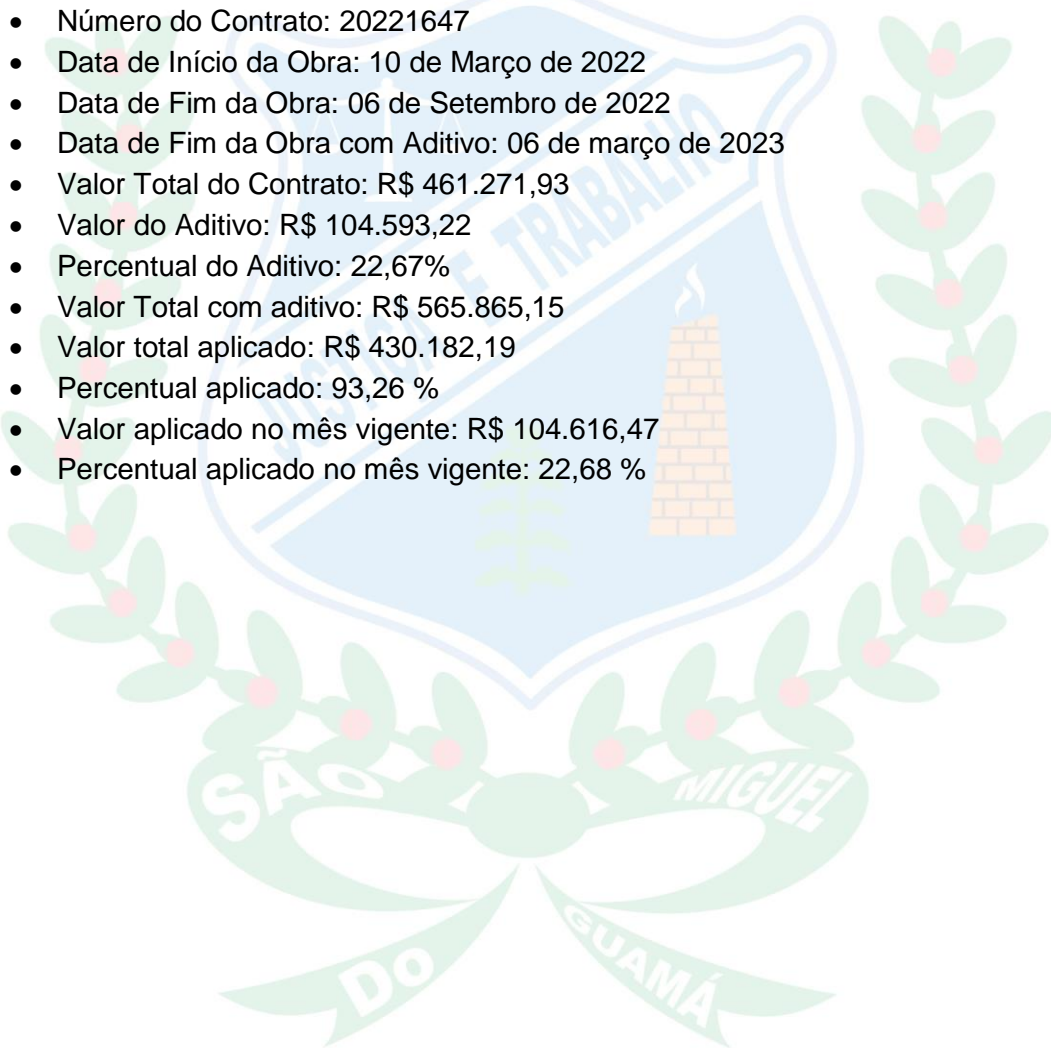



- Objeto da Obra: Construção do Prédio da EMEF Raimunda de Oliveira Machado – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Transterra Logística e Empreendimentos LTDA.
- Local de Execução da Obra: Av Cipriano Mendes – sn.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20217818
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.655.510,74
- Valor total aplicado: R\$ 616.843,29
- Percentual aplicado: 37,26 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 199.323,49
- Percentual aplicado no mês vigente: 12,04 %

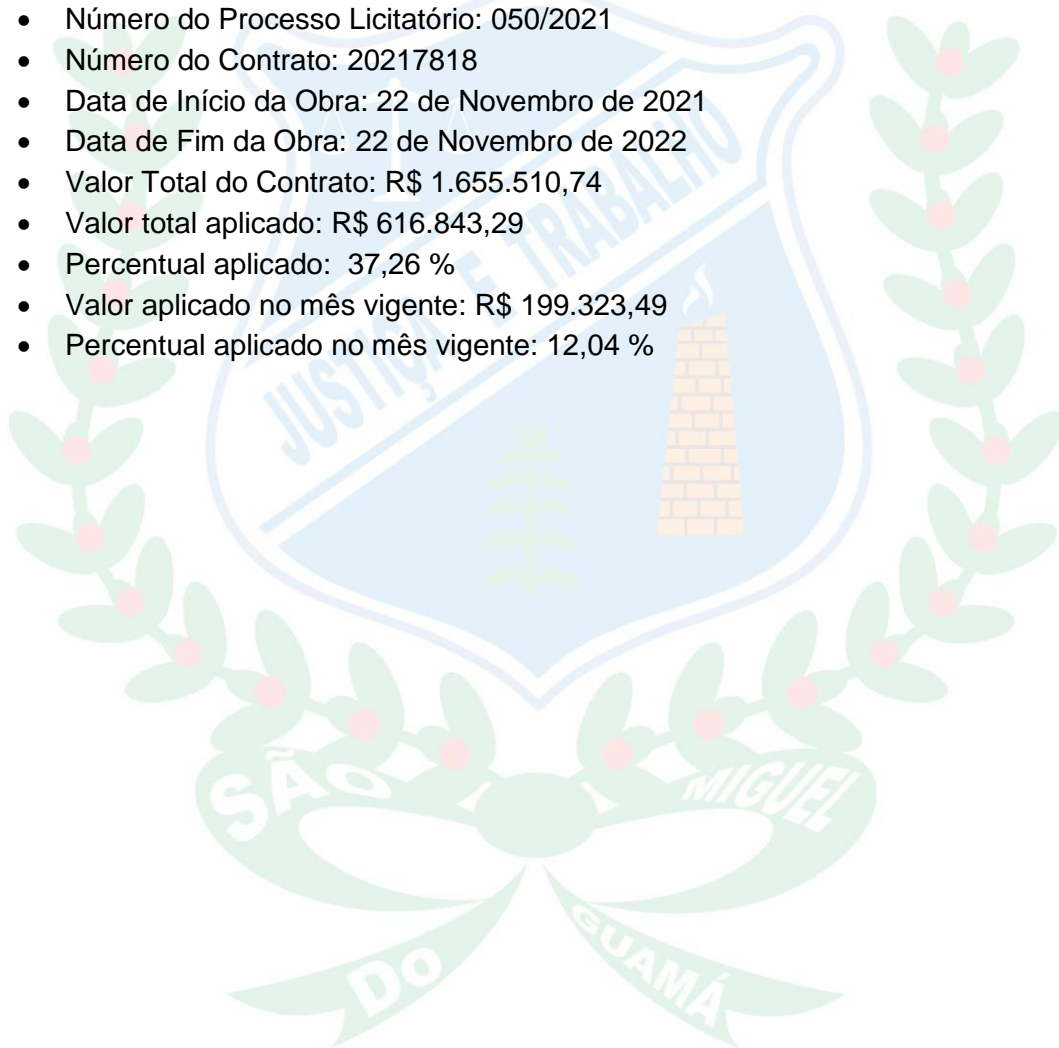




- Objeto da Obra: Pavimentação em bloquetes de vias urbanas do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas Ruas do Bairro da Portelinha e Rua Feliciano da Costa
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-006
- Número do Contrato: 20222881
- Data de Início da Obra: 19 de Agosto de 2022
- Data de Fim da Obra: 19 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 700.099,77
- Valor total aplicado: R\$ 700.099,79
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 298.052,71
- Percentual aplicado no mês vigente: 42,57 %








- Objeto da Obra: Construção do novo prédio da Câmara Municipal
- Nome do Contratado: M & B Engenharia LTDA
- Local de Execução da Obra: Rua Inácio Neto, Castanheira
- Origem do Recurso: Convênio – SEDOP 060/2022
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-008
- Número do Contrato: 20222888
- Data de Início da Obra: 05 de Setembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 05 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.975.383,15
- Valor total aplicado: R\$ 253.244,12
- Percentual aplicado: 12,82 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 253.244,12
- Percentual aplicado no mês vigente: 12,82 %





- Objeto da Obra: Recuperação das vicinais de acesso às comunidades quilombolas da região do Crauateua – Zona Rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Ramal da Região do Crauateua – Zona Rural de São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Governo Federal - INCRA
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-006
- Número do Contrato: 20217874
- Data de Início da Obra: 29 de dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 24 de dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.005.679,60
- Valor total aplicado: R\$ 212.198,40
- Percentual aplicado: 21,10 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 69.995,30
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,96 %

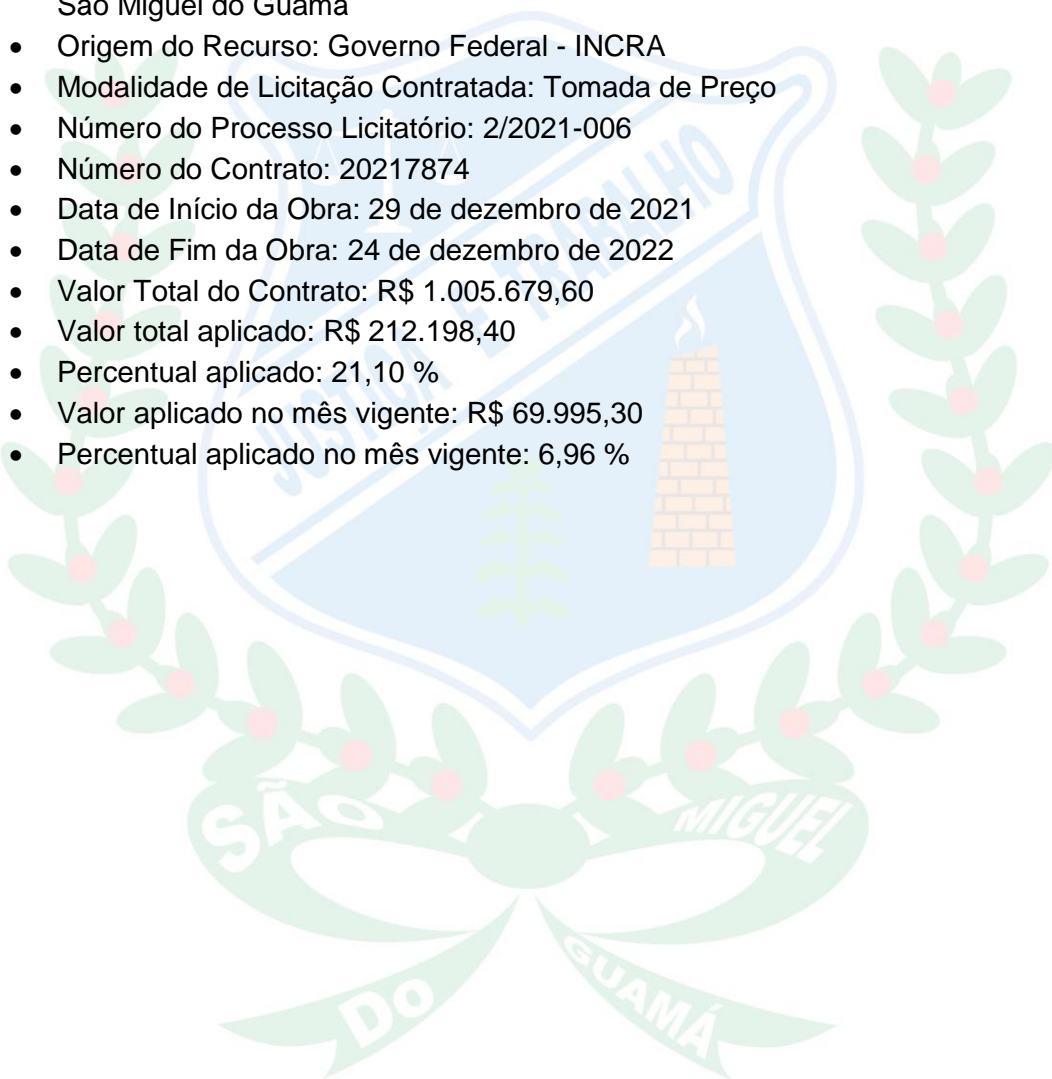



- Objeto da Obra: Pavimentação Asfáltica de vias de São Miguel do Guamá – (Alúcio Pedro de Farias)
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Alúcio Pedro de Farias – São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Regional – Governo Federal
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-005
- Número do Contrato: 20217827
- Data de Início da Obra: 25 de novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 25 de novembro de 2022
- Data de Fim da Obra com aditivo: 23 de maio de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 912.658,61
- Valor total aplicado: R\$ 91.763,15
- Percentual aplicado: 10,05 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 91.763,15
- Percentual aplicado no mês vigente: 10,05 %

