




## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Novembro

---

- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Mão de Obra para Construção do Posto de Saúde de Santa Rita de Barreiras
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222824
- Data de Início da Obra: 14 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 15 de Maio de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 87.359,24
- Valor total aplicado: R\$ 80.724,30
- Percentual aplicado: 92,40 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 6.250,66
- Percentual aplicado no mês vigente: 7,16 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Reforma do prédio que sediará a estação cidadania
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222956
- Data de Início da Obra: 13 de Outubro de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 87.477,50
- Valor total aplicado: R\$ 25.098,47
- Percentual aplicado: 28,69 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 25.098,47
- Percentual aplicado no mês vigente: 28,69 %

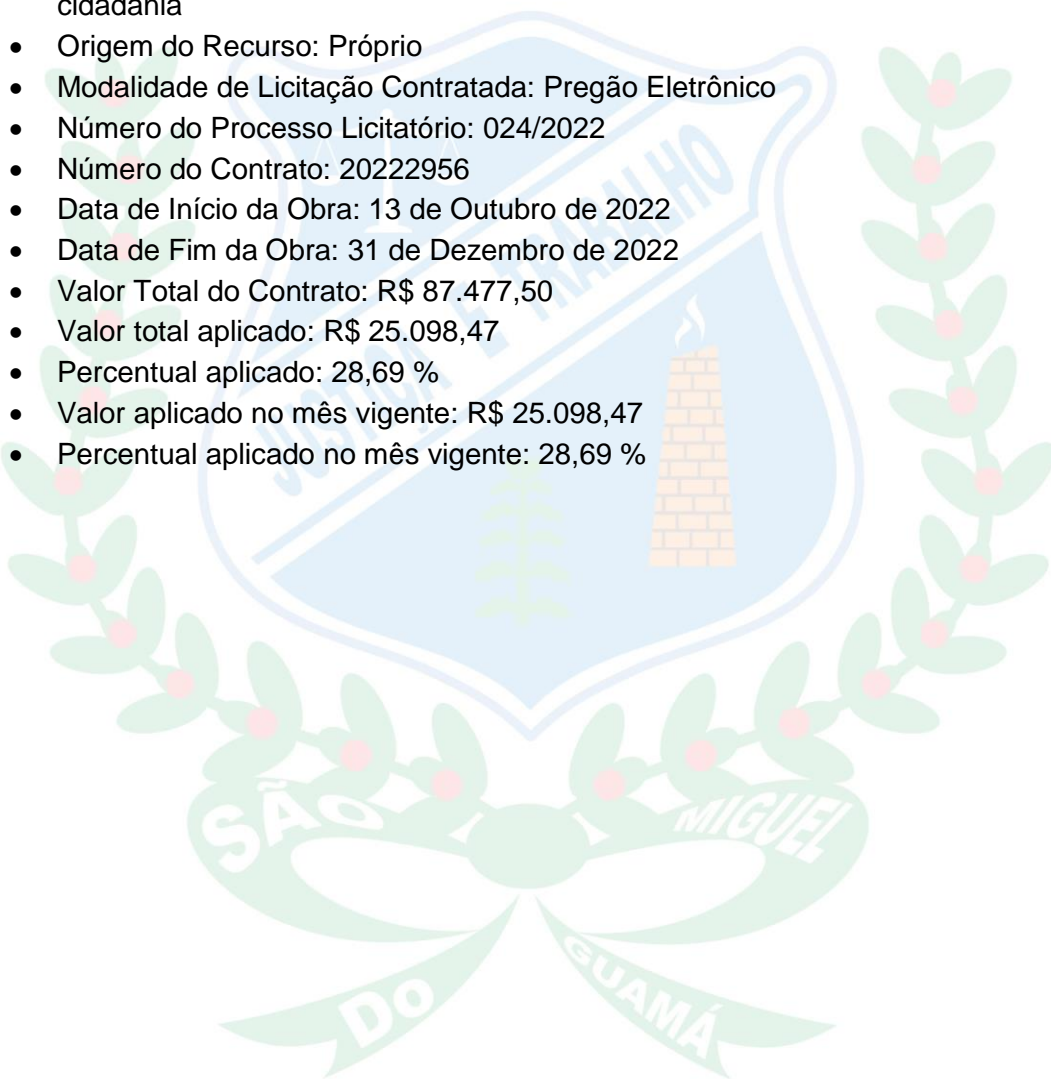



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Fernando Cruz (EMEF Padre Leandro Pinheiro).
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222773
- Data de Início da Obra: 10 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 10 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.122.215,47
- Valor do Aditivo: R\$ 390.791,64
- Percentual do Aditivo: 34,82 %
- Valor Total com Aditivo: R\$ 1.513.007,11
- Valor total aplicado: R\$ 1.513.007,11
- Percentual aplicado: 134,82 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 25.784,66
- Percentual aplicado no mês vigente: 1,70 %





- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Francisco de Assis Pereira - Urucuriteua
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222984
- Data de Início da Obra: 21 de Outubro de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 336.052,62
- Valor total aplicado: R\$ 265.670,92
- Percentual aplicado: 79,06 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 265.670,92
- Percentual aplicado no mês vigente: 79,06 %






- Objeto da Obra: Construção do Prédio da EMEF Raimunda de Oliveira Machado – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Transterra Logística e Empreendimentos LTDA.
- Local de Execução da Obra: Av Cipriano Mendes – sn.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20217818
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.655.510,74
- Valor total aplicado: R\$ 819.974,37
- Percentual aplicado: 49,53 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 203.131,17
- Percentual aplicado no mês vigente: 12,27 %





- Objeto da Obra: Construção da EMEF DR Antônio do Carmo Barbosa, zona rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Adiel Reis Erelí.
- Local de Execução da Obra: Comunidade Santo Antônio
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 02/2022-005
- Número do Contrato: 20222845
- Data de Início da Obra: 21 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 19 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 791.998,72
- Valor total aplicado: R\$ 275.457,15
- Percentual aplicado: 34,78 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 165.369,33
- Percentual aplicado no mês vigente: 20,88 %

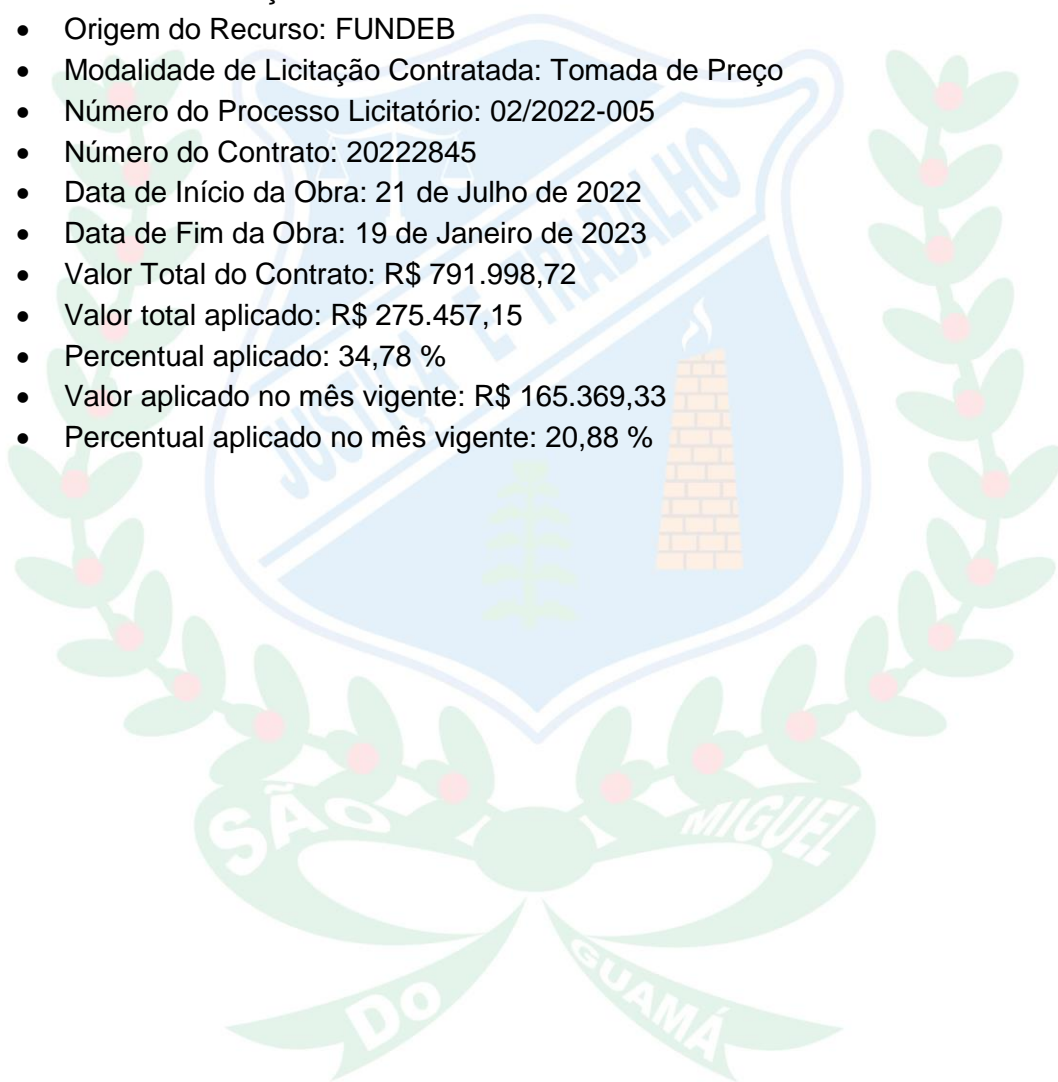



- Objeto da Obra: Construção da EMEF Matilde de Júlia Castro, zona rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: W M Construções e Serviços LTDA.
- Local de Execução da Obra: Comunidade da Fronteira
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 02/2022-005
- Número do Contrato: 20222846
- Data de Início da Obra: 21 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 19 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 778.140,54
- Valor total aplicado: R\$ 215.934,00
- Percentual aplicado: 27,75 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 118.277,36
- Percentual aplicado no mês vigente: 15,20 %





- Objeto da Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde no bairro Padre Ângelo, no município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel de Bulhões s/n, Padre Ângelo
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-002
- Número do Contrato: 20210476
- Data de Início da Obra: 17 de novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 17 de maio de 2022
- Data de Fim da Obra com aditivo: 17 de novembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.172.412,70
- Valor total aplicado: R\$ 1.172.412,70
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 155.930,89
- Percentual aplicado no mês vigente: 13,70 %








- Objeto da Obra: Pavimentação em bloquetes de vias urbanas do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas Ruas do Bairro da Portelinha e Rua Feliciano da Costa
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-006
- Número do Contrato: 20222972
- Data de Início da Obra: 13 de Outubro de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 685.252,85
- Valor total aplicado: R\$ 266.120,30
- Percentual aplicado: 38,34 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 266.120,30
- Percentual aplicado no mês vigente: 38,84 %





- Objeto da Obra: Ampliação do Sistema de Abastecimento de água do município de São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli
- Local de Execução da Obra: Praça do Raimundo Guerreiro
- Origem do Recurso: Governo do Estado - SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 3/2022-008
- Número do Contrato: 20222895
- Data de Início da Obra: 13 de Setembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 13 de Setembro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 6.084.678,74
- Valor total aplicado: R\$ 399.763,39
- Percentual aplicado: 6,57 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 399.763,39
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,57 %

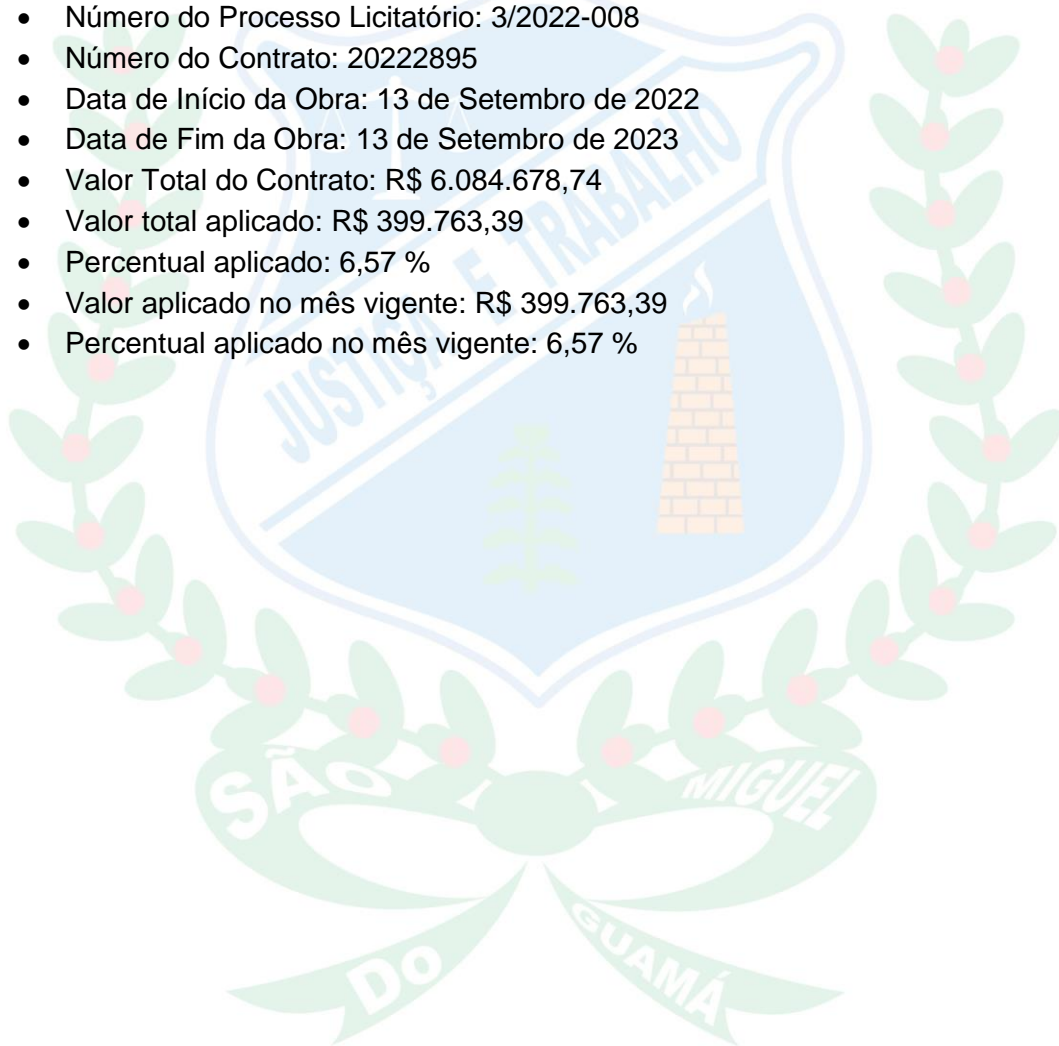



- Objeto da Obra: Construção da feira do produtor rural e mercado municipal do pequeno comerciante.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Avenida Tancredo Neves – São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Regional – Governo federal
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 02/2022-007
- Número do Contrato: 20222799
- Data de Início da Obra: 09 de Junho de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Fevereiro de 2023
- Valor Total da Obra: R\$ 2.136.586,58
- Valor total aplicado: R\$ 496.542,72
- Percentual aplicado: 23,24 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 496.542,72
- Percentual aplicado no mês vigente: 23,24 %





- Objeto da Obra: Recuperação das vicinais de acesso ao Ramal da Santana – Zona Rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Ramal da Santana – Zona Rural de São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Governo do Estado – SETRAN
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-002
- Número do Contrato: 20221666
- Data de Início da Obra: 16 de março de 2022
- Data de Fim da Obra: 12 de setembro de 2022
- Data de Fim da Obra com aditivo: 30 de Abril de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.051.618,08
- Valor total aplicado: R\$ 554.014,37
- Percentual aplicado: 52,68 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 154.399,50
- Percentual aplicado no mês vigente: 14,68 %






- Objeto da Obra: Pavimentação Asfáltica, Drenagem superficial, e sinalização do bairro das Palmeiras, no município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas Ruas do Bairro das Palmeiras
- Origem do Recurso: Convênio entre Prefeitura de São Miguel do Guamá e SEDOP.
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-001
- Número do Contrato: 20222684
- Data de Início da Obra: 12 de Abril de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Outubro de 2022
- Data de Fim da Obra com aditivo: 08 de março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 5.207.750,23
- Valor total aplicado: R\$ 1.894.211,24
- Percentual aplicado: 36,37 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 952.497,52
- Percentual aplicado no mês vigente: 18,29 %






- Objeto da Obra: Recuperação Asfáltica de vias urbanas de São Miguel do Guamá de acordo com convênio SEDOP nº 121/2022 celebrado entre SEDOP e Prefeitura de São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Raimundo Guerreiro e outras ruas – São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Governo do Estado – SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-005
- Número do Contrato: 20222884
- Data de Início da Obra: 26 de Agosto de 2022
- Data de Fim da Obra: 25 de Fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 5.265.354,40
- Valor total aplicado: R\$ 1.700.709,48
- Percentual aplicado: 32,30 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 487.045,28
- Percentual aplicado no mês vigente: 9,25 %

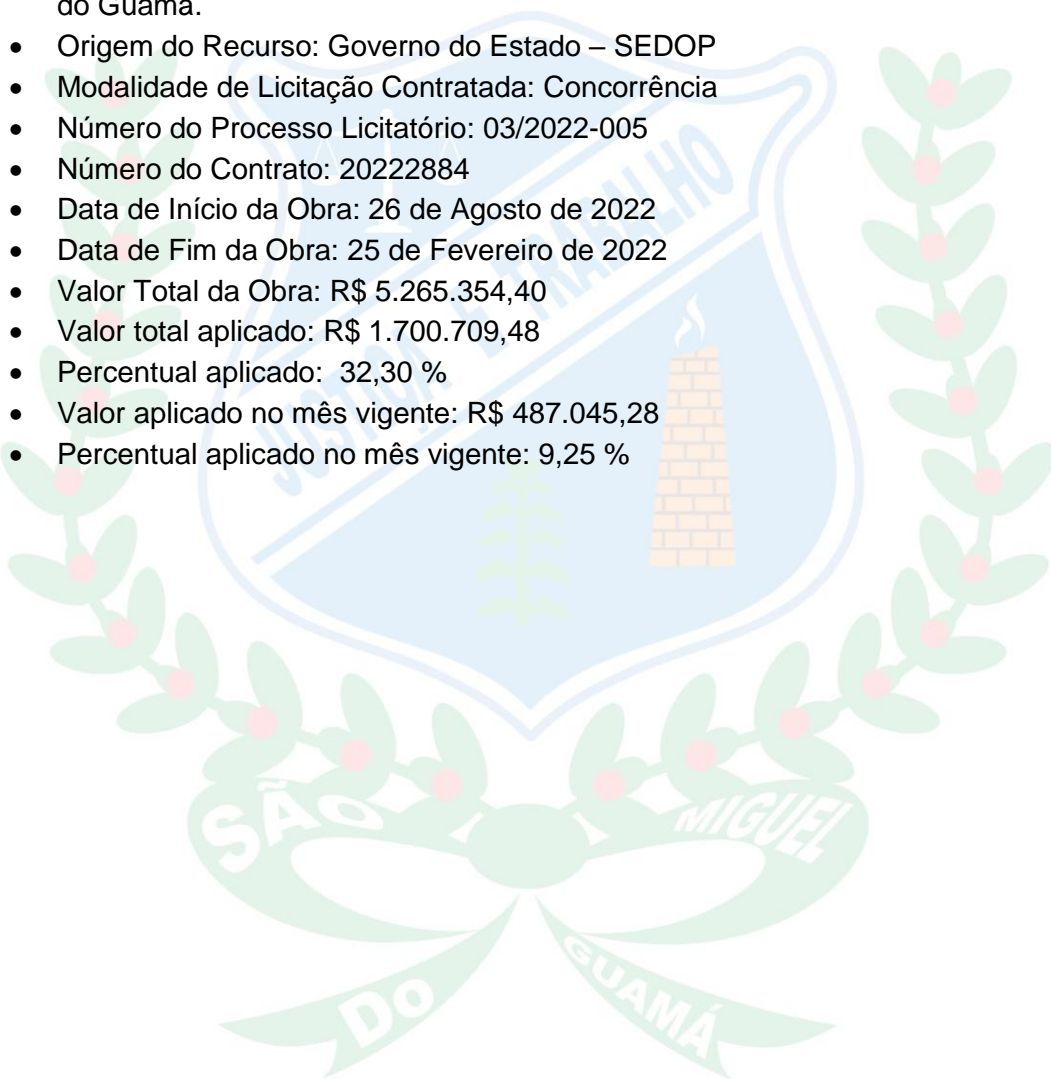




- Objeto da Obra: Construção do novo prédio da Câmara Municipal
- Nome do Contratado: M & B Engenharia LTDA
- Local de Execução da Obra: Rua Inácio Neto, Castanheira
- Origem do Recurso: Convênio – SEDOP 060/2022
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-008
- Número do Contrato: 20222888
- Data de Início da Obra: 05 de Setembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 05 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.975.383,15
- Valor total aplicado: R\$ 334.037,29
- Percentual aplicado: 16,91 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 80.793,17
- Percentual aplicado no mês vigente: 4,09 %

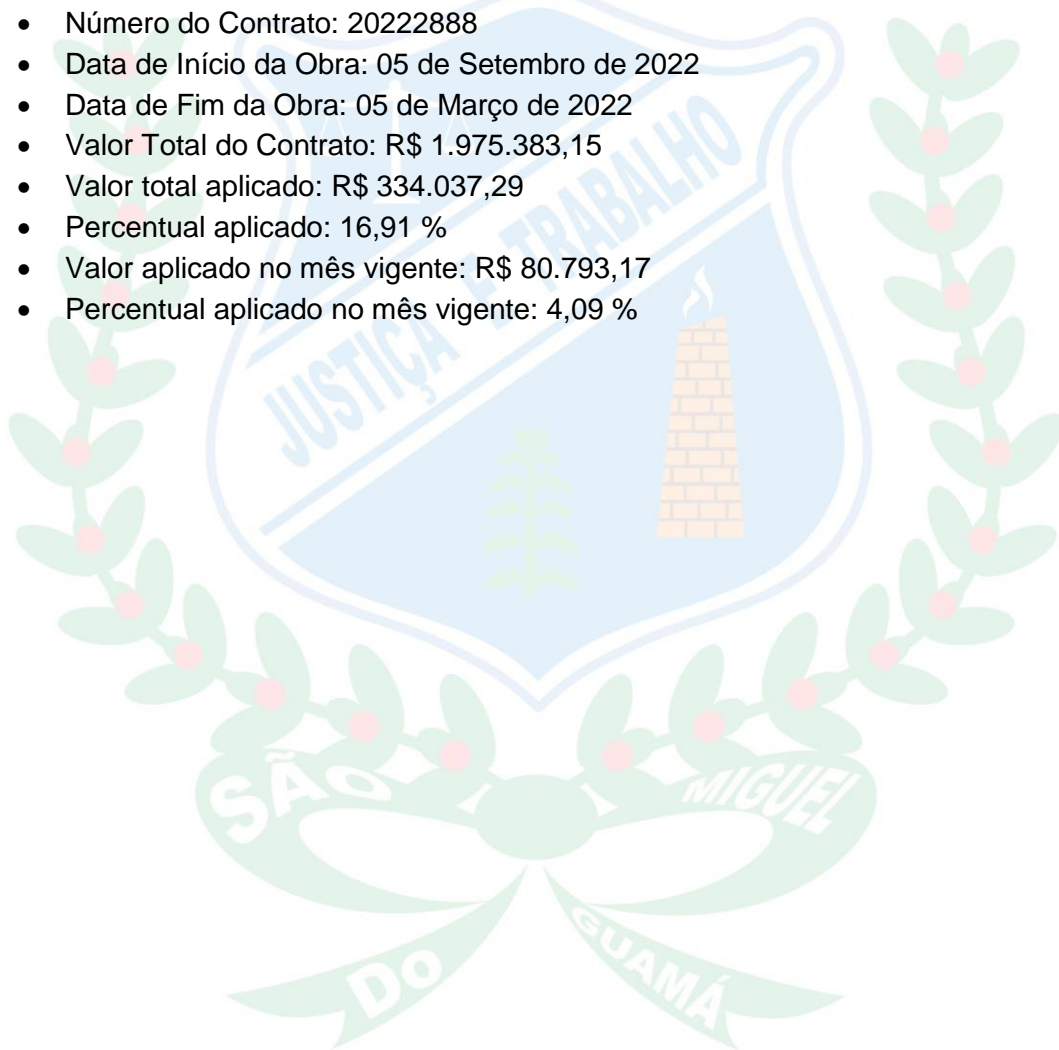



- Objeto da Obra: Ampliação e Revitalização do Cemitério São Jorge
- Nome do Contratado: R E da Costa Lira LTDA
- Local de Execução da Obra: Estrada Fortaleza – Padre Ângelo
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Convite
- Número do Processo Licitatório: 1/2022-001
- Número do Contrato: 20222894
- Data de Início da Obra: 05 de Setembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 28 de Fevereiro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 180.200,05
- Valor total aplicado: R\$ 51.140,77
- Percentual aplicado: 28,38 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 51.140,77
- Percentual aplicado no mês vigente: 28,38 %

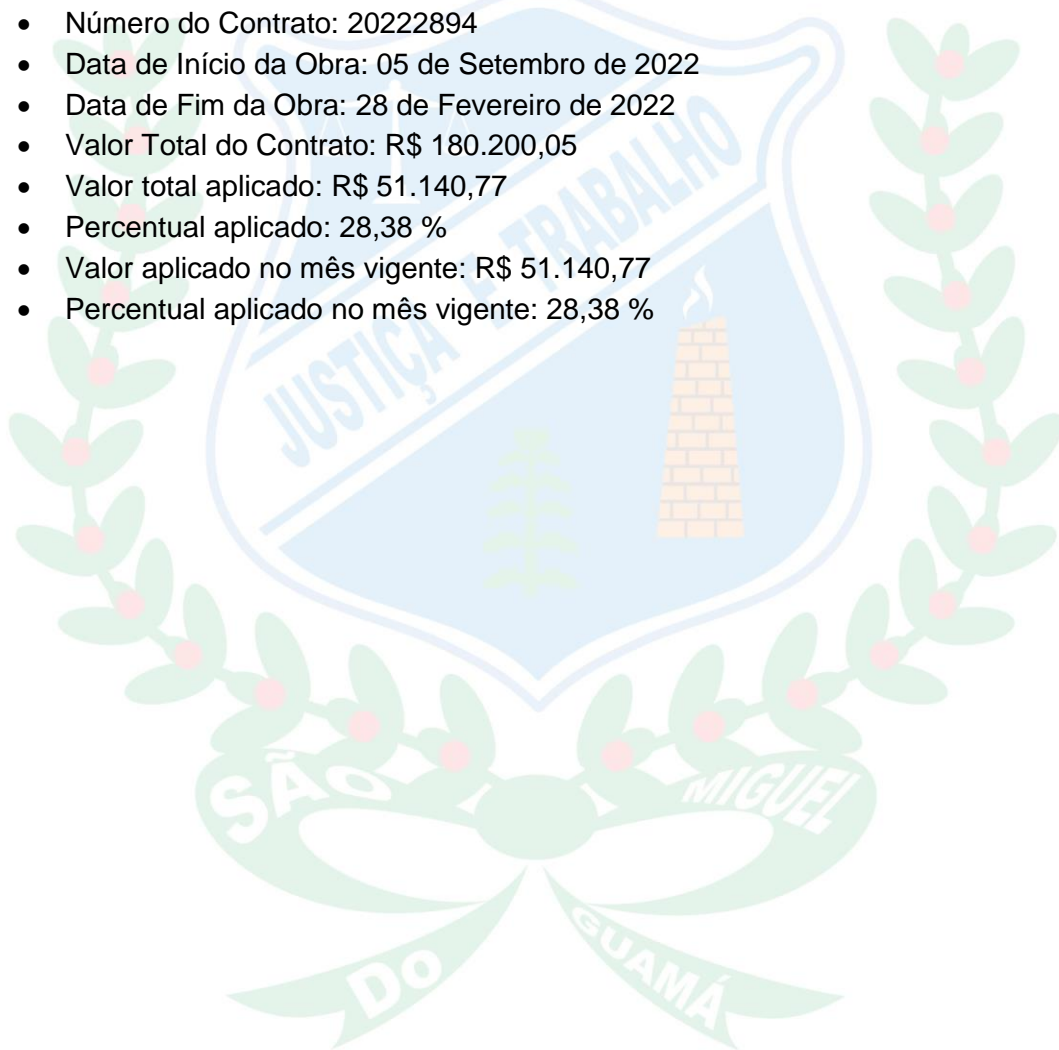





- Objeto do Serviço: Topografia nas áreas urbanas e rurais do município de São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Pará Engenharia ME
- Local de Execução do Serviço: Região do Cantagalo, zona rural
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-004
- Número do Contrato: 20222719
- Data de Início da Obra: 03 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 28 de Abril de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 512.185,71
- Valor total aplicado: R\$ 36.570,06
- Percentual aplicado: 7,14 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 36.570,06
- Percentual aplicado no mês vigente: 7,14 %

