



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Dezembro

- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Mão de Obra para Construção do Posto de Saúde de Santa Rita de Barreiras
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222824
- Data de Início da Obra: 14 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 15 de Maio de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 87.359,24
- Valor total aplicado: R\$ 87.321,74
- Percentual aplicado: 99,96 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 6.597,44
- Percentual aplicado no mês vigente: 7,55 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Comunidade Carrapatinho – Zona Rural de São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20223054
- Data de Início da Obra: 23 de Novembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 23 de Maio de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.674,55
- Valor total aplicado: R\$ 149.957,39
- Percentual aplicado: 51,77 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 149.957,39
- Percentual aplicado no mês vigente: 51,77 %






- Objeto da Obra: Construção da EMEF Manoel Paulo - Santa Rita de Barreiras
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Comunidade Santa Rita de Barreiras – Zona Rural de São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-010
- Número do Contrato: 20223018
- Data de Início da Obra: 14 de Dezembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 14 de Dezembro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.463.170,00
- Valor total aplicado: R\$ 100.227,15
- Percentual aplicado: 6,85 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 100.227,15
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,85 %






- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Reforma do prédio que sediará a estação cidadania
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222956
- Data de Início da Obra: 13 de Outubro de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 87.477,50
- Valor total aplicado: R\$ 56.158,68
- Percentual aplicado: 64,20 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 31.060,21
- Percentual aplicado no mês vigente: 35,51 %

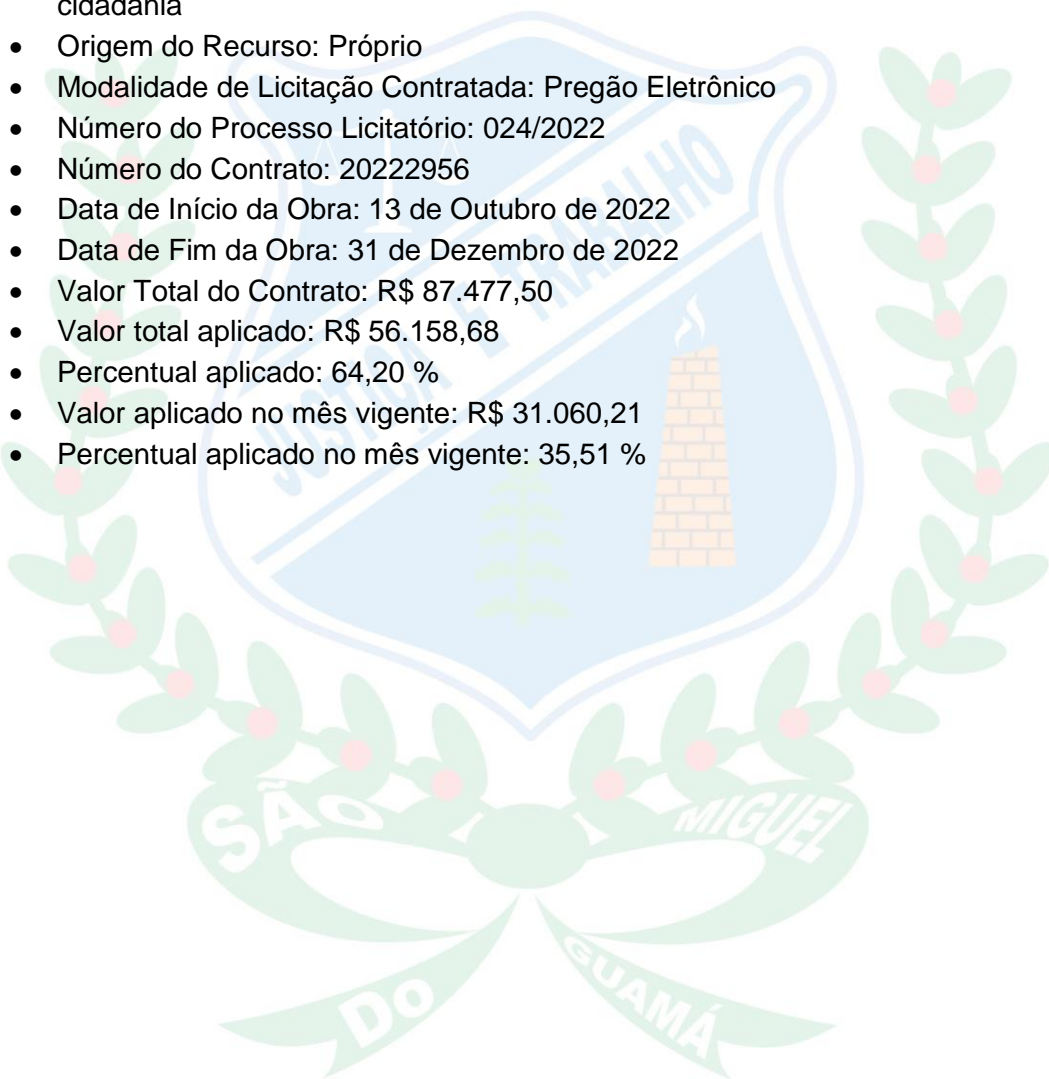



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Complexo do “DNIT”
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222821
- Data de Início da Obra: 06 de Junho de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 274.982,64
- Valor total aplicado: R\$ 274.982,64
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 47.268,82
- Percentual aplicado no mês vigente: 17,19 %

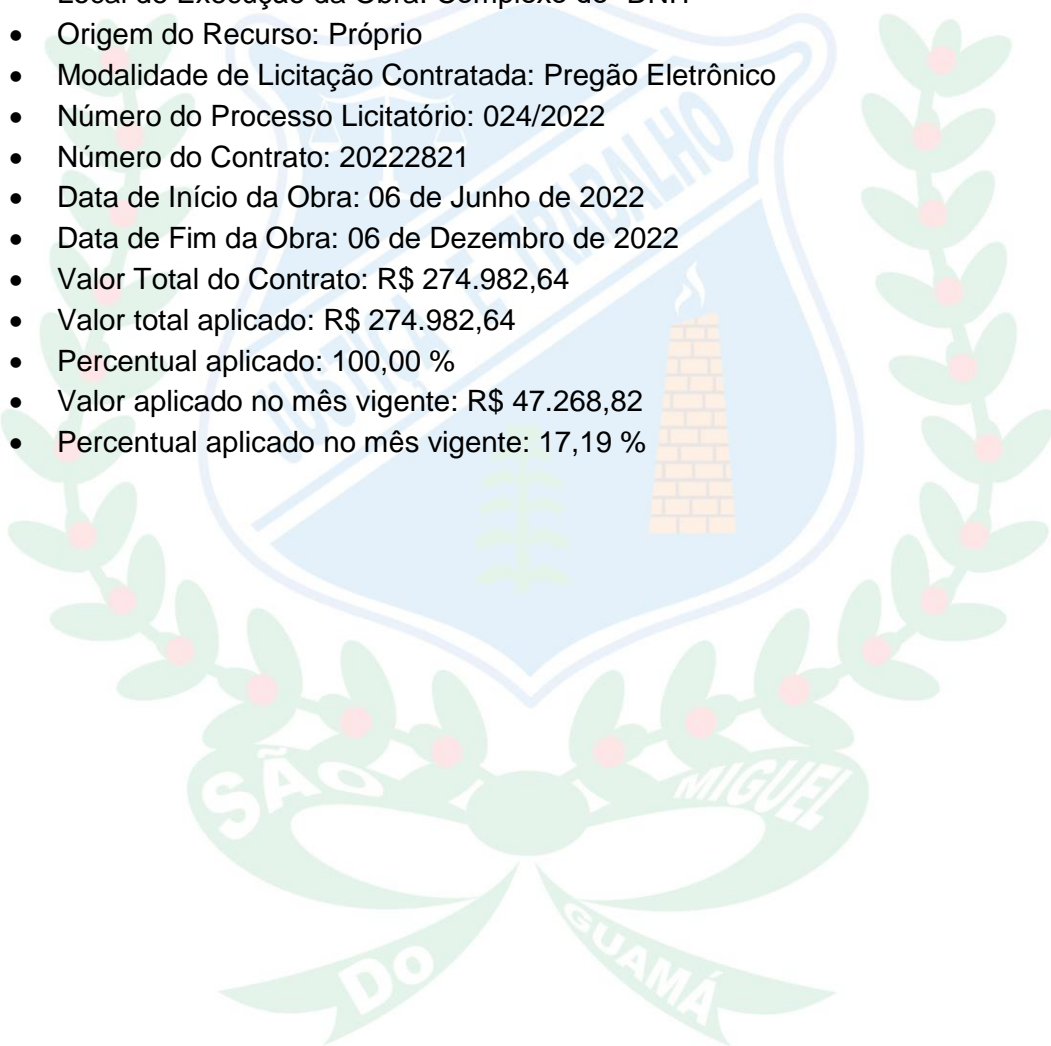



- Objeto da Obra: Reforma do Posto de Saúde do Perpétuo Socorro.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel Com Agostinho Siqueira.
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-001
- Número do Contrato: 20221647
- Data de Início da Obra: 10 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Setembro de 2022
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 06 de março de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 461.271,93
- Valor do Aditivo: R\$ 104.593,22
- Percentual do Aditivo: 22,67%
- Valor Total com aditivo: R\$ 565.865,15
- Valor total aplicado: R\$ 481.152,74
- Percentual aplicado: 104,31 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 50.970,55
- Percentual aplicado no mês vigente: 11,05 %






- Objeto da Obra: Construção do Prédio da EMEF Raimunda de Oliveira Machado – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Transterra Logística e Empreendimentos LTDA.
- Local de Execução da Obra: Av Cipriano Mendes – sn.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20217818
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Data de Fim da Obra com aditivo: 20 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.655.510,74
- Valor de Reequilíbrio de Preços: R\$ 133.513,33
- Valor Total do Contrato com Reequilíbrio: R\$ 1.789.024,07
- Valor total aplicado: R\$ 985.525,39
- Percentual aplicado: 59,53 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 165.551,07
- Percentual aplicado no mês vigente: 10,00 %






- Objeto da Obra: Construção da EMEF DR Antônio do Carmo Barbosa, zona rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Adiel Reis Erelí.
- Local de Execução da Obra: Comunidade Santo Antônio
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 02/2022-005
- Número do Contrato: 20222845
- Data de Início da Obra: 21 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 19 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 791.998,72
- Valor total aplicado: R\$ 432.272,90
- Percentual aplicado: 54,58 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 156.815,75
- Percentual aplicado no mês vigente: 19,80 %

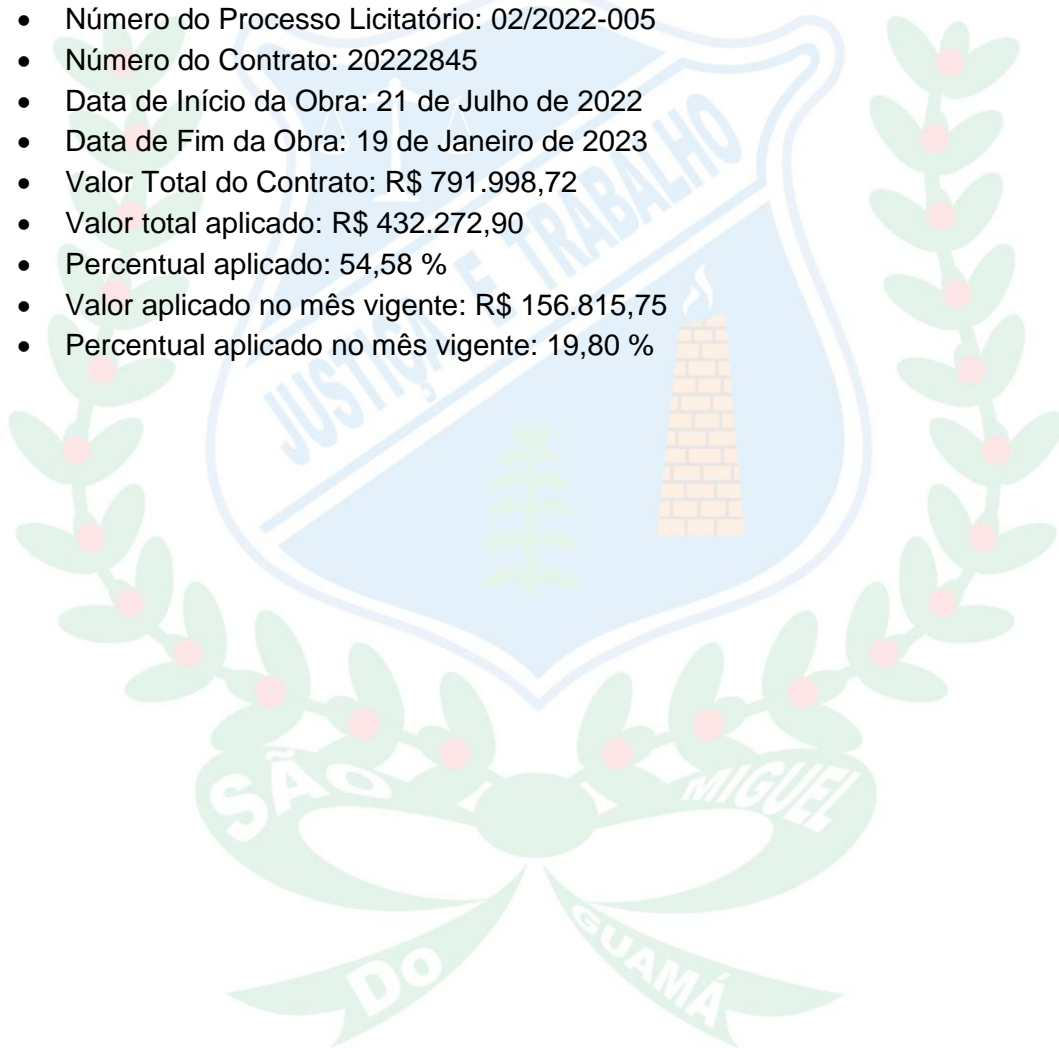



- Objeto da Obra: Construção da EMEF Matilde de Júlia Castro, zona rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: W M Construções e Serviços LTDA.
- Local de Execução da Obra: Comunidade da Fronteira
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 02/2022-005
- Número do Contrato: 20222846
- Data de Início da Obra: 21 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 19 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 778.140,54
- Valor total aplicado: R\$ 365.881,68
- Percentual aplicado: 47,02 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 149.947,68
- Percentual aplicado no mês vigente: 19,27 %

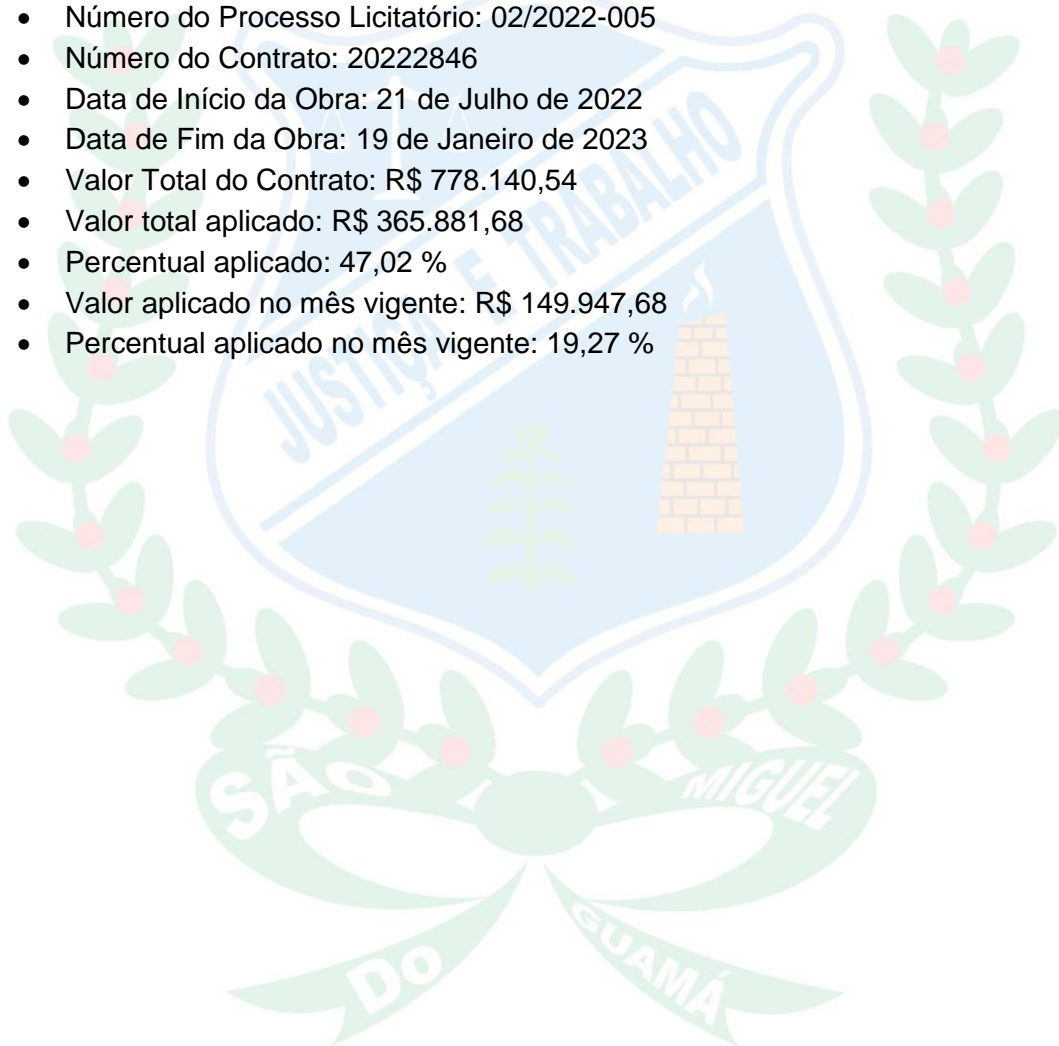




- Objeto da Obra: Pavimentação em bloquetes de vias urbanas do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas Ruas do Bairro da Portelinha e Rua Feliciano da Costa
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-006
- Número do Contrato: 20222972
- Data de Início da Obra: 13 de Outubro de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 685.252,85
- Valor total aplicado: R\$ 341.560,80
- Percentual aplicado: 49,84 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 75.440,50
- Percentual aplicado no mês vigente: 11,01 %






- Objeto da Obra: Pavimentação em bloquetes de vias urbanas do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Comunidade do Acari – Zona Rural
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-006
- Número do Contrato: 20222997
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 22 de Março de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 285.146,86
- Valor total aplicado: R\$ 100.692,62
- Percentual aplicado: 35,31 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 100.692,62
- Percentual aplicado no mês vigente: 35,31 %

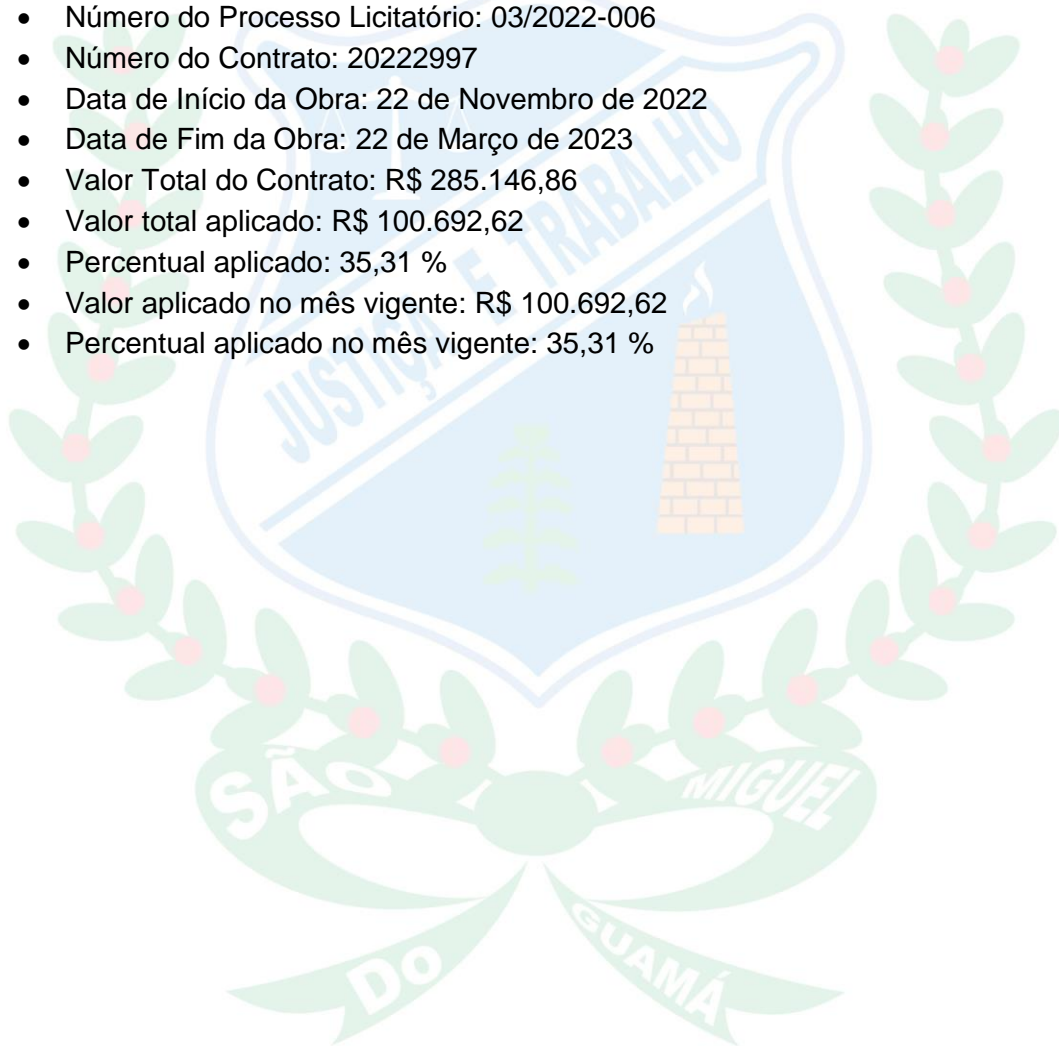




- Objeto da Obra: Recuperação das vicinais de acesso às comunidades quilombolas da região do Crauateua – Zona Rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Ramal da Região do Crauateua – Zona Rural de São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Governo Federal - INCRA
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-006
- Número do Contrato: 20217874
- Data de Início da Obra: 29 de dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 24 de dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.005.679,60
- Valor total aplicado: R\$ 610.447,52
- Percentual aplicado: 60,70 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 398.249,12
- Percentual aplicado no mês vigente: 39,60 %

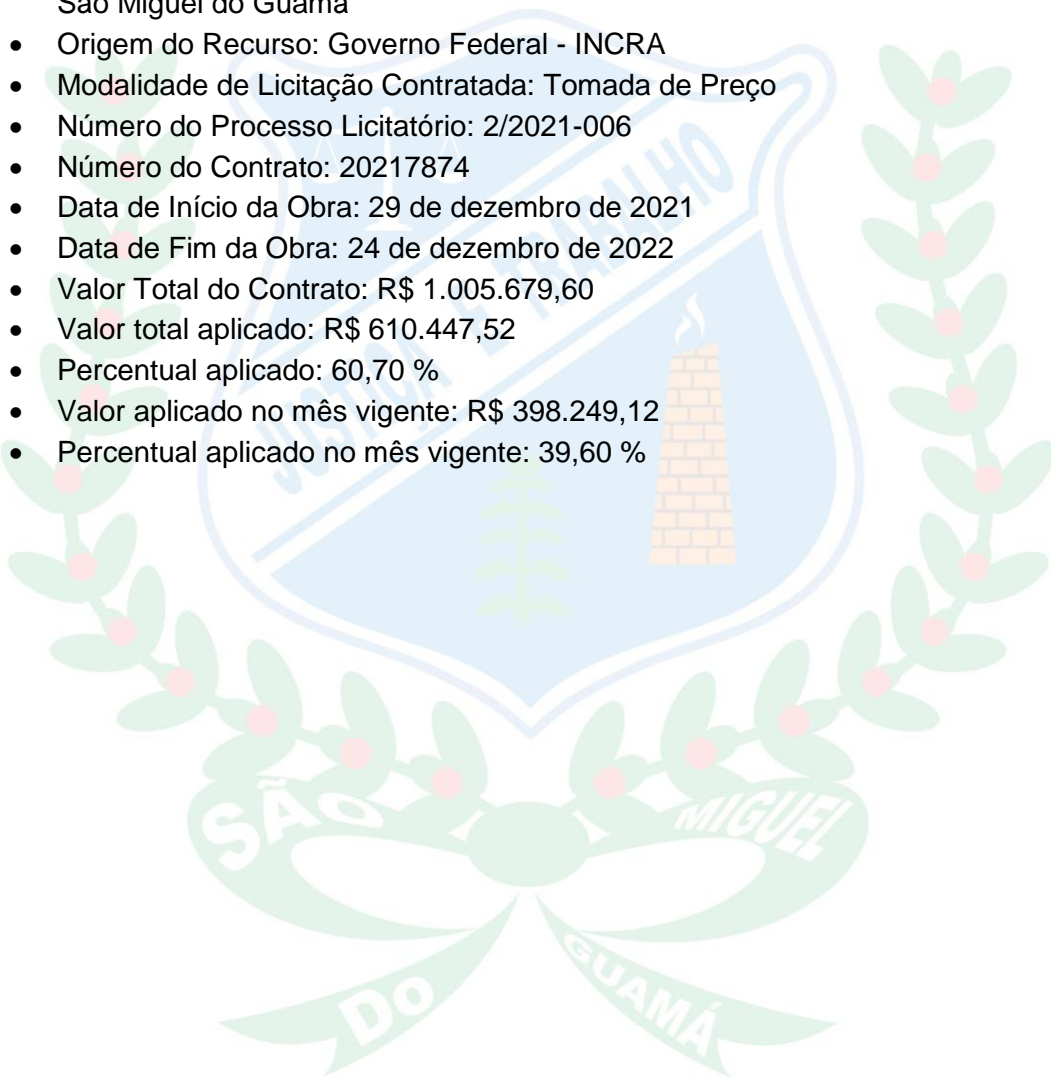



- Objeto da Obra: Pavimentação Asfáltica de vias de São Miguel do Guamá – (Alúcio Pedro de Farias)
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Alúcio Pedro de Farias – São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Regional – Governo Federal
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-005
- Número do Contrato: 20217827
- Data de Início da Obra: 25 de novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 25 de novembro de 2022
- Data de Fim da Obra com aditivo: 23 de maio de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 912.658,61
- Valor total aplicado: R\$ 251.813,05
- Percentual aplicado: 27,59 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 160.049,90
- Percentual aplicado no mês vigente: 17,54 %

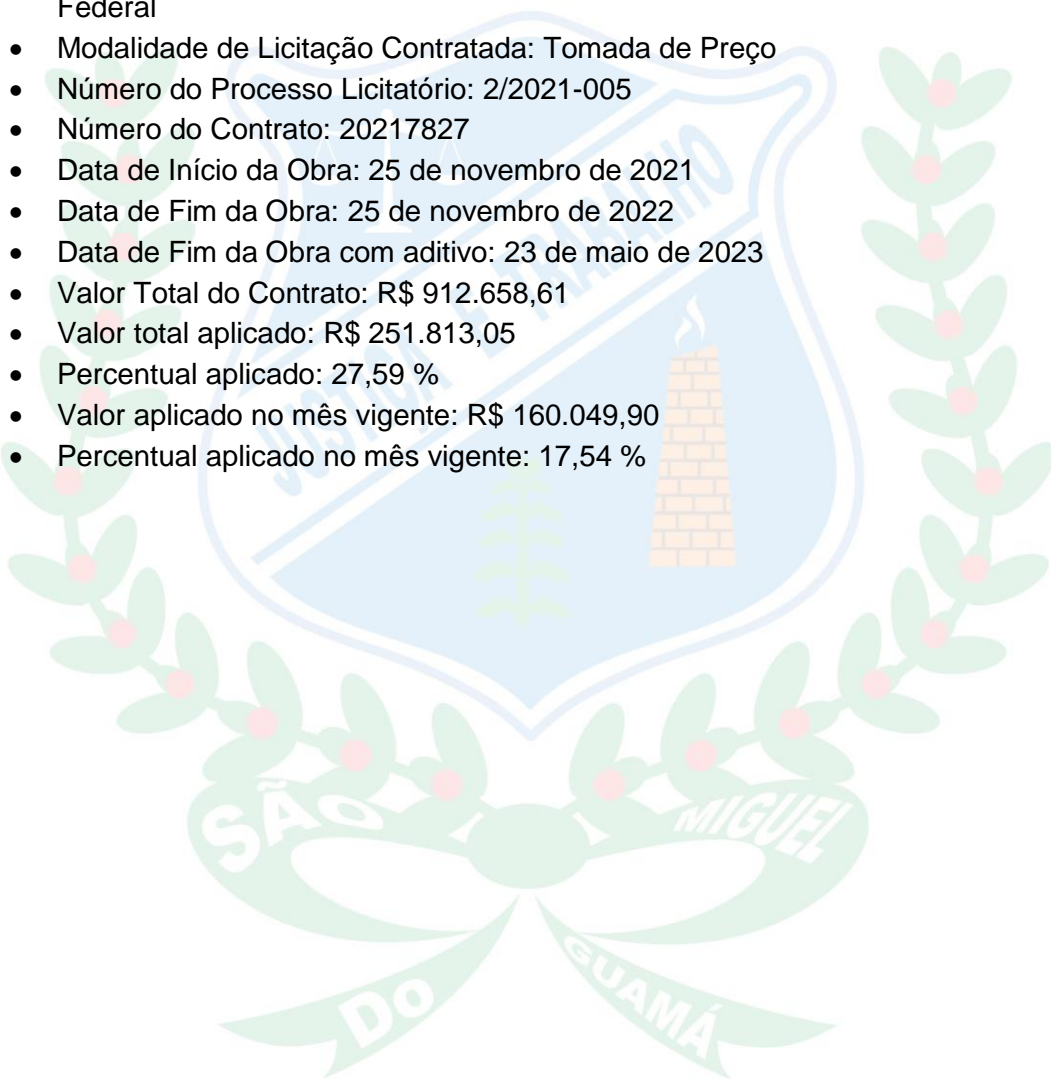




- Objeto da Obra: Ampliação e Revitalização do Cemitério São Jorge
- Nome do Contratado: R E da Costa Lira LTDA
- Local de Execução da Obra: Estrada Fortaleza – Padre Ângelo
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Convite
- Número do Processo Licitatório: 1/2022-001
- Número do Contrato: 20222894
- Data de Início da Obra: 05 de Setembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 28 de Fevereiro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 180.200,05
- Valor total aplicado: R\$ 51.140,77
- Percentual aplicado: 56,86 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 102.461,74
- Percentual aplicado no mês vigente: 28,48 %





- Objeto da Obra: Revitalização da orla do Rio Guamá (2ª Etapa)
- Nome do Contratado: M & B Engenharia LTDA
- Local de Execução da Obra: Orla do Rio Guamá
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-006
- Número do Contrato: 20222803
- Data de Início da Obra: 21 de Junho de 2021
- Data de Fim da Obra: 21 de dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 968.890,03
- Valor total aplicado: R\$ 679.482,59
- Percentual aplicado: 70,13 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 299.968,35
- Percentual aplicado no mês vigente: 30,96 %






- Objeto da Obra: Recapeamento, tapa-buraco e sinalização de vias urbanas de São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas ruas – São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 061/2022
- Número do Contrato: 20222994
- Data de Início da Obra: 21 de Novembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 05 de Janeiro de 2023
- Valor Total da Obra: R\$ 701.947,69
- Valor total aplicado: R\$ 415.127,22
- Percentual aplicado: 59,14 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 701.947,69
- Percentual aplicado no mês vigente: 59,14 %





- Objeto da Obra: Serviços de Execução e Manutenção de Pontes de Madeira na zona rural de São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Oliveira Comércio, serviços e construções EIRELI
- Local de Execução da Obra: Comunidade São Jorge – Zona Rural de São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Carona
- Número do Processo Licitatório: A/2022-007
- Número do Contrato: 20223113
- Data de Início da Obra: 23 de Novembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 22 de Junho de 2023
- Valor Total da Obra: R\$ 310.262,51
- Valor total aplicado: R\$ 62.020,86
- Percentual aplicado: 19,99 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 62.020,86
- Percentual aplicado no mês vigente: 19,99 %

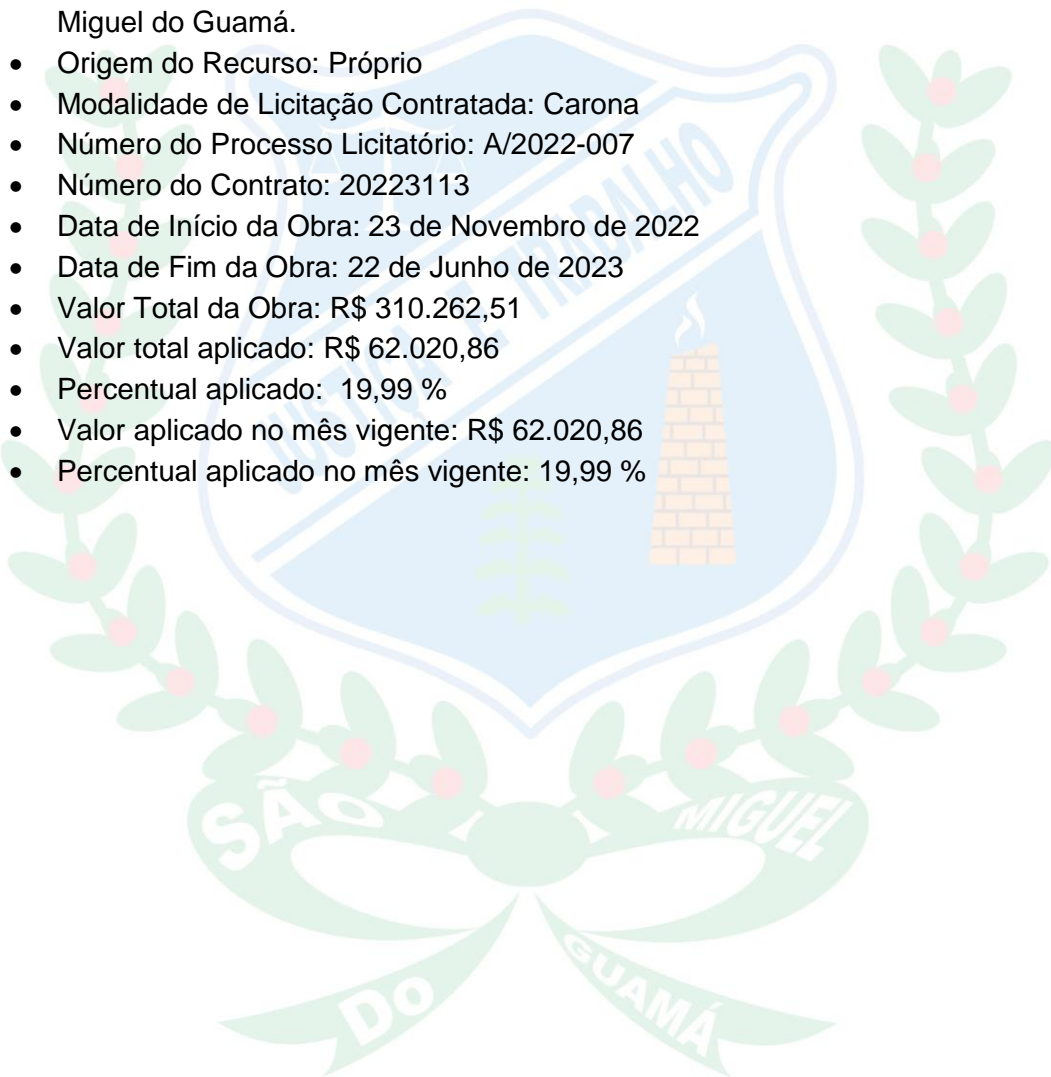



- Objeto do Serviço: Topografia nas áreas urbanas e rurais do município de São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Pará Engenharia ME
- Local de Execução do Serviço: Região do Cantagalo, zona rural
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-004
- Número do Contrato: 20222719
- Data de Início da Obra: 03 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 28 de Abril de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 512.185,71
- Valor total aplicado: R\$ 77.288,82
- Percentual aplicado: 15,09 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 40.718,76
- Percentual aplicado no mês vigente: 7,95 %

