





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Janeiro

- Objeto da Obra: Construção da EMEF Manoel Paulo - Santa Rita de Barreiras
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Comunidade Santa Rita de Barreiras – Zona Rural de São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-010
- Número do Contrato: 20223018
- Data de Início da Obra: 14 de Dezembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 14 de Dezembro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.463.170,00
- Valor total aplicado: R\$ 301.413,03
- Percentual aplicado: 20,60 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 201.185,88
- Percentual aplicado no mês vigente: 13,75 %



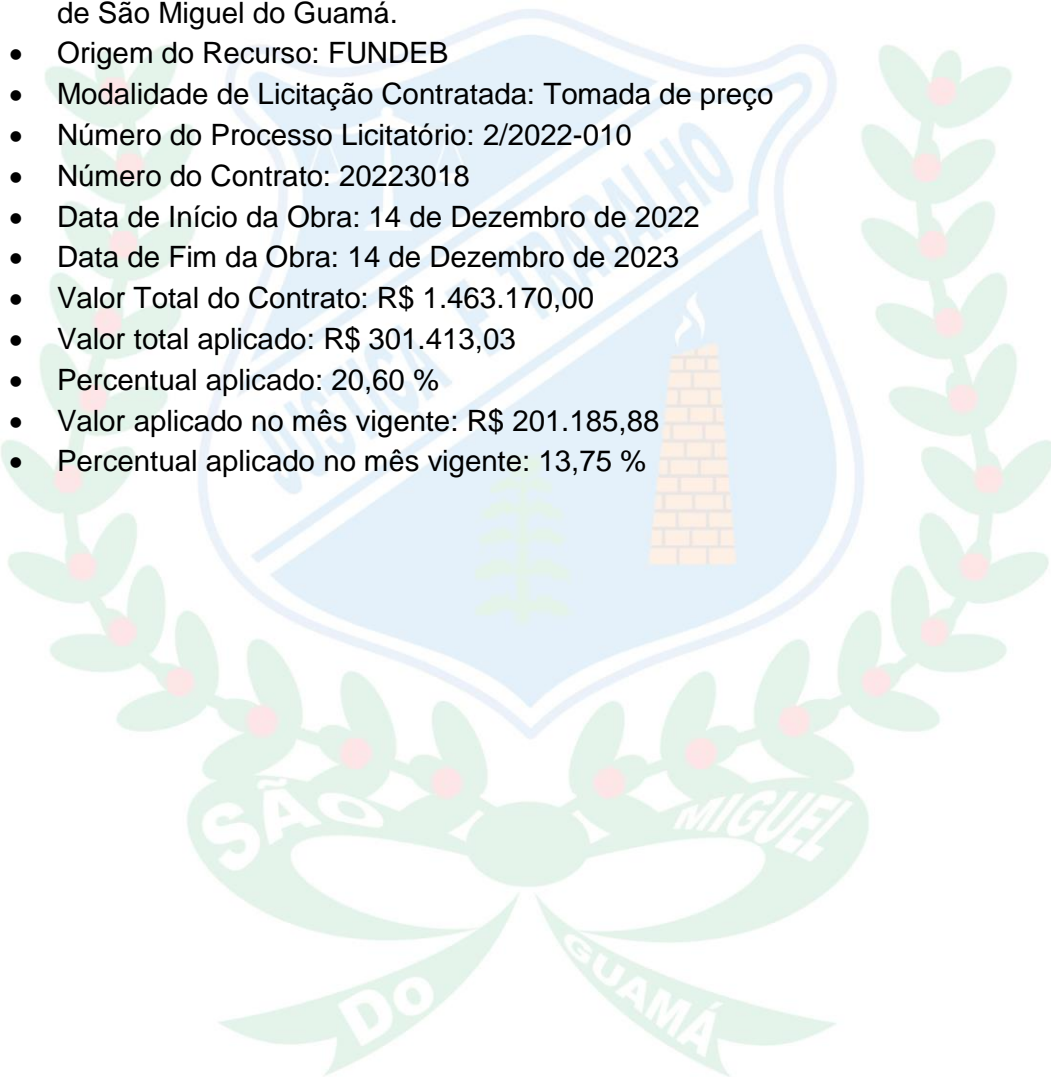

- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Reforma do prédio que sediará a estação cidadania
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222956
- Data de Início da Obra: 13 de Outubro de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 87.477,50
- Valor total aplicado: R\$ 87.477,50
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 31.318,82
- Percentual aplicado no mês vigente: 35,80 %





- Objeto da Obra: Reforma do Posto de Saúde do Perpétuo Socorro.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel Com Agostinho Siqueira.
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-001
- Número do Contrato: 20221647
- Data de Início da Obra: 10 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Setembro de 2022
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 06 de março de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 461.271,93
- Valor do Aditivo: R\$ 104.593,22
- Percentual do Aditivo: 22,67%
- Valor Total com aditivo: R\$ 565.865,15
- Valor total aplicado: R\$ 565.842,15
- Percentual aplicado: 122,67 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 86.165,60
- Percentual aplicado no mês vigente: 18,68 %






- Objeto da Obra: Construção do Prédio da EMEF Raimunda de Oliveira Machado – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Transterra Logística e Empreendimentos LTDA.
- Local de Execução da Obra: Av Cipriano Mendes – sn.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20217818
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Data de Fim da Obra com aditivo: 20 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.655.510,74
- Valor de Reequilíbrio de Preços: R\$ 133.513,33
- Valor Total do Contrato com Reequilíbrio: R\$ 1.789.024,07
- Valor total aplicado: R\$ 1.270.159,09
- Percentual aplicado: 76,72 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 284.633,73
- Percentual aplicado no mês vigente: 17,19 %





- Objeto da Obra: Construção da EMEF DR Antônio do Carmo Barbosa, zona rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Adiel Reis Erelí.
- Local de Execução da Obra: Comunidade Santo Antônio
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 02/2022-005
- Número do Contrato: 20222845
- Data de Início da Obra: 21 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 19 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 791.998,72
- Valor total aplicado: R\$ 579.030,26
- Percentual aplicado: 73,11 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 146.757,36
- Percentual aplicado no mês vigente: 18,53 %

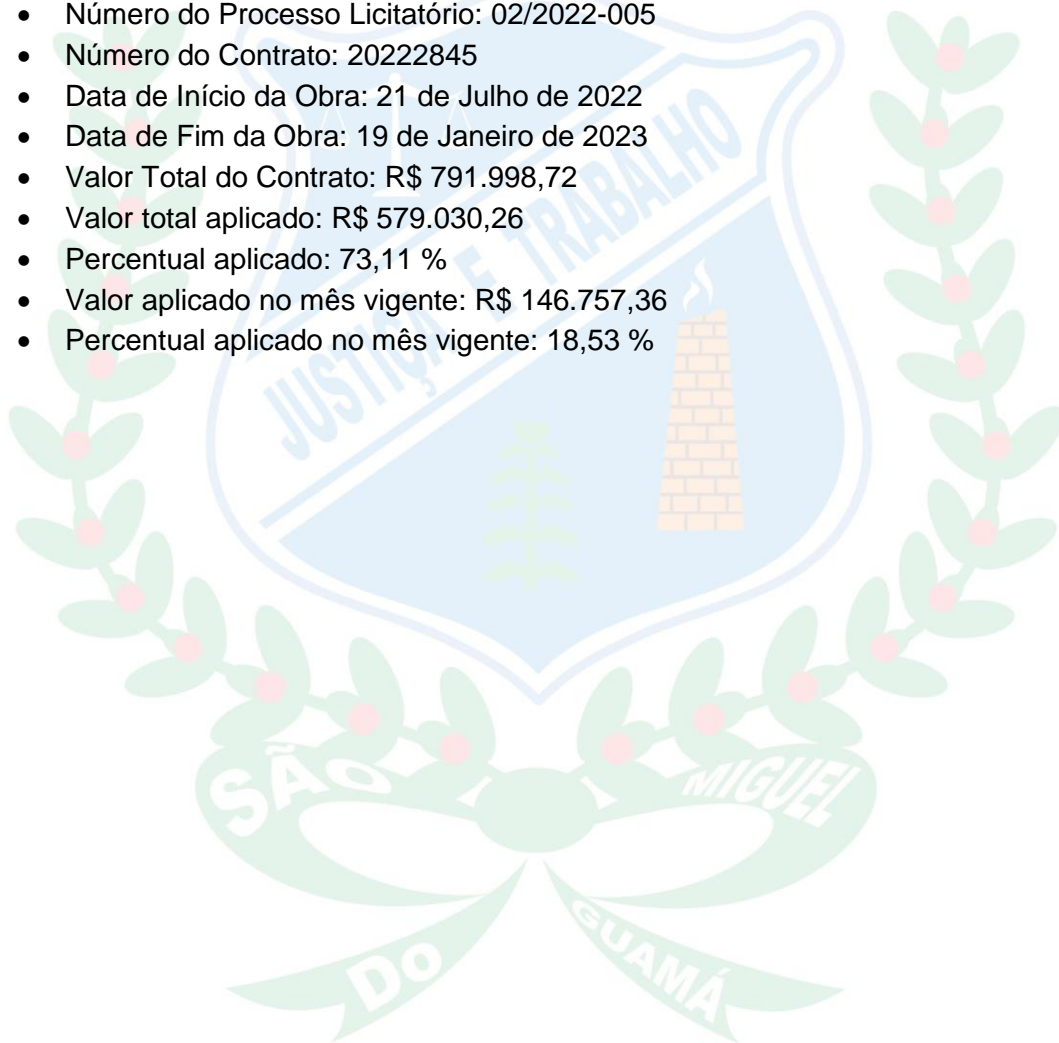



- Objeto da Obra: Pavimentação em bloquetes de vias urbanas do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Comunidade do Acari – Zona Rural
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-006
- Número do Contrato: 20222997
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 22 de Março de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 285.146,86
- Valor total aplicado: R\$ 154.173,31
- Percentual aplicado: 54,07 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 53.480,69
- Percentual aplicado no mês vigente: 18,76 %





- Objeto da Obra: Serviços de Execução e Manutenção de Pontes de Madeira na zona rural de São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Oliveira Comércio, serviços e construções EIRELI
- Local de Execução da Obra: Ajuá e Parazinho – Zona Rural de São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Carona
- Número do Processo Licitatório: A/2022-007
- Número do Contrato: 20223113
- Data de Início da Obra: 23 de Novembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 22 de Junho de 2023
- Valor Total da Obra: R\$ 310.262,51
- Valor total aplicado: R\$ 111.579,26
- Percentual aplicado: 35,96 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 49.558,40
- Percentual aplicado no mês vigente: 15,97 %





- Objeto da Obra: Construção da feira do produtor rural e mercado municipal do pequeno comerciante.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Avenida Tancredo Neves – São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Regional – Governo federal
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 02/2022-007
- Número do Contrato: 20222799
- Data de Início da Obra: 09 de Junho de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Fevereiro de 2023
- Valor Total da Obra: R\$ 2.136.586,58
- Valor total aplicado: R\$ 1.034.962,54
- Percentual aplicado: 48,44 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 538.419,82
- Percentual aplicado no mês vigente: 25,20 %





- Objeto da Obra: Recuperação Asfáltica de vias urbanas do bairro Perpétuo Socorro e Raimundo Guerreiro – São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Vias urbanas do bairro Perpétuo Socorro e Raimundo Guerreiro – São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Governo do Estado - SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-003
- Número do Contrato: 20222807
- Data de Início da Obra: 30 de Junho de 2022
- Data de Fim da Obra: 27 de Dezembro de 2022
- Data de Fim da Obra com aditivo:
- Valor Total da Obra: R\$ 2.085.021,96
- Valor total aplicado: R\$ 1.255.600,23
- Percentual aplicado: 60,22 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 173.890,83
- Percentual aplicado no mês vigente: 8,34 %





- Objeto da Obra: Recuperação Asfáltica de vias urbanas do bairro Perpétuo Socorro e Raimundo Guerreiro – São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Vias urbanas do bairro Perpétuo Socorro e Raimundo Guerreiro – São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Governo do Estado - SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-003
- Número do Contrato: 20222807
- Data de Início da Obra: 30 de Junho de 2022
- Data de Fim da Obra: 27 de Dezembro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 2.085.021,96
- Valor total aplicado: R\$ 1.255.600,23
- Percentual aplicado: 60,22 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 173.890,83
- Percentual aplicado no mês vigente: 8,34 %





- Objeto da Obra: Recuperação Asfáltica de vias urbanas de São Miguel do Guamá de acordo com convênio SEDOP nº 114/2022 celebrado entre SEDOP e Prefeitura de São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Bairro Perpétuo Socorro, São Manoel e outras vias – São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Governo do Estado – SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-004
- Número do Contrato: 20222883
- Data de Início da Obra: 25 de Agosto de 2022
- Data de Fim da Obra: 25 de Fevereiro de 2023
- Valor Total da Obra: R\$ 1.647.717,64
- Valor total aplicado: R\$ 844.290,50
- Percentual aplicado: 51,24 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 74.476,83
- Percentual aplicado no mês vigente: 4,52 %

