




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Janeiro

- Objeto da Obra: Recuperação e ampliação da Praça Licurgo Peixoto e Construção de rotatória
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli
- Local de Execução da Obra: Praça Licurgo Peixoto, beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Carta Convite
- Número do Processo Licitatório: Convite – nº 01/2021-007
- Número do Contrato: 20210328
- Data de Início da Obra: 30 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 29 de março de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 112.057,92
- Valor total aplicado: R\$ 100.852,13
- Percentual aplicado: 90,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 56.028,96
- Percentual aplicado no mês vigente: 50,00 %




- Objeto da Obra: Reforma do Mercado Municipal
- Nome do Contratado: M & B Engenharia LTDA.
- Local de Execução da Obra: Praça Bernardo Carvalho, beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: Tomada de Preço – nº 02/2021-001
- Número do Contrato: 20210274
- Data de Início da Obra: 01 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 27 de fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 297.393,25
- Valor total aplicado: R\$ 291.445,40
- Percentual aplicado: 98,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 89.217,98
- Percentual aplicado no mês vigente: 30,00 %

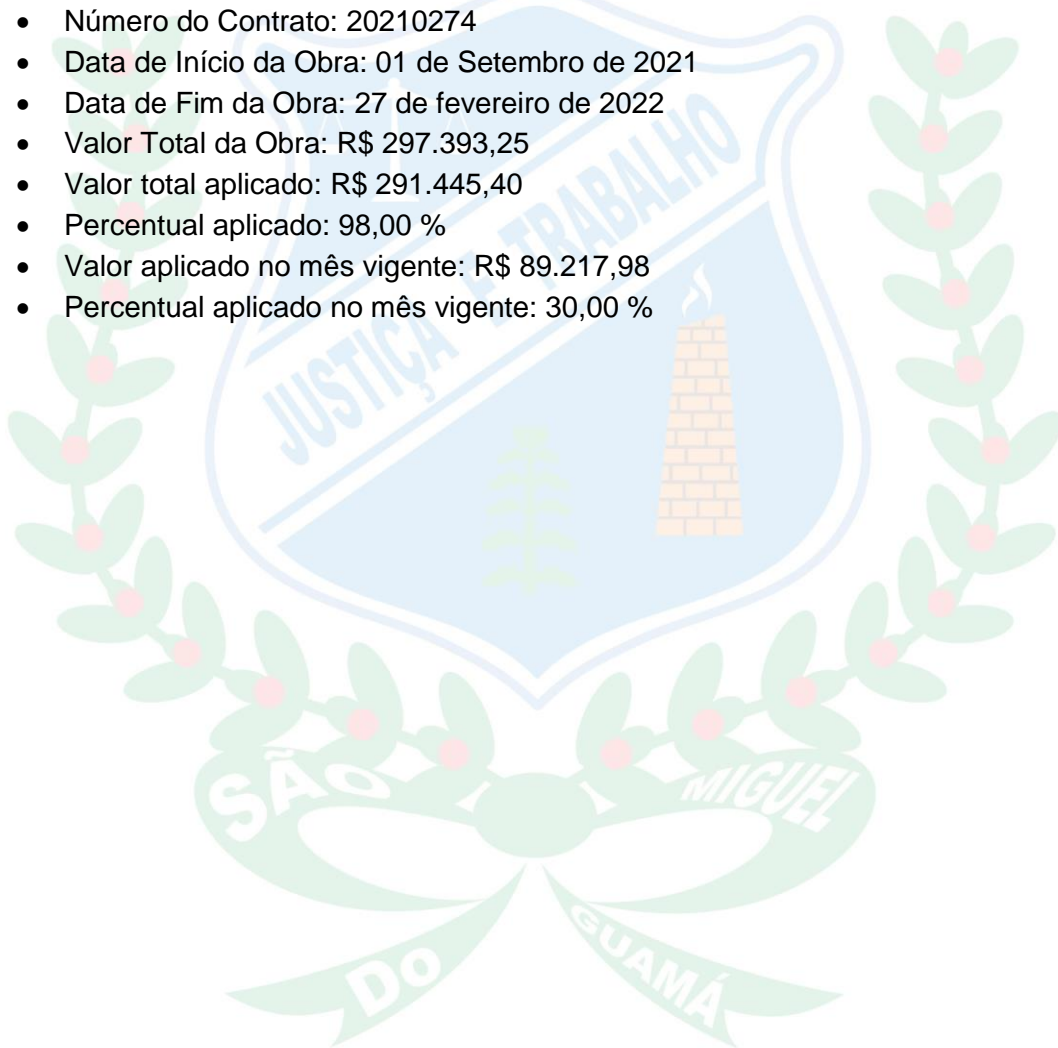




- Objeto da Obra: Revitalização da Orla do Rio Guamá
- Nome do Contratado: W e M Construções e Serviços LTDA - EPP.
- Local de Execução da Obra: Orla beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: Tomada de Preço – nº 02/2021-001
- Número do Contrato: 20210273
- Data de Início da Obra: 01 de Setembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 27 de fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 244.223,12
- Valor total aplicado: R\$ 234.454,20
- Percentual aplicado: 96,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 73.266,94
- Percentual aplicado no mês vigente: 30,00 %

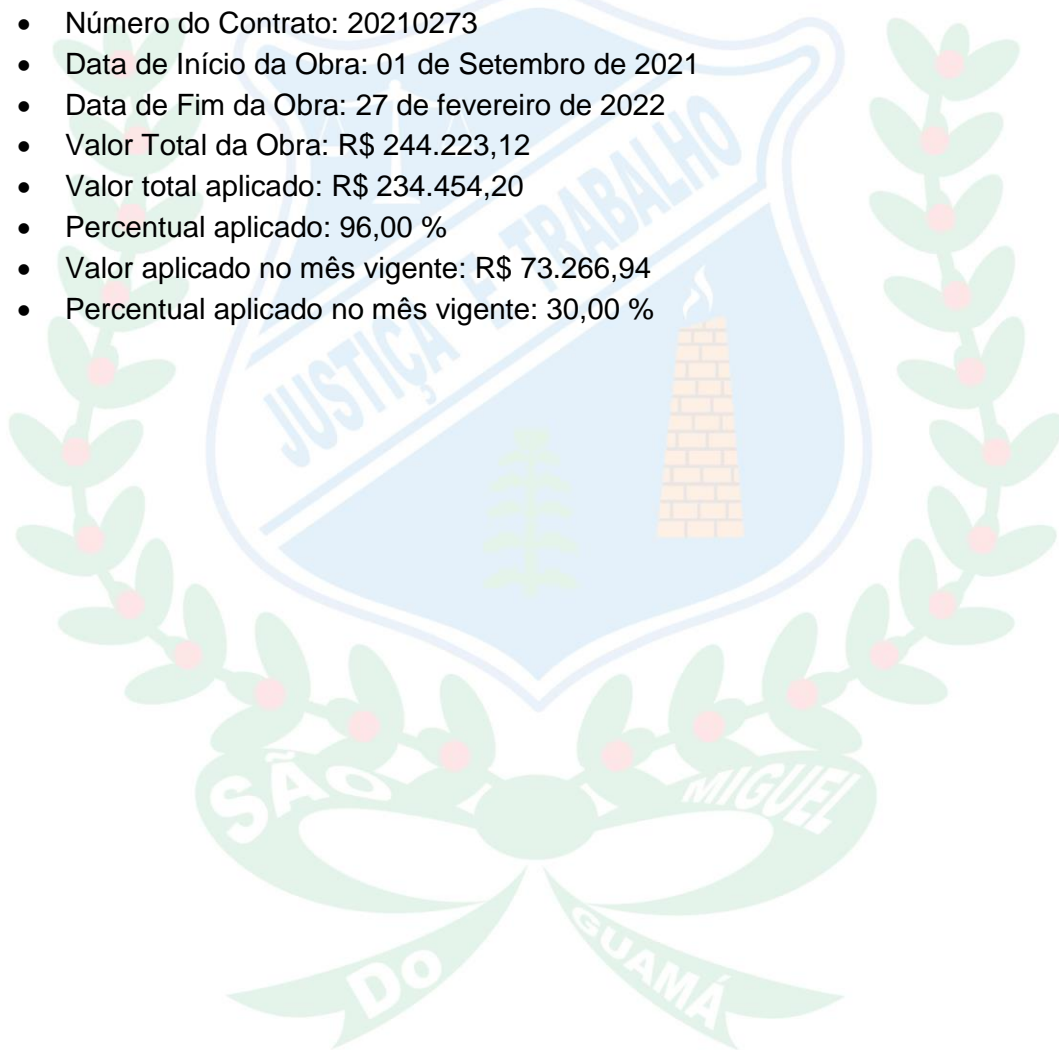



- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Demanda da Secretaria de Infraestrutura.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 123.423,47
- Percentual aplicado: 11,46 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 30.000,17
- Percentual aplicado no mês vigente: 2,24 %

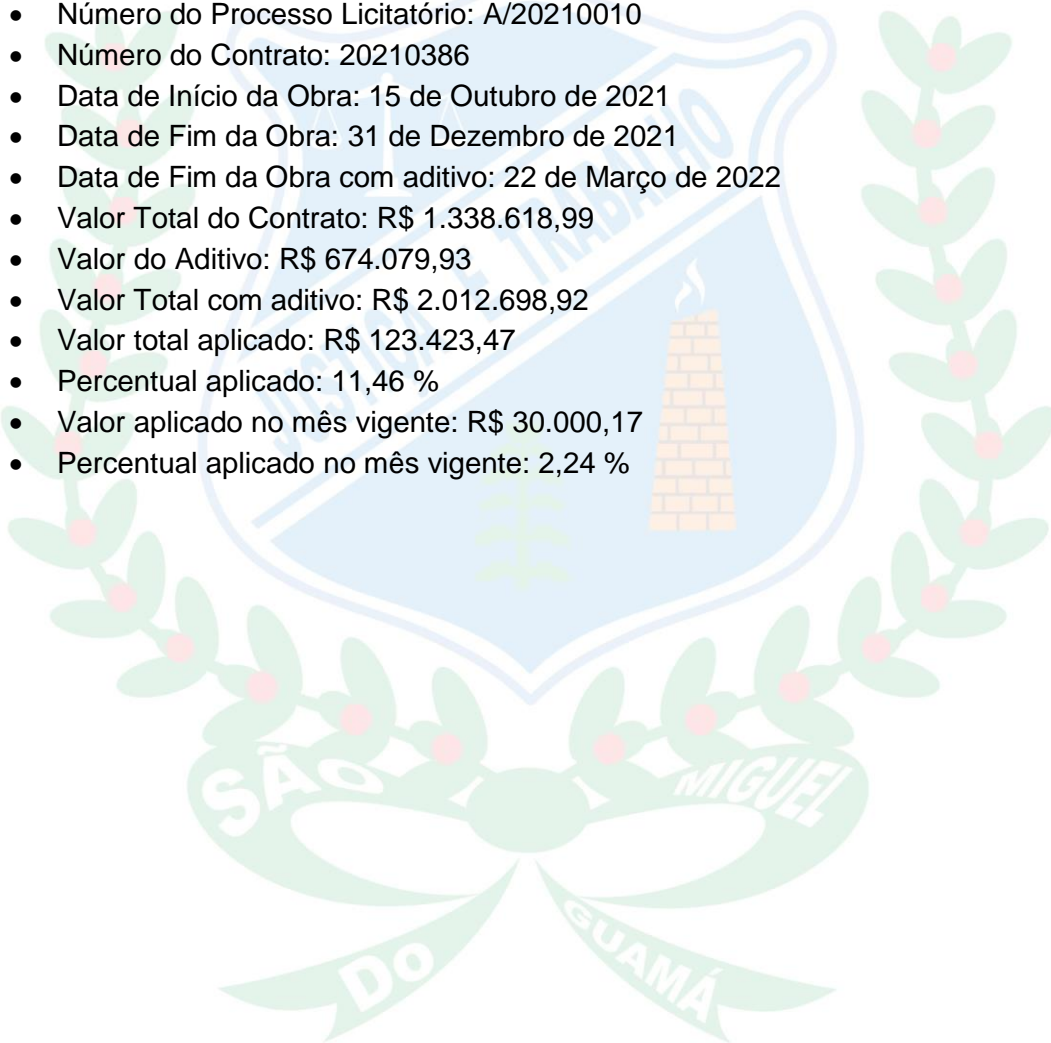



- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Sargento Palheta.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 61.807,39
- Percentual aplicado: 3,07 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 61.807,39
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,07 %





- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Posto de Saúde de Santa Maria de Muraiteua.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 29.978,33
- Percentual aplicado: 24,24 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 29.978,33
- Percentual aplicado no mês vigente: 2,24 %






- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Manutenção da EMEF Altamira Maria
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 37.308,53
- Percentual aplicado: 2,51 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 37.308,53
- Percentual aplicado no mês vigente: 2,51 %





- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Manutenção da EMEF Altamira Maria
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 37.308,53
- Percentual aplicado: 2,51 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 37.308,53
- Percentual aplicado no mês vigente: 2,51 %





- Objeto da Obra: Recuperação de vias urbanas com recapeamento e tapa buraco com massa asfáltica
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas ruas de São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 046/2021
- Número do Contrato: 20220002
- Data de Início da Obra: 01 de Janeiro de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.407.210,55
- Valor total aplicado: R\$ 739.965,05
- Percentual aplicado: 52,58 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 739.965,05
- Percentual aplicado no mês vigente: 52,58 %

