



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Fevereiro

- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Santa Rita do Crauateua.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 29.179,19
- Percentual aplicado: 2,18 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 29.179,19
- Percentual aplicado no mês vigente: 2,18 %




- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Galerias do bairro Patauateua.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 102.614,76
- Percentual aplicado: 7,67 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 102.614,76
- Percentual aplicado no mês vigente: 7,67 %






- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Plantio de grama nos bairros perpétuo socorro e orla da beira rio.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 11.105,28
- Percentual aplicado: 0,83 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 11.105,28
- Percentual aplicado no mês vigente: 0,83 %

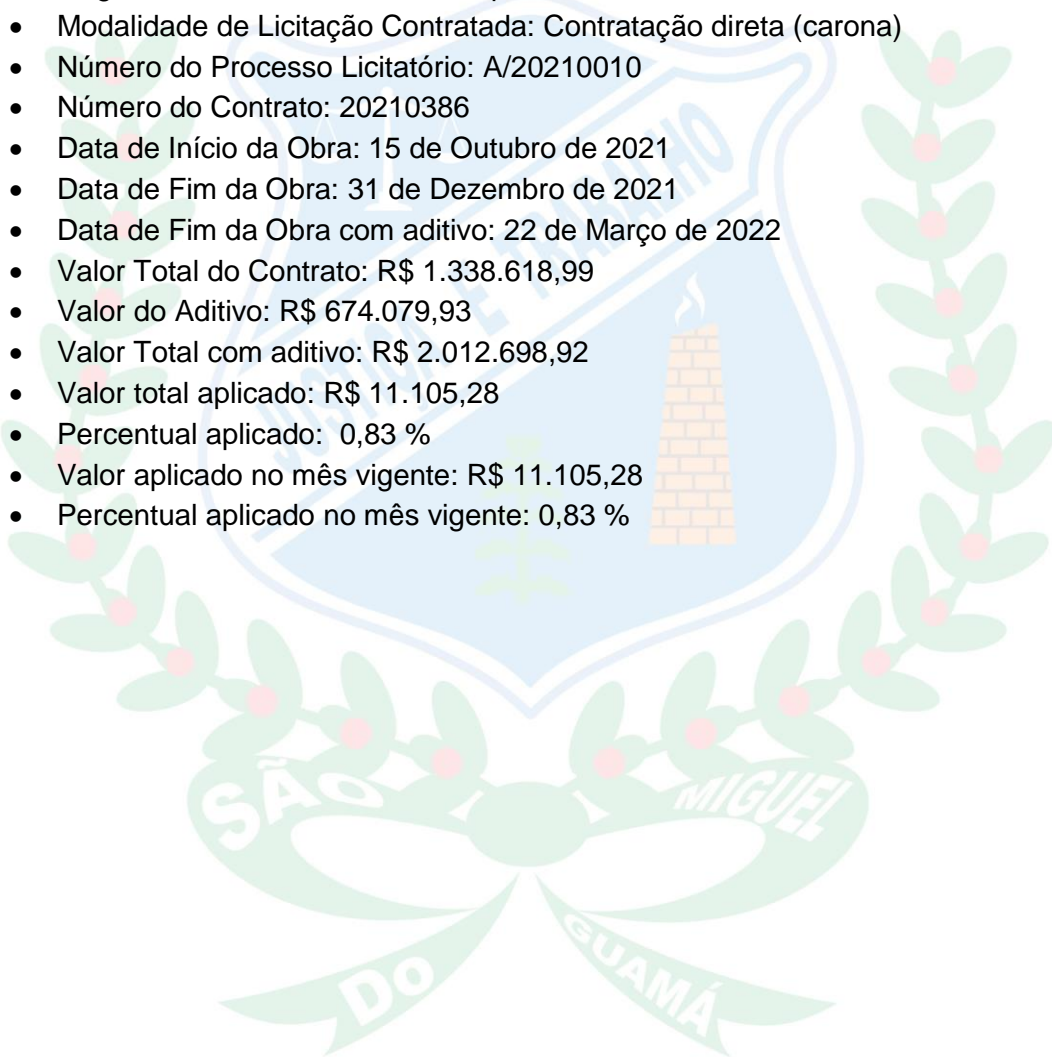




- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: UBS da comunidade do Recreio
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 49.203,52
- Percentual aplicado: 3,68 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 49.203,52
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,68 %

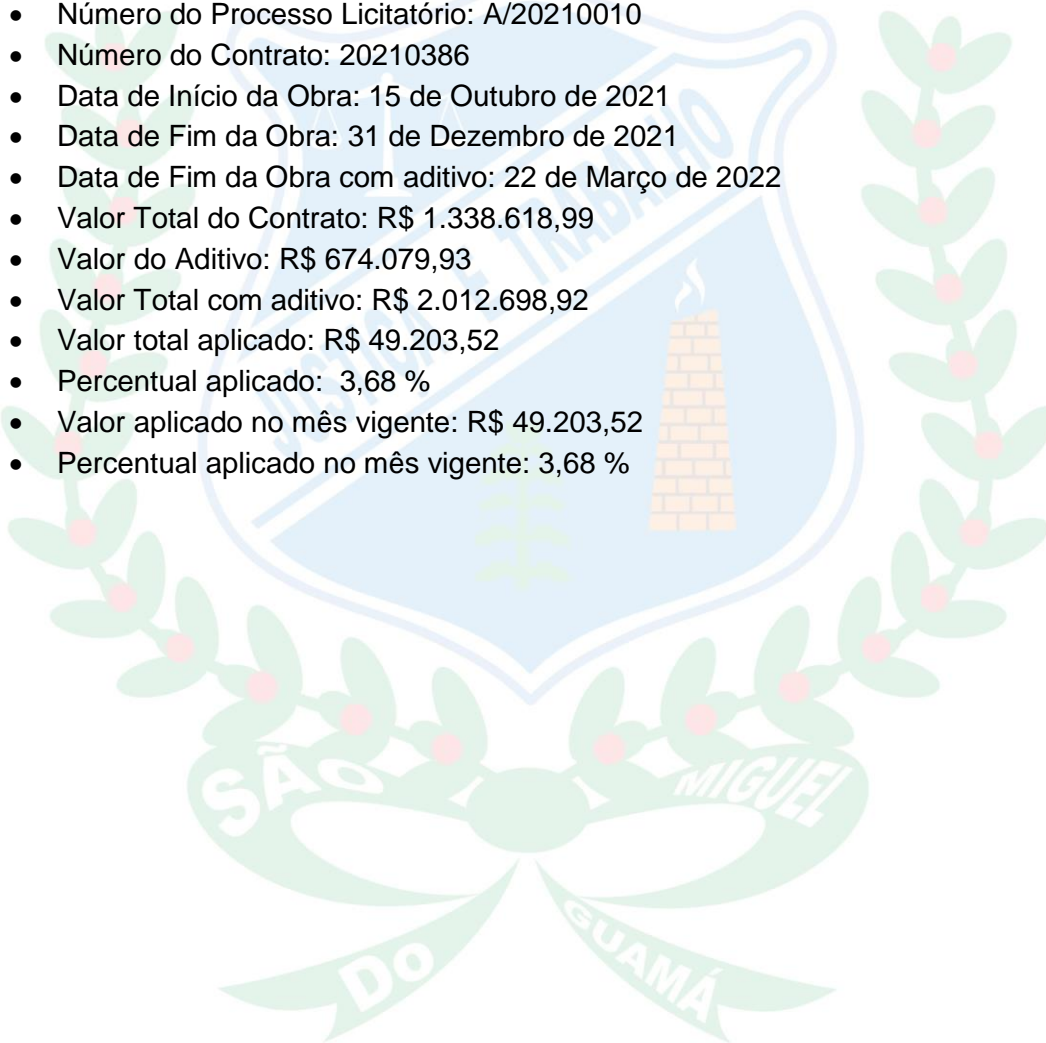




- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Manutenção da EMEIF Castelo Branco
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 155.691,67
- Percentual aplicado: 10,47 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 56.592,28
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,81 %

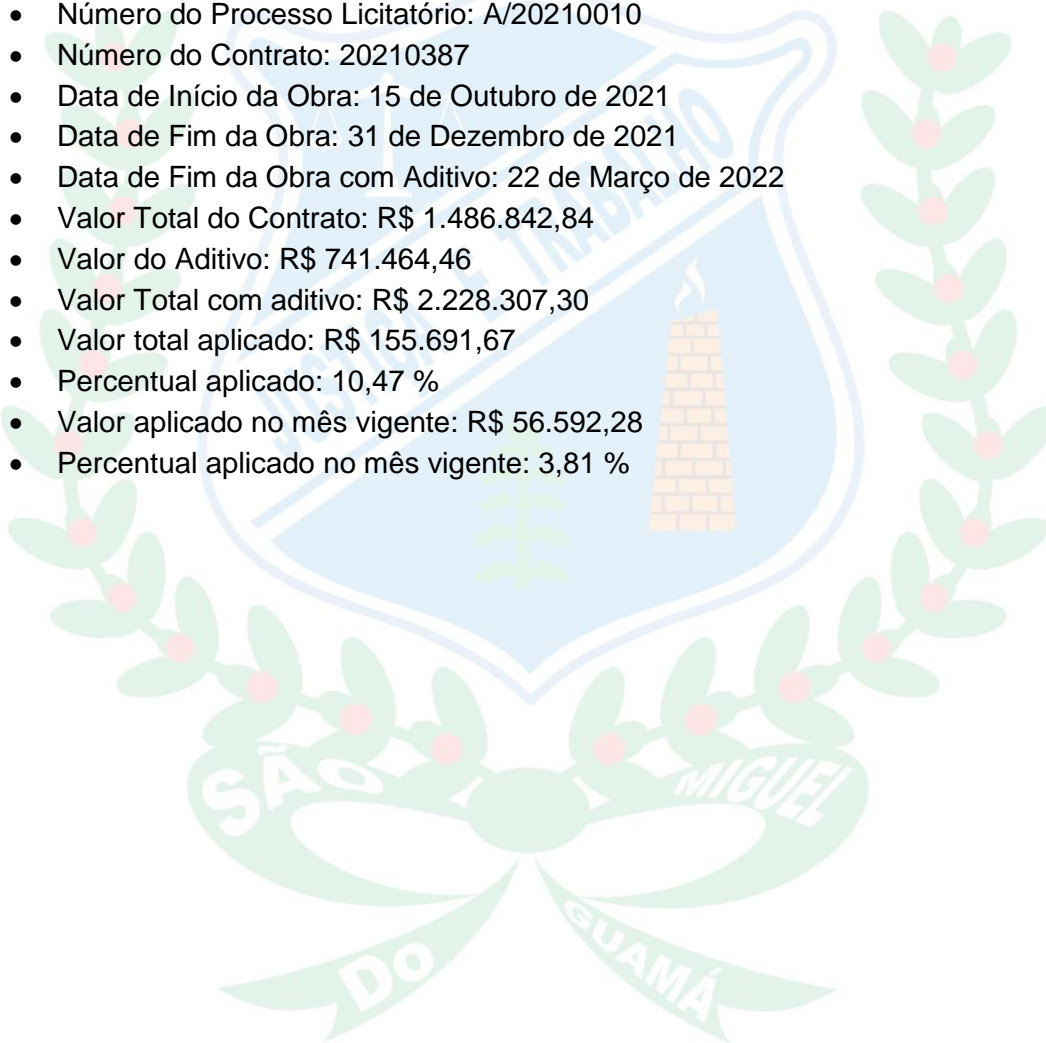



- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Alacid da Silva Nunes
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 173.835,21
- Percentual aplicado: 11,69 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 54.850,16
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,69 %

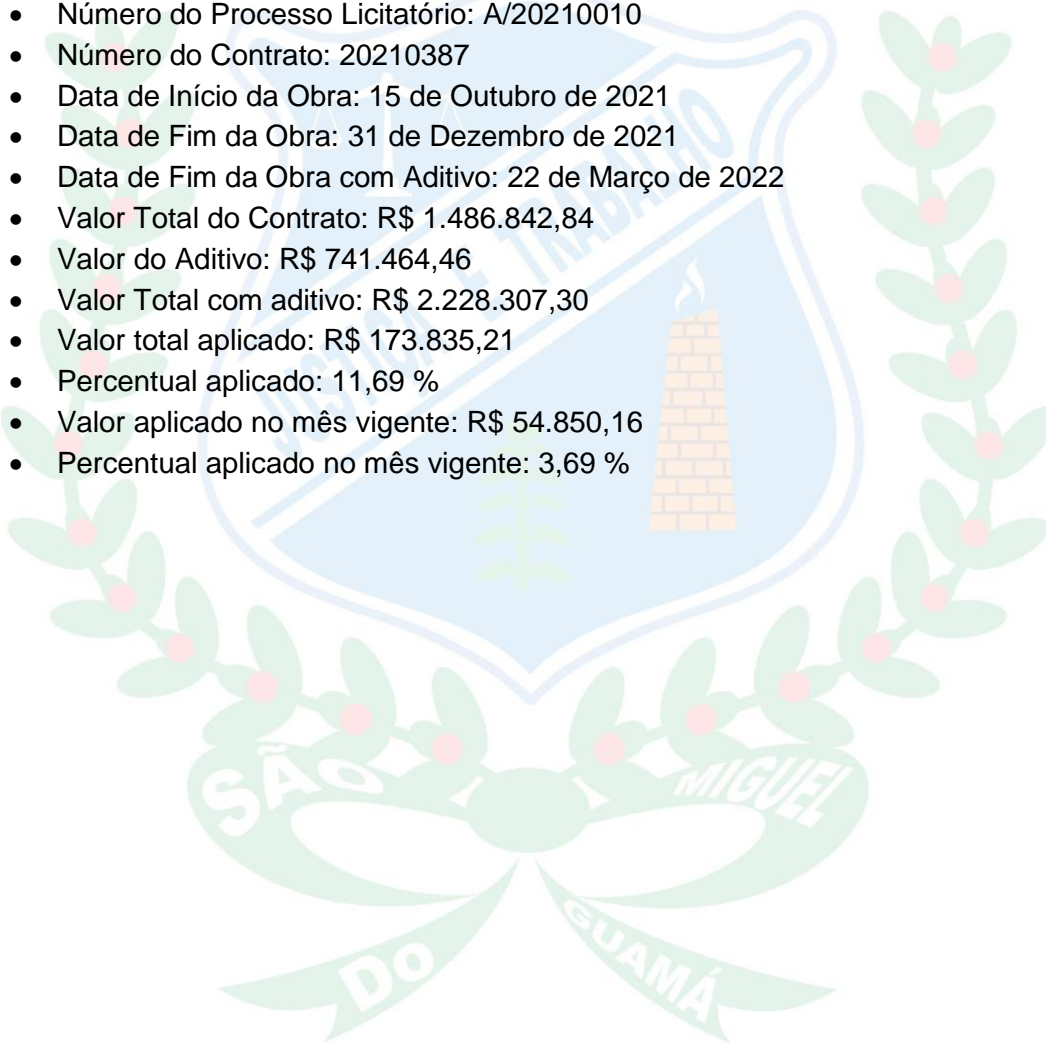




- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Hilda de Oliveira
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 282.604,68
- Percentual aplicado: 19,01 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 82.511,96
- Percentual aplicado no mês vigente: 5,55 %





- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEI Marilene Barros
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 241.535,48
- Percentual aplicado: 16,24 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 85.692,75
- Percentual aplicado no mês vigente: 5,76 %

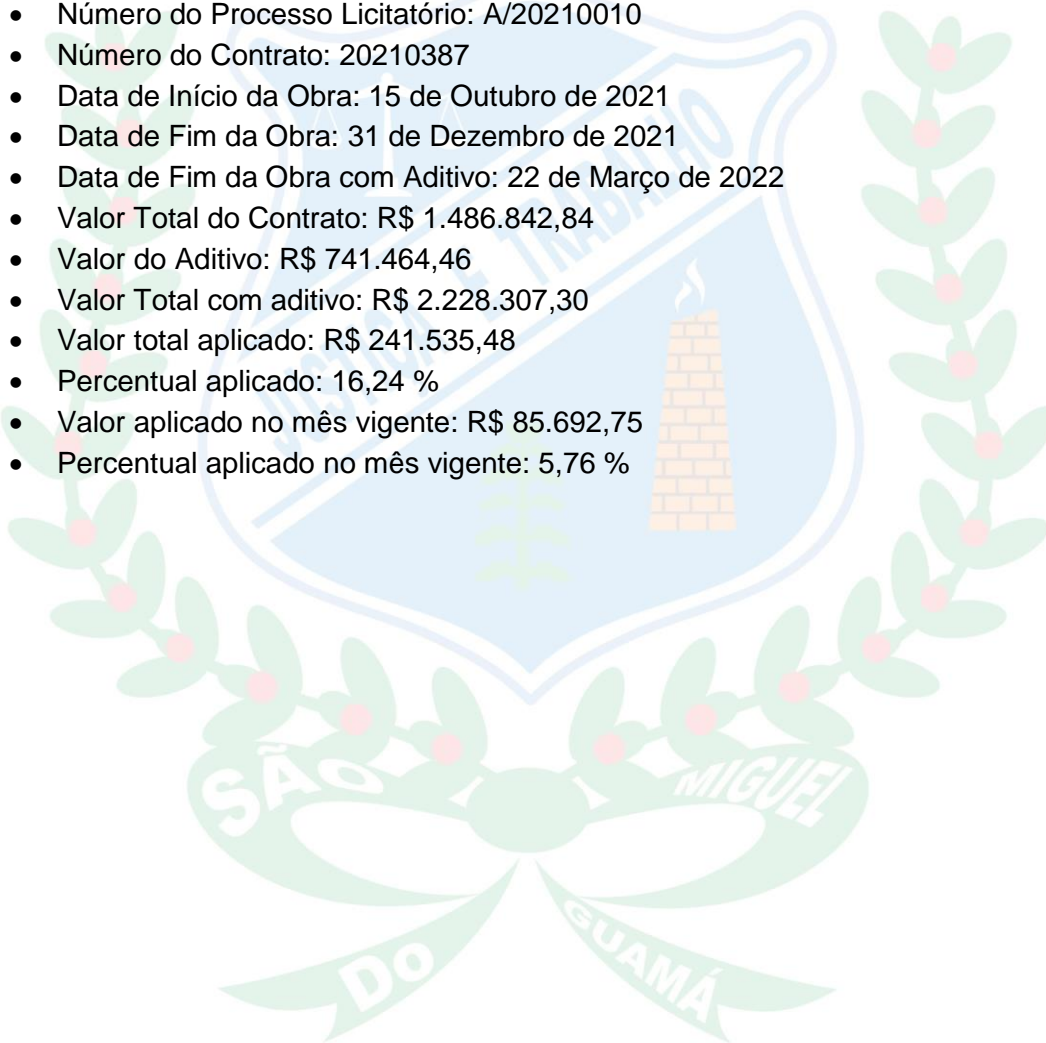




- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Isaías Gil
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 174.059,44
- Percentual aplicado: 11,71 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 56.631,72
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,81 %





- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Ambrósio Ferreira
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 154.133,40
- Percentual aplicado: 10,37 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 57.268,39
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,85 %





- Objeto da Obra: Recuperação de vias urbanas com recapeamento e tapa buraco com massa asfáltica
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas ruas de São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 046/2021
- Número do Contrato: 20220002
- Data de Início da Obra: 01 de Janeiro de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.407.210,55
- Valor total aplicado: R\$ 1.100.280,05
- Percentual aplicado: 78,19 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 360.315,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 25,60 %

