




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Dezembro

- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Demanda da Secretaria de Infraestrutura.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor total aplicado: R\$ 123.423,47
- Percentual aplicado: 9,22 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 49.881,94
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,73 %



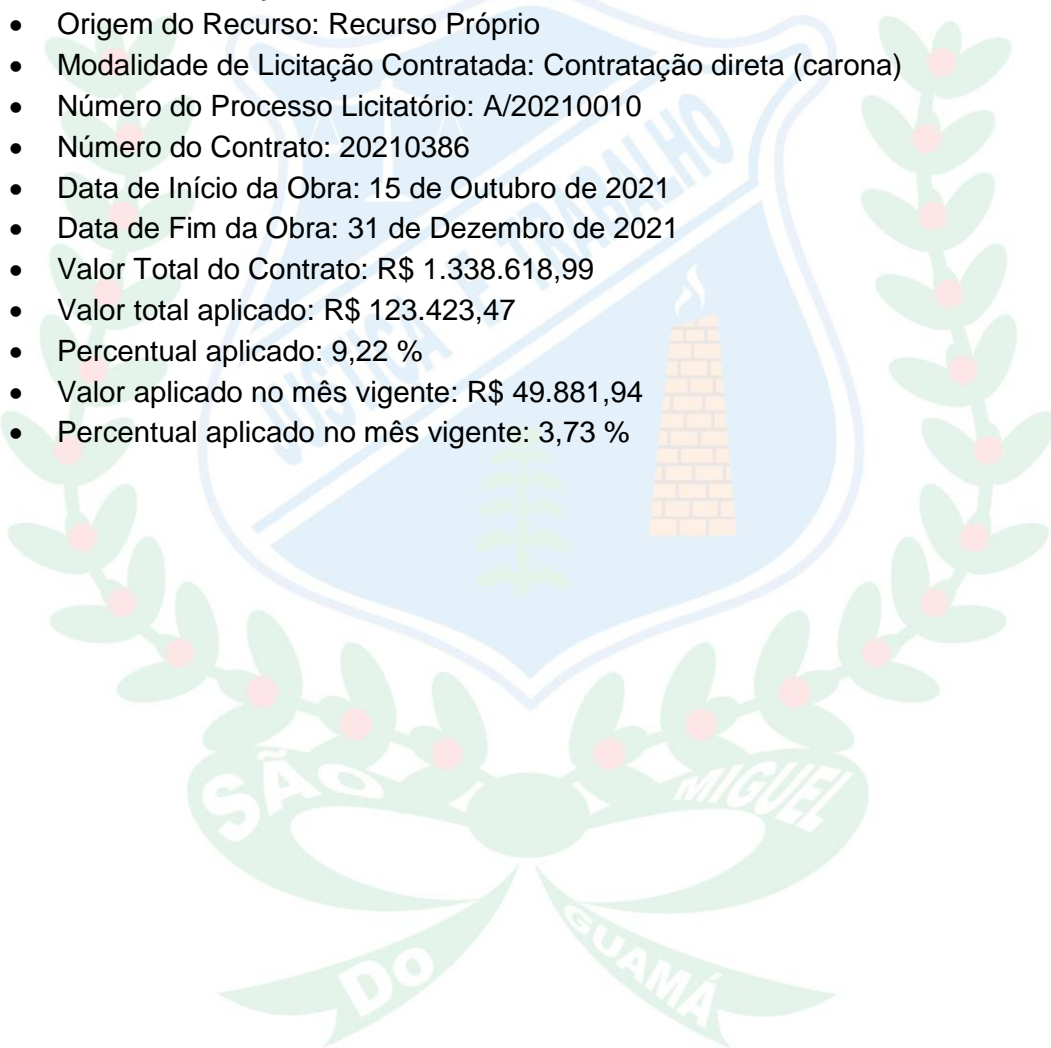

- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Manutenção da EMEF São Pedro
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor total aplicado: R\$ 45.370,58
- Percentual aplicado: 3,05 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 45.370,58
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,05 %





- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Alacid da Silva Nunes
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor total aplicado: R\$ 118.985,05
- Percentual aplicado: 8,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 118.985,05
- Percentual aplicado no mês vigente: 8,00 %





- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Hilda de Oliveira
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor total aplicado: R\$ 200.092,72
- Percentual aplicado: 13,46 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 200.092,72
- Percentual aplicado no mês vigente: 13,46 %






- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEI Marilene Barros
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor total aplicado: R\$ 155.842,73
- Percentual aplicado: 10,48 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 155.842,73
- Percentual aplicado no mês vigente: 10,48 %






- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Isaías Gil
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor total aplicado: R\$ 117.427,72
- Percentual aplicado: 7,90 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 117.427,72
- Percentual aplicado no mês vigente: 7,90 %






- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Ambrósio Ferreira
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor total aplicado: R\$ 96.865,01
- Percentual aplicado: 6,51 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 96.865,01
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,51 %

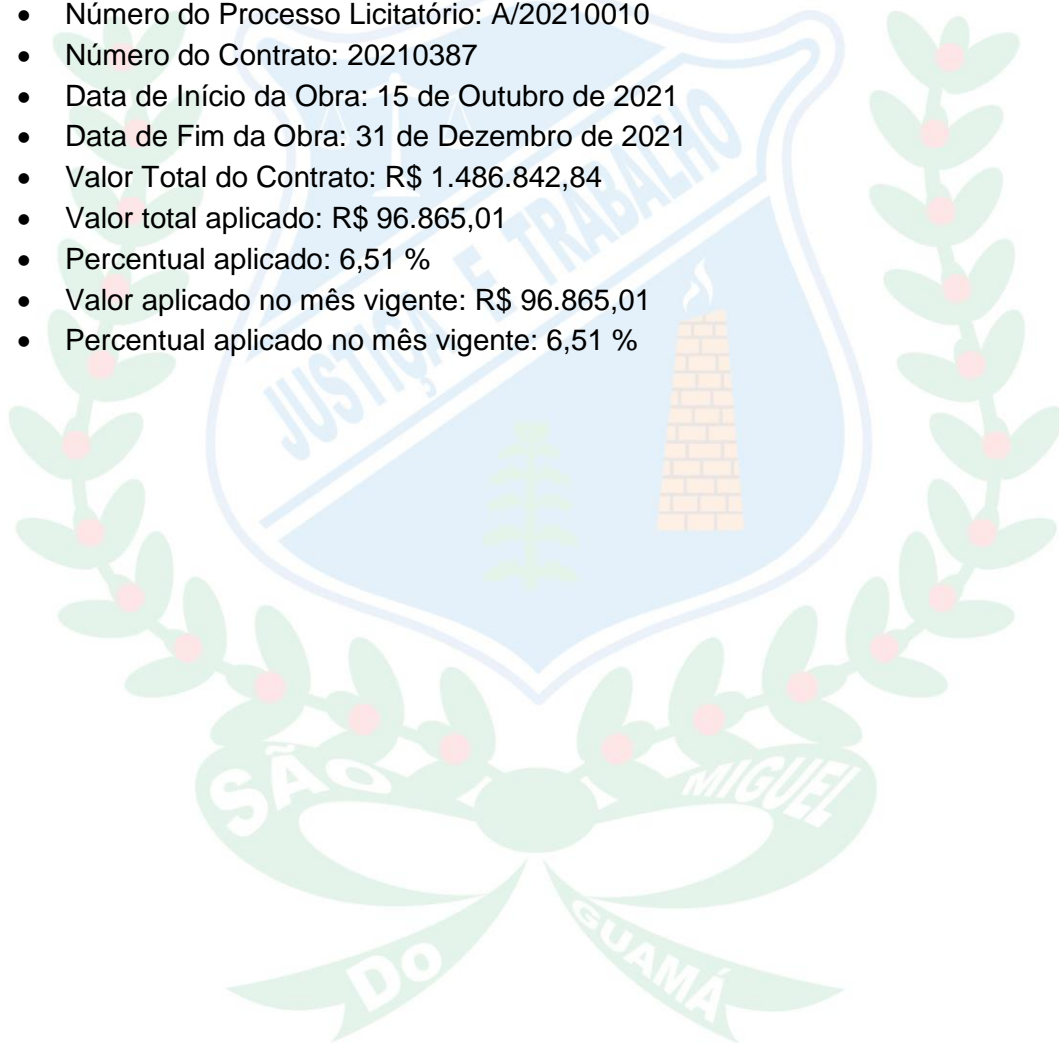



- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEIF Castelo Branco
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor total aplicado: R\$ 99.099,39
- Percentual aplicado: 6,67 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 99.099,39
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,67 %

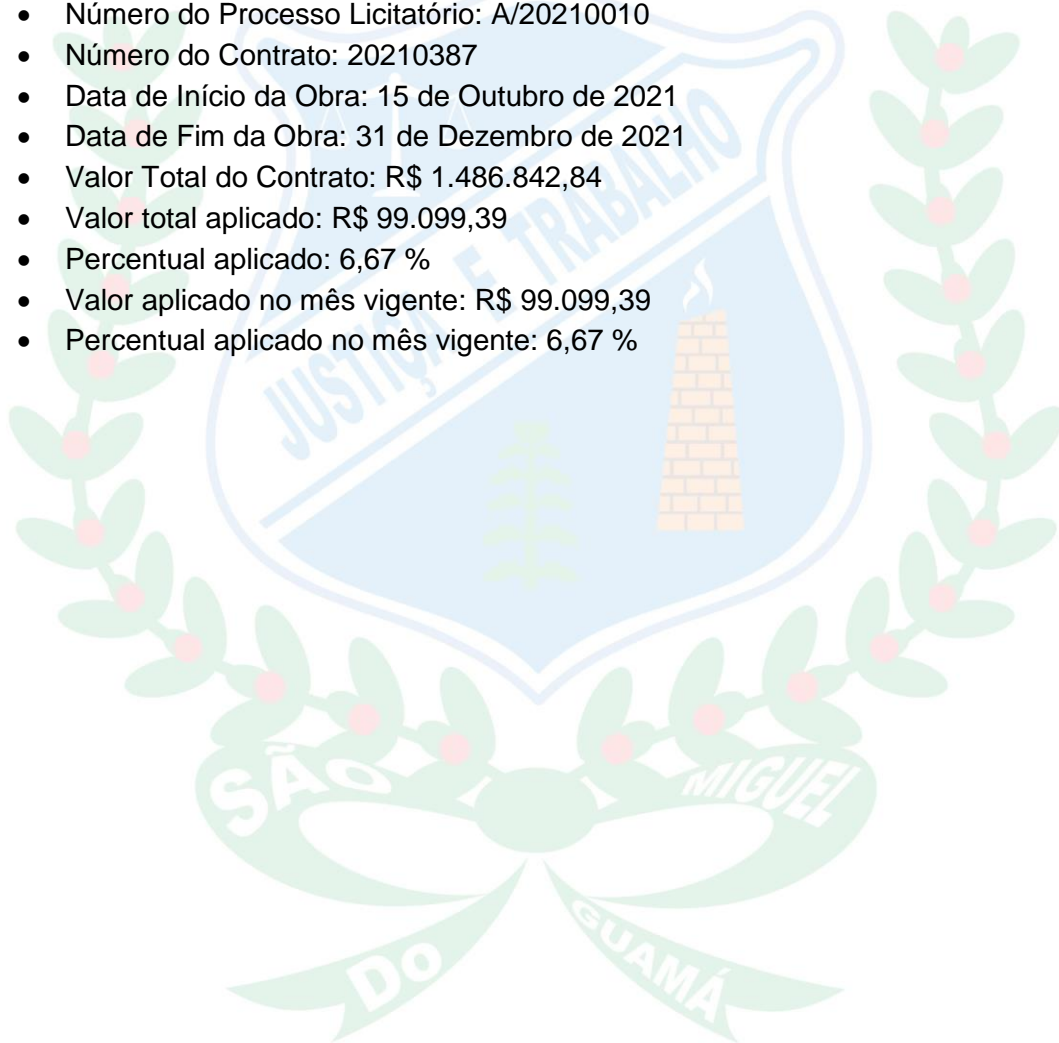



- Objeto da Obra: Recuperação de vias urbanas com recapeamento e tapa buraco com massa asfáltica
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: 7 de Janeiro, Travessa Ney Peixoto, Rua Mario Bravo, Rua Oscar Paes e Travessa Agostinho Siqueira.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 046/2021
- Número do Contrato: 20217837
- Data de Início da Obra: 01 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Valor Total da Obra: R\$ 689.586,95
- Valor total aplicado: R\$ 689.586,95
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 689.586,95
- Percentual aplicado no mês vigente: 100,00 %

