



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Março

---

- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Revitalização do Passeio Público – Vila Sorriso
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 46.392,30
- Percentual aplicado: 3,47 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 46.392,30
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,47 %




- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Revitalização da Praça Bernardo Carvalho
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 61.630,16
- Percentual aplicado: 4,60 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 61.630,16
- Percentual aplicado no mês vigente: 4,60 %






- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Drenagem e Pavimentação da Travessa Kléber – Maurício Ataíde
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 52.888,15
- Percentual aplicado: 3,95 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 52.888,15
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,95 %

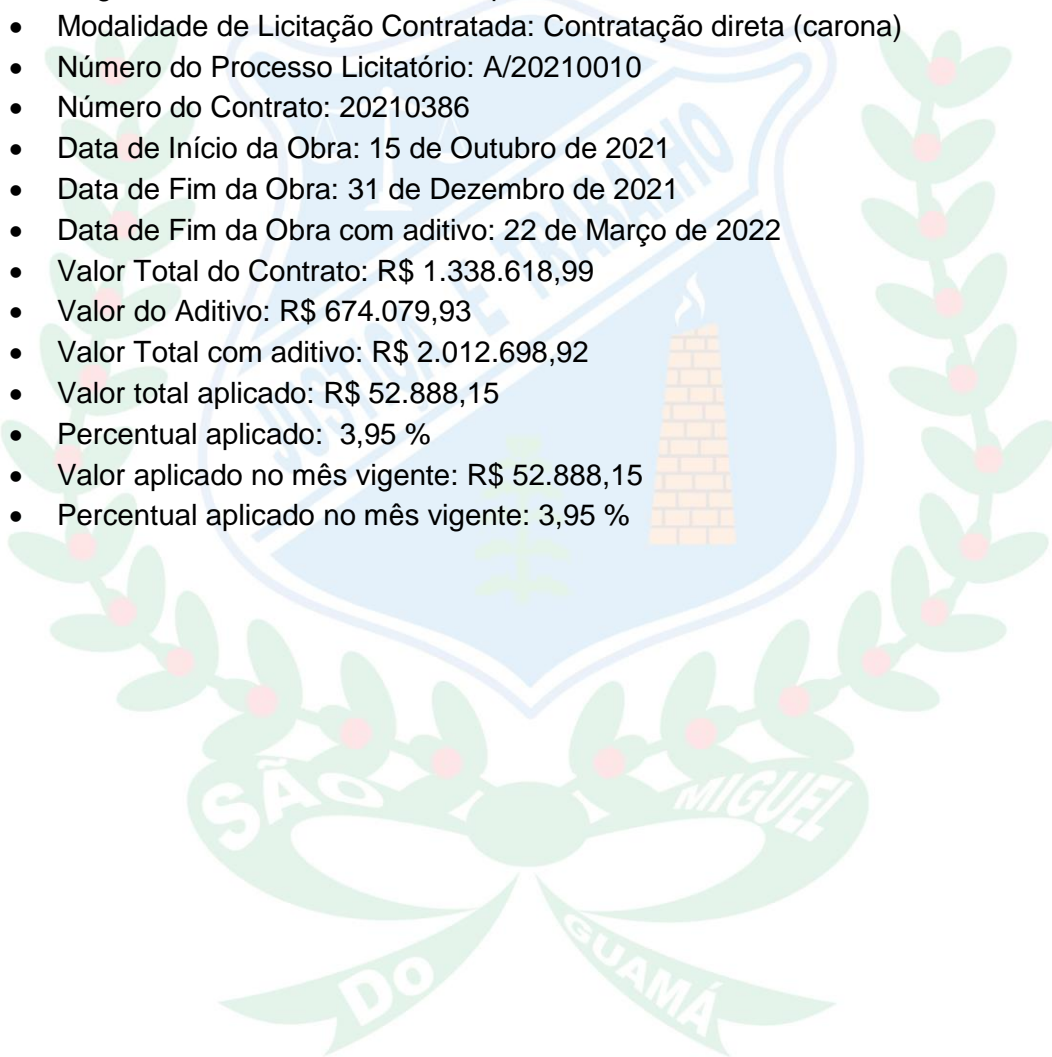



- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Reparos na rampa da orla beira rio
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210386
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.338.618,99
- Valor do Aditivo: R\$ 674.079,93
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.012.698,92
- Valor total aplicado: R\$ 45.296,99
- Percentual aplicado: 3,38 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 45.296,99
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,38 %

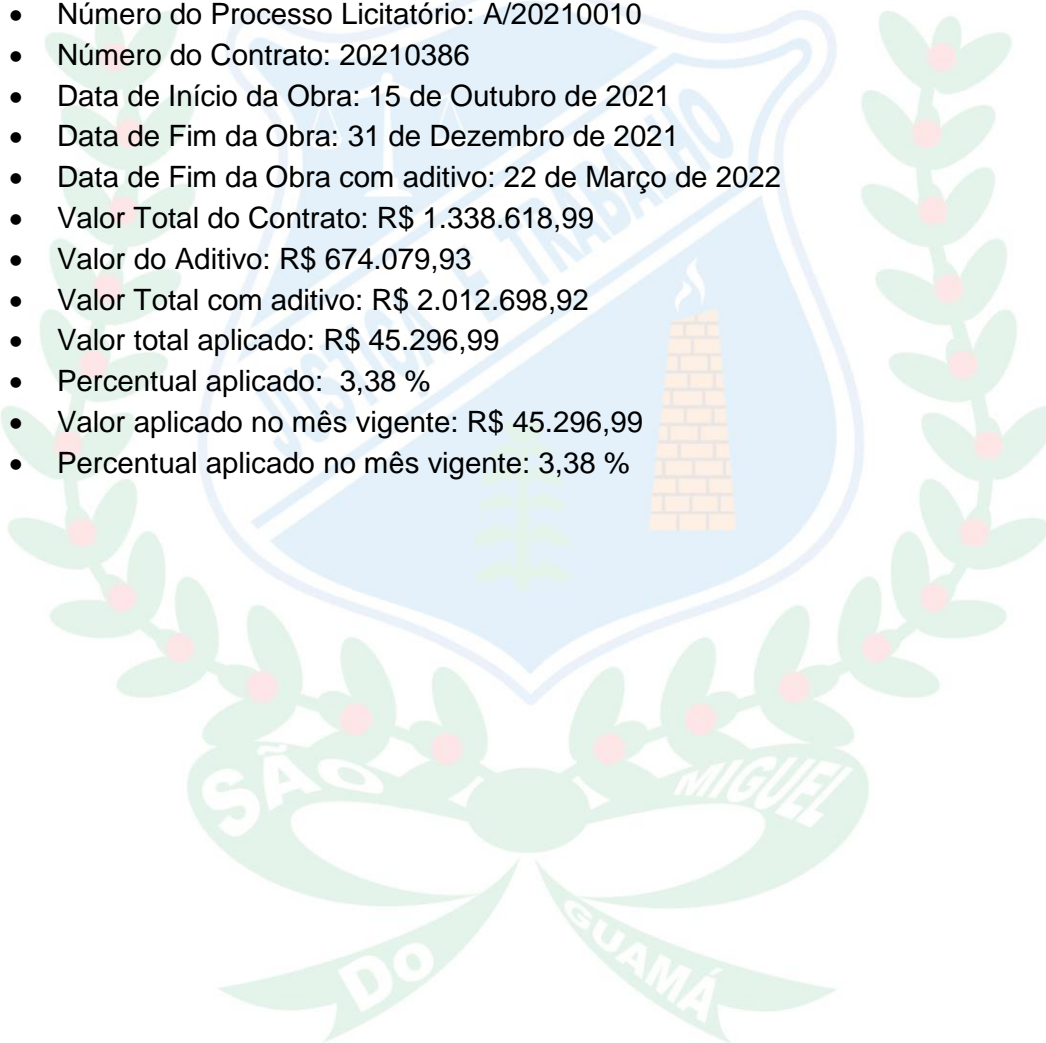






- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Hilda de Oliveira
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 483.906,59
- Percentual aplicado: 21,72 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 201.301,94
- Percentual aplicado no mês vigente: 9,03 %






- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEI Marilene Barros
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 384.019,28
- Percentual aplicado: 25,83 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 142.483,80
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,39 %

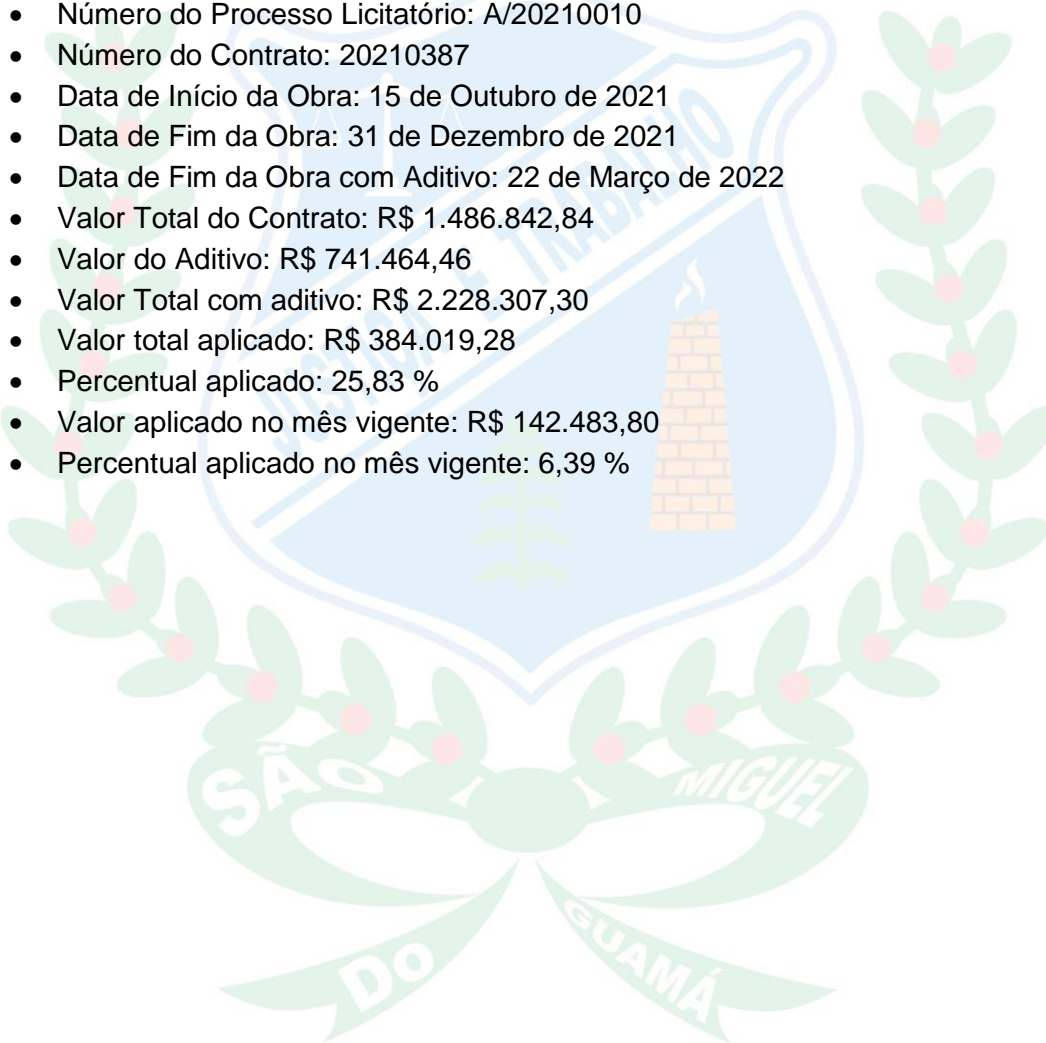




- Objeto da Obra: Manutenção e conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, cemitérios, entre outros – Secretaria de Educação.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: EMEF Ambrósio Ferreira
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Contratação direta (carona)
- Número do Processo Licitatório: A/20210010
- Número do Contrato: 20210387
- Data de Início da Obra: 15 de Outubro de 2021
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2021
- Data de Fim da Obra com Aditivo: 22 de Março de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.486.842,84
- Valor do Aditivo: R\$ 741.464,46
- Valor Total com aditivo: R\$ 2.228.307,30
- Valor total aplicado: R\$ 288.278,68
- Percentual aplicado: 19,39 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 134.145,28
- Percentual aplicado no mês vigente: 9,02 %

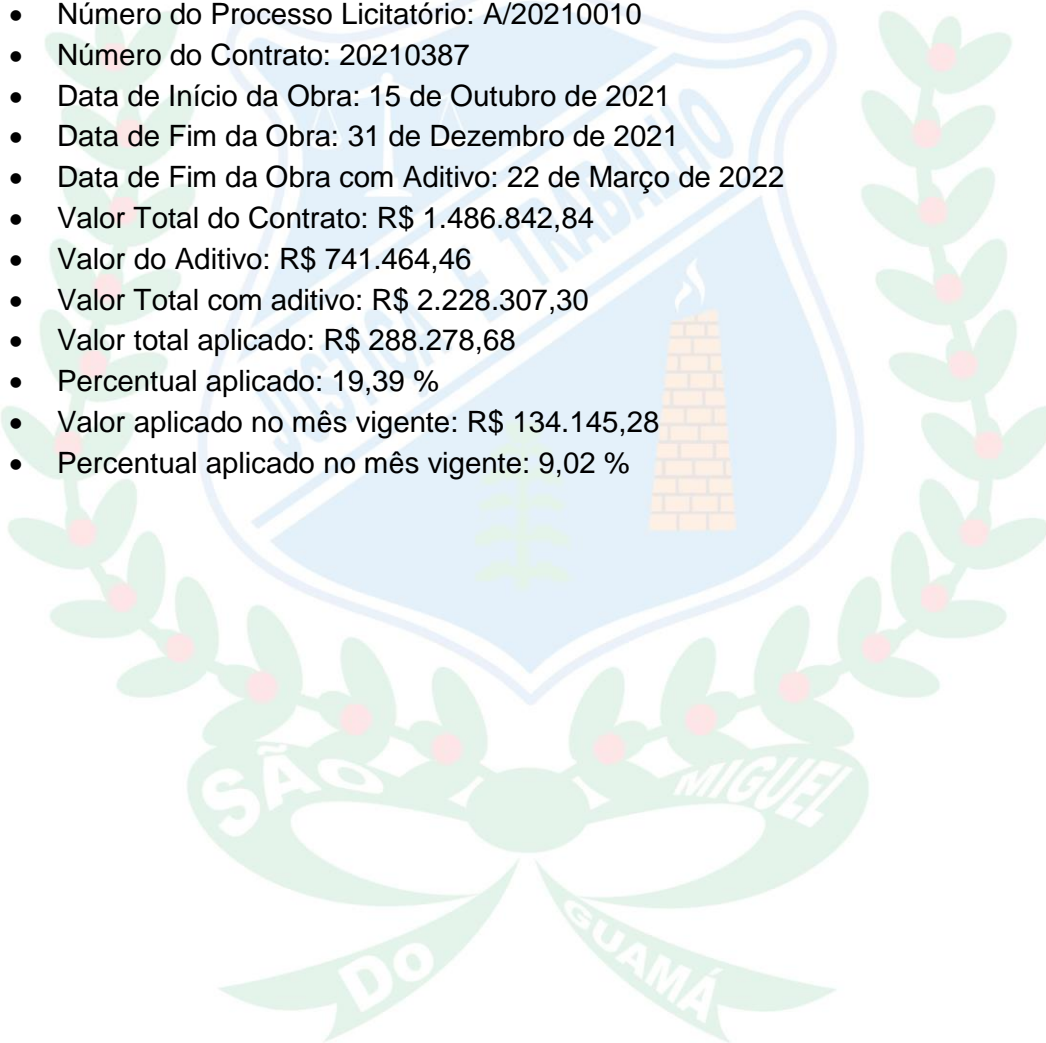




- Objeto da Obra: Recuperação de vias urbanas com recapeamento e tapa buraco com massa asfáltica
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas ruas de São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Recurso Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 046/2021
- Número do Contrato: 20220002
- Data de Início da Obra: 01 de Janeiro de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.407.210,55
- Valor total aplicado: R\$ 1.100.280,05
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 306.930,50
- Percentual aplicado no mês vigente: 21,81 %

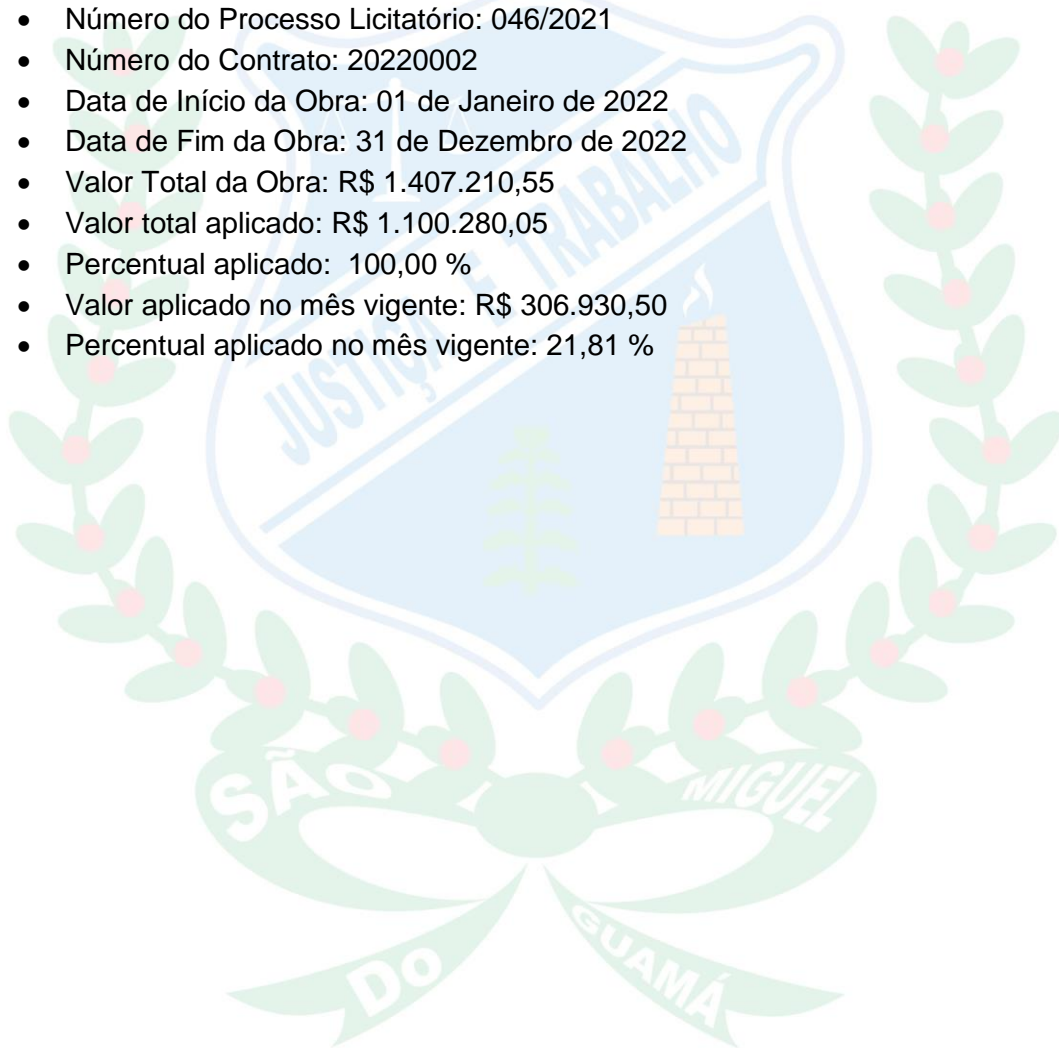






- Objeto da Obra: Construção do Prédio da EMEF Raimunda de Oliveira Machado – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Transterra Logística e Empreendimentos LTDA.
- Local de Execução da Obra: Av Cipriano Mendes – sn.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20217818
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.655.510,74
- Valor total aplicado: R\$ 57.942,88
- Percentual aplicado: 3,50 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 57.942,88
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,50 %

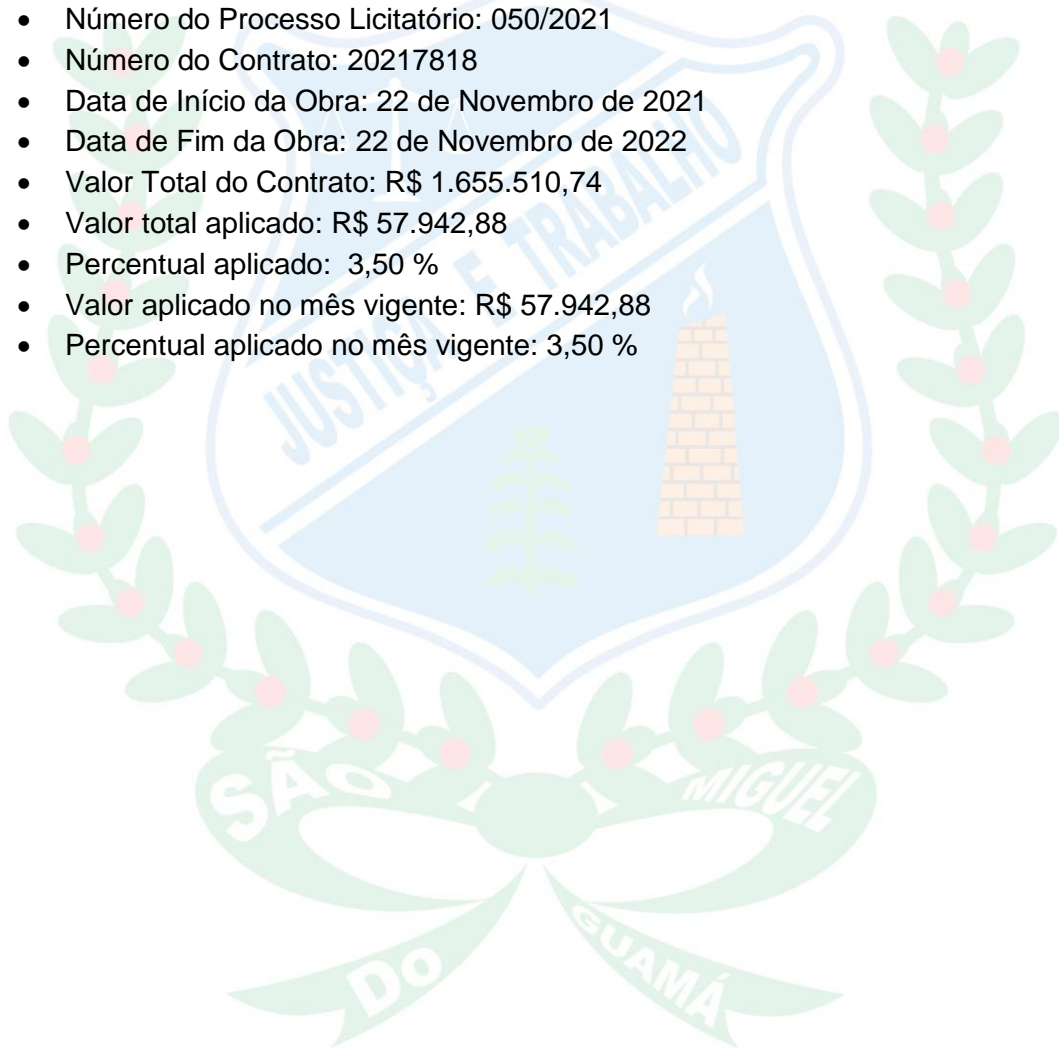




- Objeto da Obra: Reforma do Posto de Saúde do Perpétuo Socorro.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel Com Agostinho Siqueira.
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-001
- Número do Contrato: 20221647
- Data de Início da Obra: 10 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Setembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 461.271,93
- Valor total aplicado: R\$ 53.046,27
- Percentual aplicado: 11,50 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 53.046,27
- Percentual aplicado no mês vigente: 11,50 %

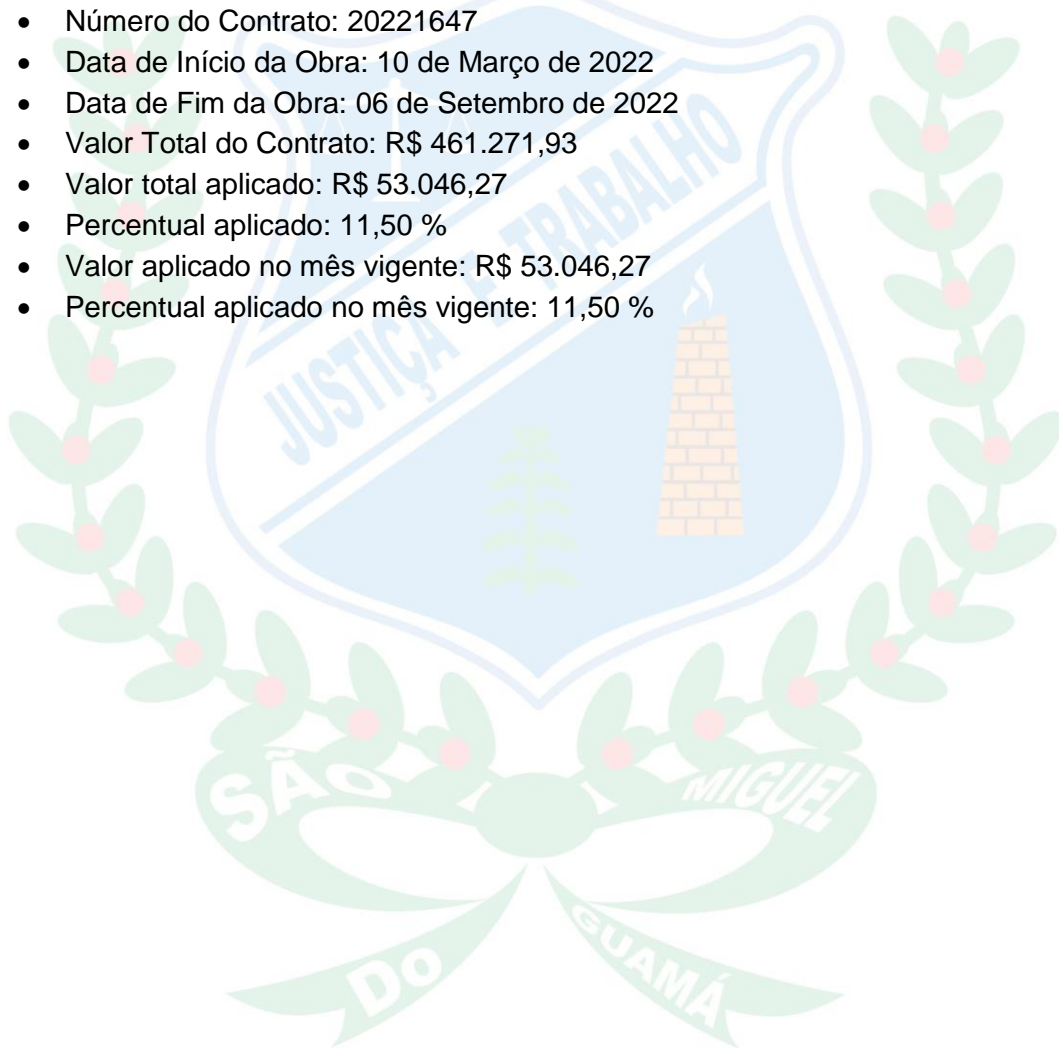




- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Cipriano Mendes Rodrigues – Atrás do Hospital
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20221683
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 139.502,70
- Valor total aplicado: R\$ 96.366,08
- Percentual aplicado: 69,08 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 17.271,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 12,38 %

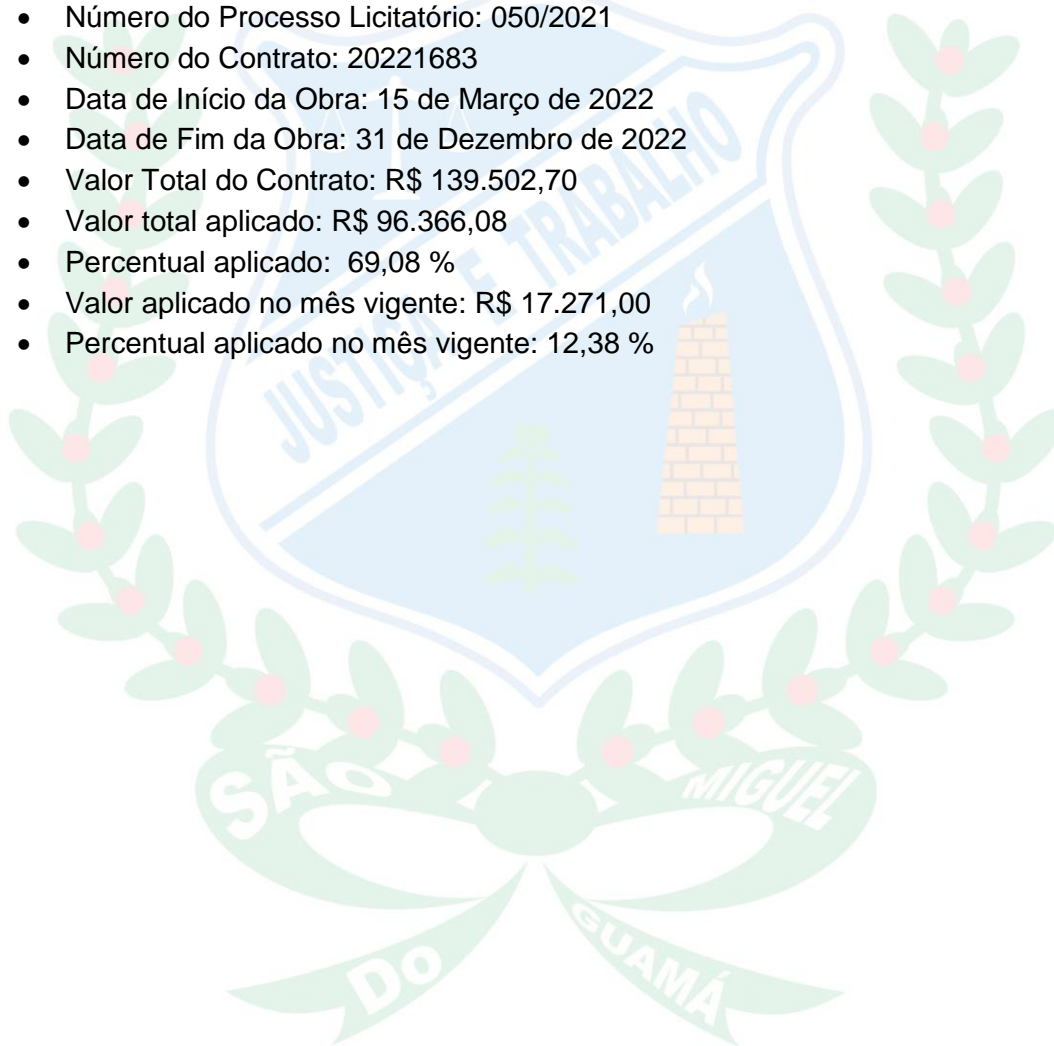



- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Jonas Pacheco – Maurício Ataíde
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20221683
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 139.502,70
- Valor total aplicado: R\$ 96.366,08
- Percentual aplicado: 69,08 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 22.999,08
- Percentual aplicado no mês vigente: 16,49 %

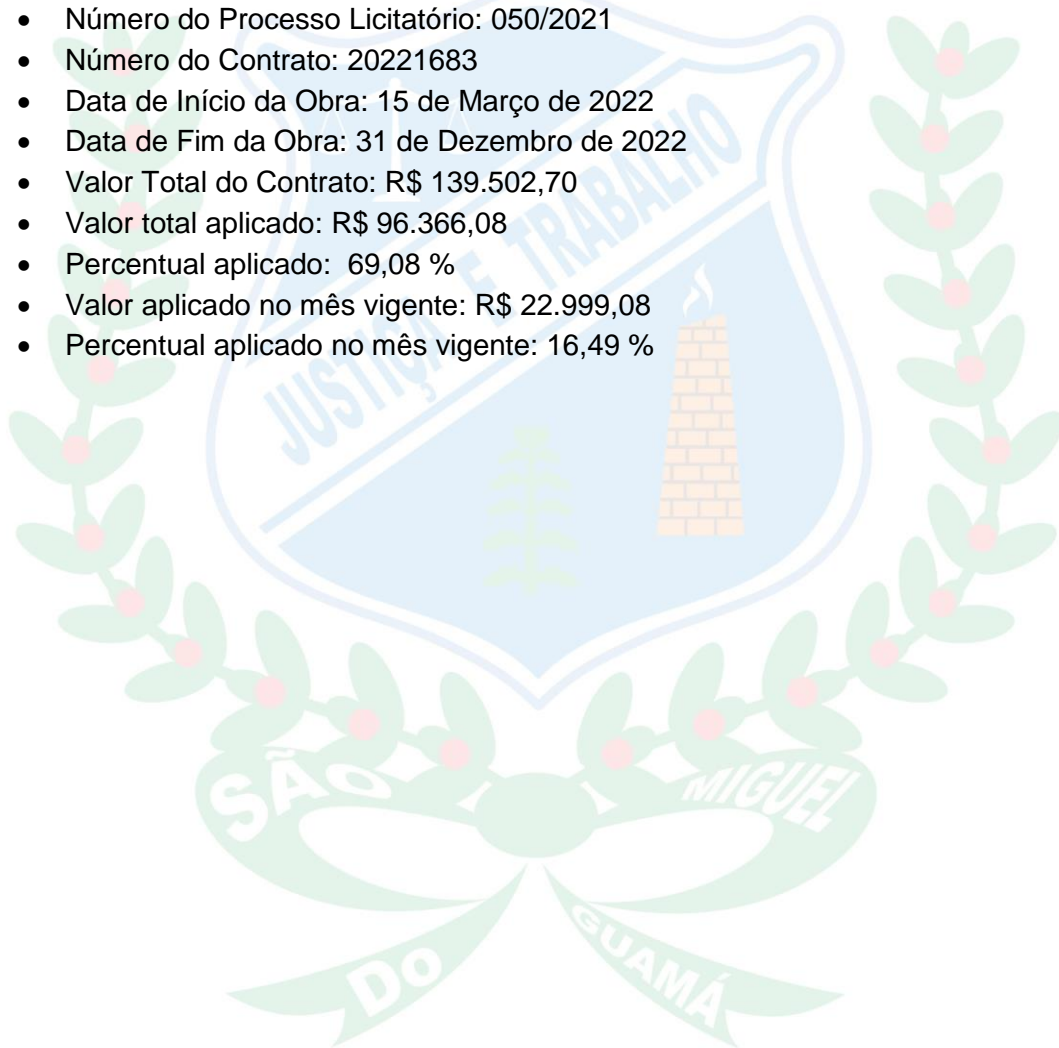





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Socorro Machado – Maurício Ataíde
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20221683
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 139.502,70
- Valor total aplicado: R\$ 96.366,08
- Percentual aplicado: 69,08 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 8.832,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 6,33 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Passagem das Pedras – Perpétuo Socorro
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20221683
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 139.502,70
- Valor total aplicado: R\$ 96.366,08
- Percentual aplicado: 69,08 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 3.904,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 2,80 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Presidente Médice – Perpétuo Socorro
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20221683
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 139.502,70
- Valor total aplicado: R\$ 96.366,08
- Percentual aplicado: 69,08 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 7.232,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 5,18 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Presidente Médice – Perpétuo Socorro
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20221683
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 139.502,70
- Valor total aplicado: R\$ 96.366,08
- Percentual aplicado: 69,08 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 4.480,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 3,21 %







- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Aluísio Pedro de Farias – Padre Ângelo
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20221683
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 139.502,70
- Valor total aplicado: R\$ 96.366,08
- Percentual aplicado: 69,08 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 24.608,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 17,64 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Passagem Sítio Lisboa – Perpétuo Socorro
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20221683
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 139.502,70
- Valor total aplicado: R\$ 96.366,08
- Percentual aplicado: 69,08 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 7.040,00
- Percentual aplicado no mês vigente: 5,05 %

