



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - Maio

- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Final da Arquimedes Ataíde.
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 72.398,58
- Percentual aplicado: 24,97 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 72.398,58
- Percentual aplicado no mês vigente: 24,97 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 18.807,12
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 6,49%



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Dona Ilza
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 72.398,58
- Percentual aplicado: 24,97 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 72.398,58
- Percentual aplicado no mês vigente: 24,97 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 7.140,89
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 2,46 %






- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Antônio Piauí
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 72.398,58
- Percentual aplicado: 24,97 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 72.398,58
- Percentual aplicado no mês vigente: 24,97 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 6.164,76
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 2,13 %






- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua da Coca Cola
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222768
- Data de Início da Obra: 09 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Agosto de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 289.934,10
- Valor total aplicado: R\$ 72.398,58
- Percentual aplicado: 24,97 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 72.398,58
- Percentual aplicado no mês vigente: 24,97 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 40.285,81
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 13,89 %

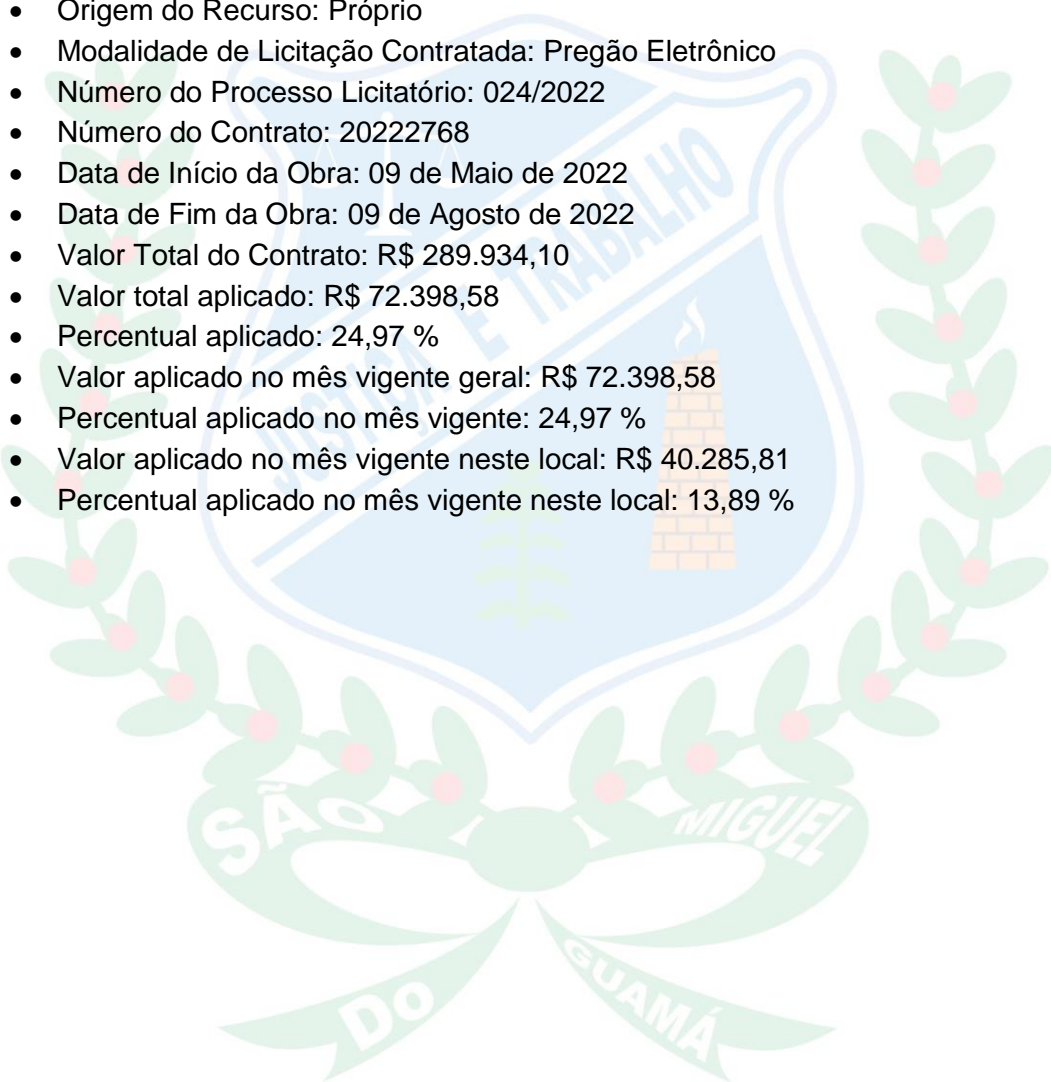




- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Passagem Felipe Brito (EMEF Raimunda Pinho).
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222765
- Data de Início da Obra: 06 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 904.659,52
- Valor total aplicado: R\$ 420.204,87
- Percentual aplicado: 46,45 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 420.204,87
- Percentual aplicado no mês vigente: 46,45 %

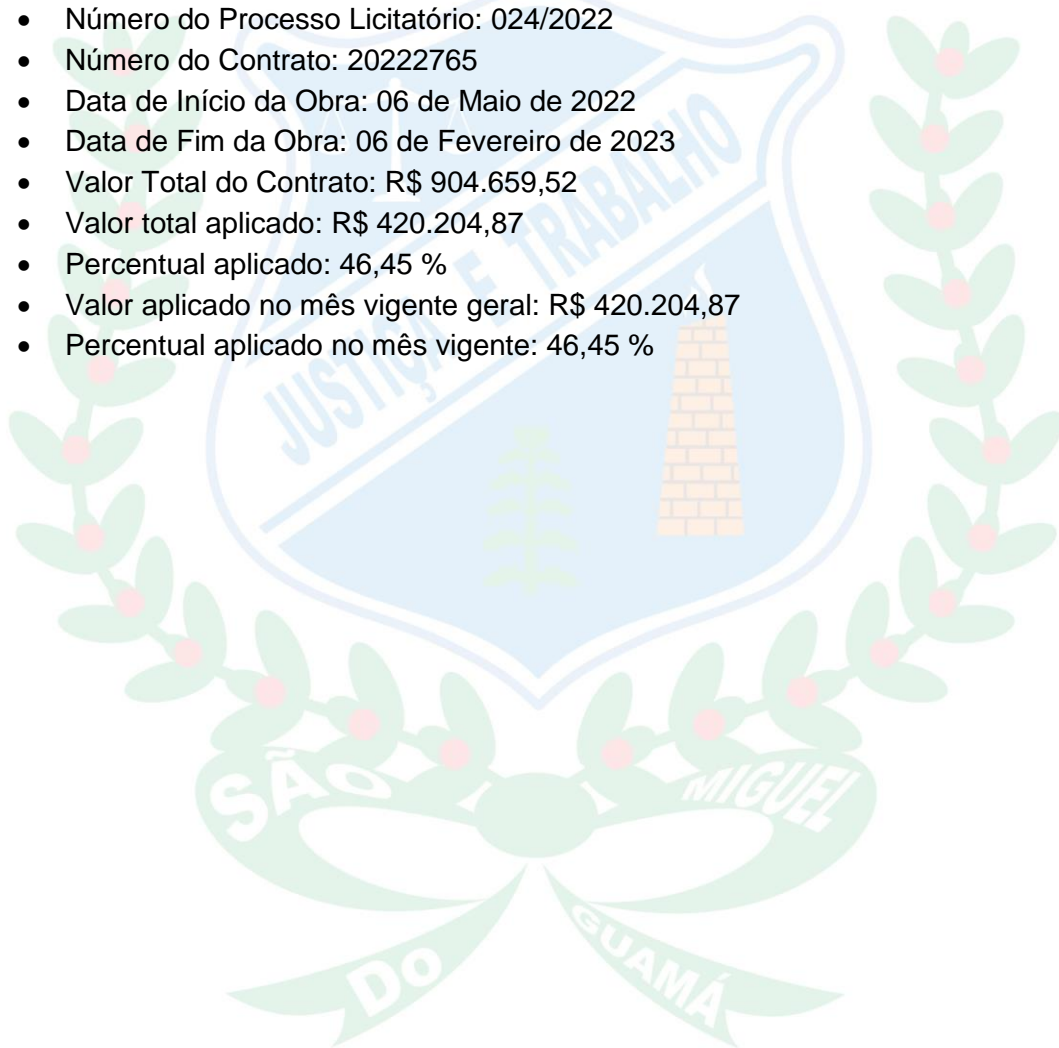




- Objeto da Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde no bairro Padre Ângelo, no município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel de Bulhões s/n, Padre Ângelo
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-002
- Número do Contrato: 202102018
- Data de Início da Obra: 17 de novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 17 de maio de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.172.412,70
- Valor total aplicado: R\$ 515.861,59
- Percentual aplicado: 44,00 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 515.861,59
- Percentual aplicado no mês vigente: 44,00 %

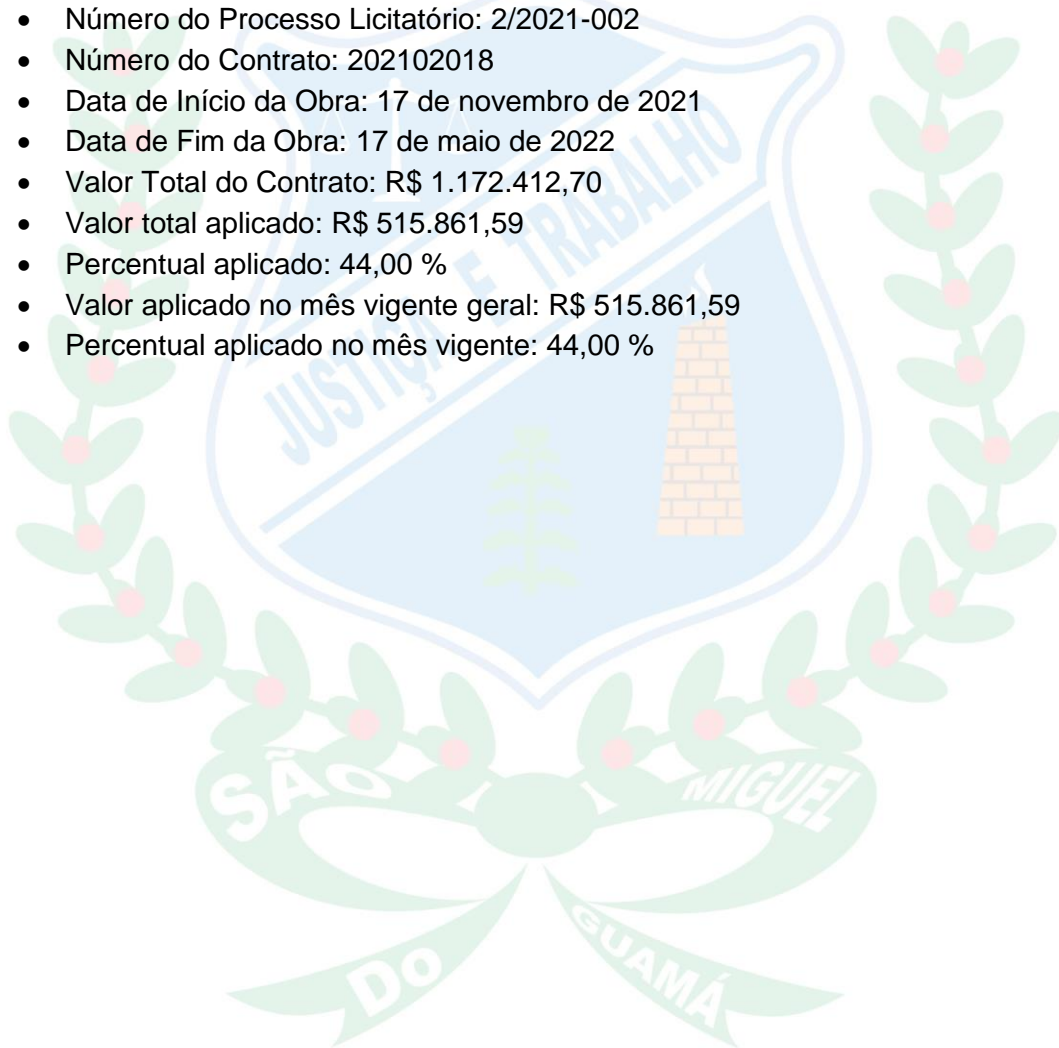




- Objeto da Obra: Pavimentação Asfáltica, Drenagem superficial, e sinalização do bairro das Palmeiras, no município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas Ruas do Bairro das Palmeiras e Estrada Fortaleza
- Origem do Recurso: Convênio entre Prefeitura de São Miguel do Guamá e SEDOP.
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-001
- Número do Contrato: 20222684
- Data de Início da Obra: 12 de Abril de 2022
- Data de Fim da Obra: 09 de Outubro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 5.207.750,23
- Valor total aplicado: R\$ 424.584,12
- Percentual aplicado: 8,15 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 424.854,12
- Percentual aplicado no mês vigente: 8,15 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Presidente Médice
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 274.569,12
- Percentual aplicado: 86,78 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 100.521,60
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 31,77 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 17.920,00
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 5,66 %

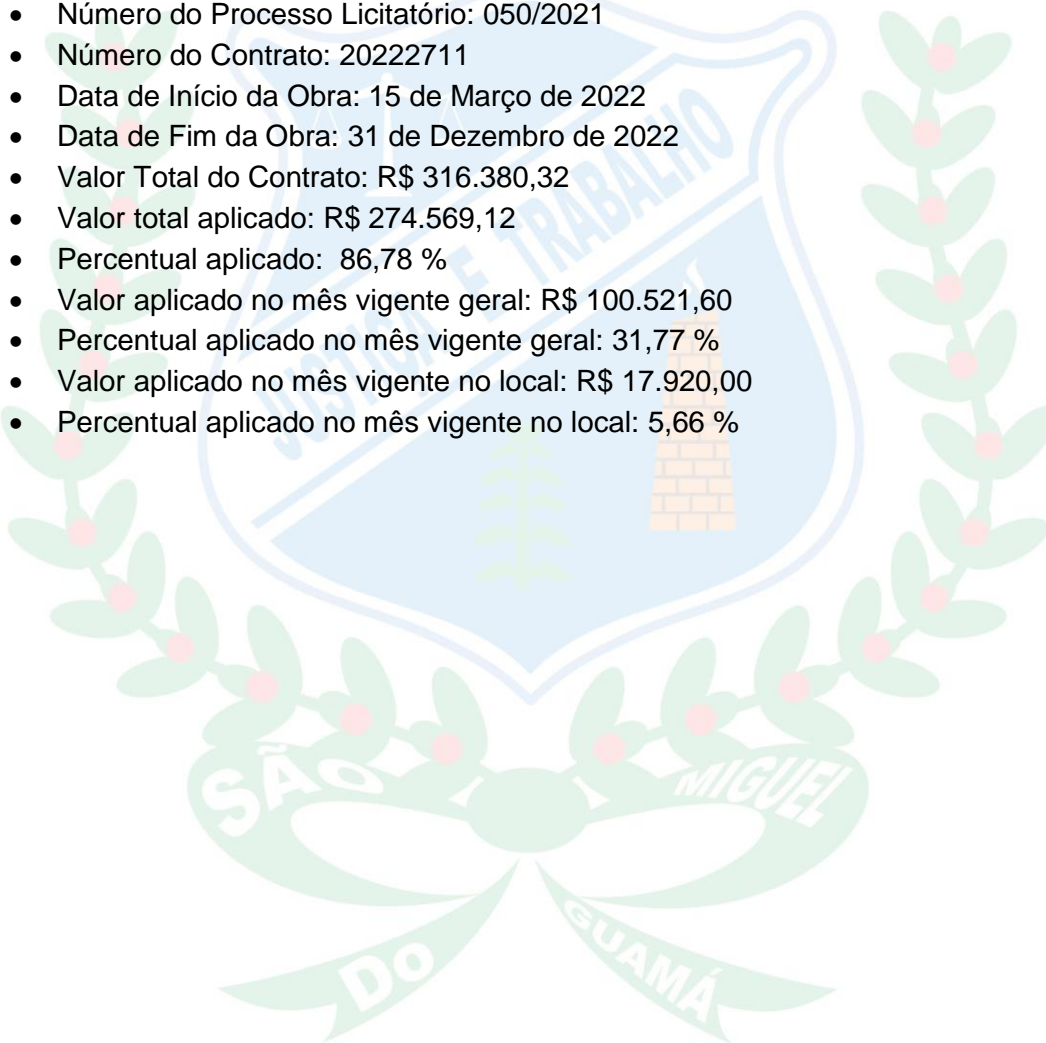



- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Jerônimo Tavares
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 274.569,12
- Percentual aplicado: 86,78 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 100.521,60
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 31,77 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 15.360,00
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 4,85 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Gomes de Oliveira
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 274.569,12
- Percentual aplicado: 86,78 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 100.521,60
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 31,77 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 10.240,00
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 3,24 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Andraci Viana de Carvalho
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 274.569,12
- Percentual aplicado: 86,78 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 100.521,60
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 31,77 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 6.812,80
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 2,15 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Dona Ilza
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 274.569,12
- Percentual aplicado: 86,78 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 100.521,60
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 31,77 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 10.700,80
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 3,38 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Santa Luzia
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 274.569,12
- Percentual aplicado: 86,78 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 100.521,60
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 31,77 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 7.033,60
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 2,22 %






- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Mucajá – Entre Cajual e Coca Cola
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 274.569,12
- Percentual aplicado: 86,78 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 100.521,60
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 31,77 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 5.027,20
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 1,59 %






- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua da Coca-Cola – Entre Felipe Brito e Januário C Godim
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 274.569,12
- Percentual aplicado: 86,78 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 100.521,60
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 31,77 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 9.414,40
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 2,98 %

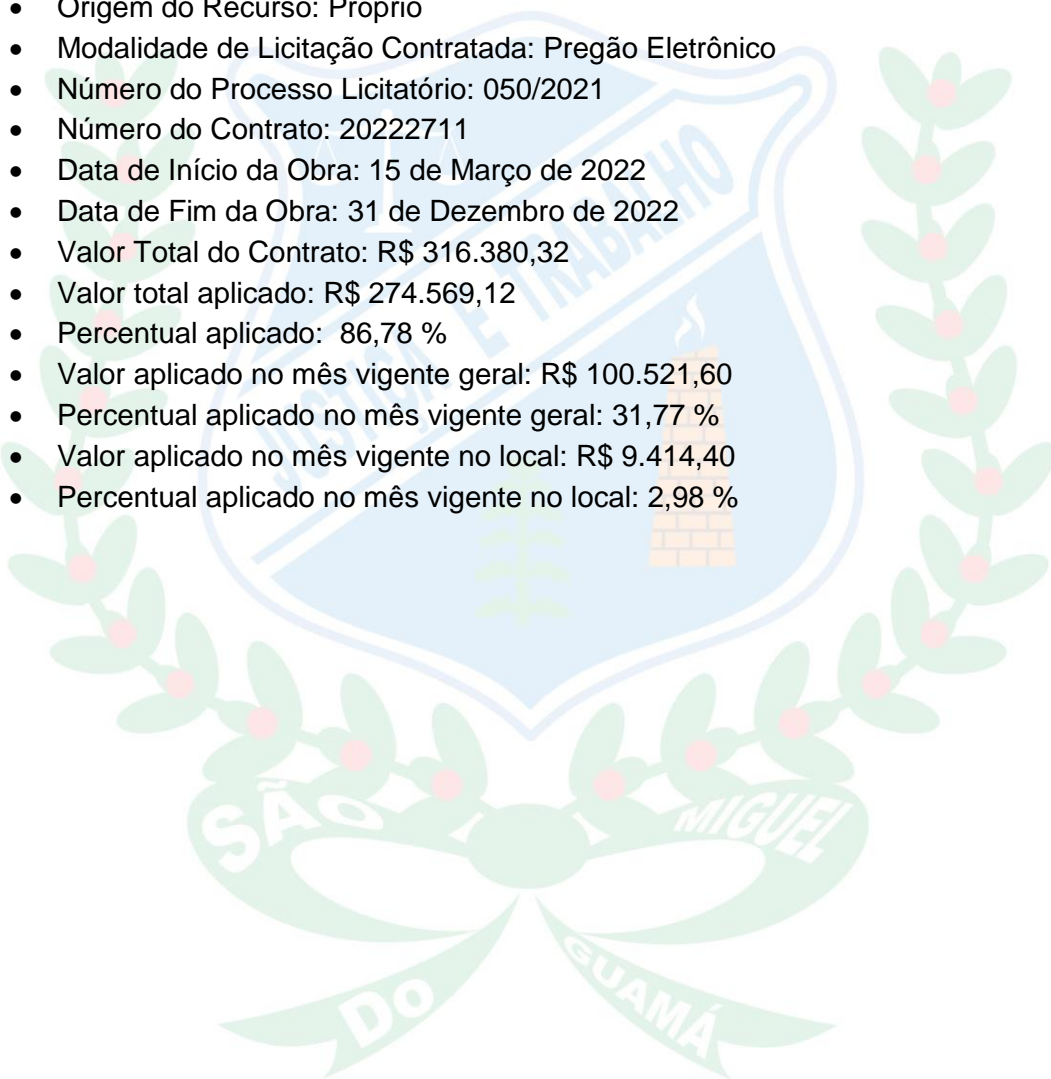




- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua da Coca-Cola – Entre Januário C Godim Filho e Mucajá
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 274.569,12
- Percentual aplicado: 86,78 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 100.521,60
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 31,77 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 15.737,60
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 4,97 %





- Objeto da Obra: Construção e recomposição de meio fio, passeio público e calçamento de praças – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Projetar Edificação e Pavimentação Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Antônio Piauí – Entre Januário C Godim até o final
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20222711
- Data de Início da Obra: 15 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 31 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 316.380,32
- Valor total aplicado: R\$ 274.569,12
- Percentual aplicado: 86,78 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 100.521,60
- Percentual aplicado no mês vigente geral: 31,77 %
- Valor aplicado no mês vigente no local: R\$ 2.275,20
- Percentual aplicado no mês vigente no local: 0,72 %

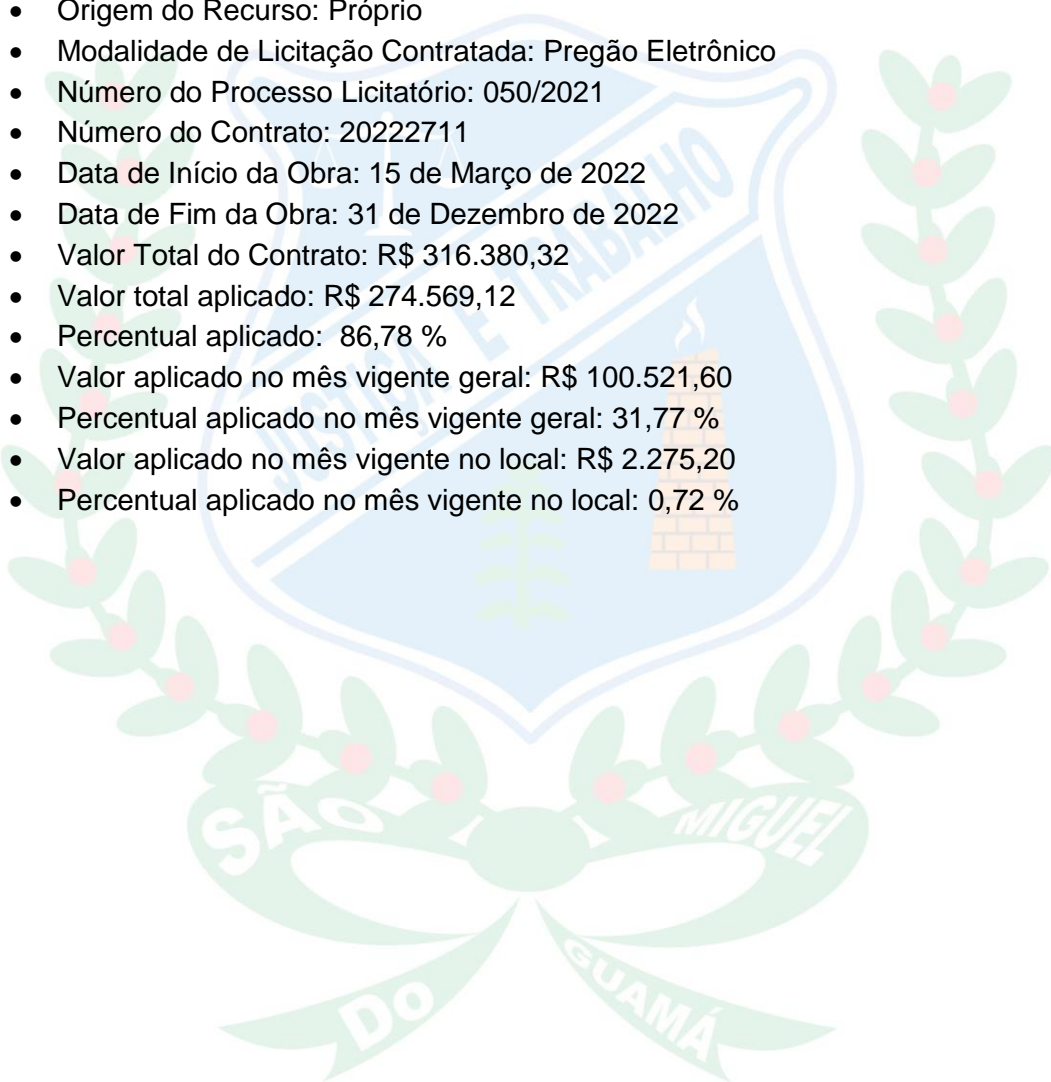



- Objeto da Obra: Construção do Prédio da EMEF Raimunda de Oliveira Machado – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Transterra Logística e Empreendimentos LTDA.
- Local de Execução da Obra: Av Cipriano Mendes – sn.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20217818
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.655.510,74
- Valor total aplicado: R\$ 104.297,18
- Percentual aplicado: 6,30 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 46.354,30
- Percentual aplicado no mês vigente: 2,80 %

