



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Setembro

---

- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Pavimentação e Bloquetagem da Rua Filemon da Cunha Bicho
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222870
- Data de Início da Obra: 20 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 20 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 336.606,35
- Valor total aplicado: R\$ 154.804,88
- Percentual aplicado: 45,99 %
- Valor aplicado no mês vigente geral: R\$ 50.483,95
- Percentual aplicado no mês vigente: 15,00 %
- Valor aplicado no mês vigente neste local: R\$ 50.483,95
- Percentual aplicado no mês vigente neste local: 15,00 %



- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Mão de Obra para Construção do Posto de Saúde de Santa Rita de Barreiras
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222824
- Data de Início da Obra: 14 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 15 de Maio de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 87.359,24
- Valor total aplicado: R\$ 55.648,91
- Percentual aplicado: 63,70 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 12.560,81
- Percentual aplicado no mês vigente: 14,38 %






- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de infraestrutura – prédios, praças e logradouros públicos.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Complexo do “DNIT”
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222821
- Data de Início da Obra: 06 de Junho de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 274.982,64
- Valor total aplicado: R\$ 227.713,83
- Percentual aplicado: 82,81 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 59.536,35
- Percentual aplicado no mês vigente: 21,65 %





- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação de prédios da Secretaria de Saúde – (Reforço Estrutural, instalações elétricas e adaptações no fosso do elevador do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá)
- Nome do Contratado: Top Level Construtora.
- Local de Execução da Obra: Hospital Municipal de São Miguel do Guamá
- Origem do Recurso: Próprio
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222873
- Data de Início da Obra: 19 de Agosto de 2022
- Data de Fim da Obra: 19 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 49.403,23
- Valor total aplicado: R\$ 49.403,23
- Percentual aplicado: 100,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 49.403,23
- Percentual aplicado no mês vigente: 100,00 %

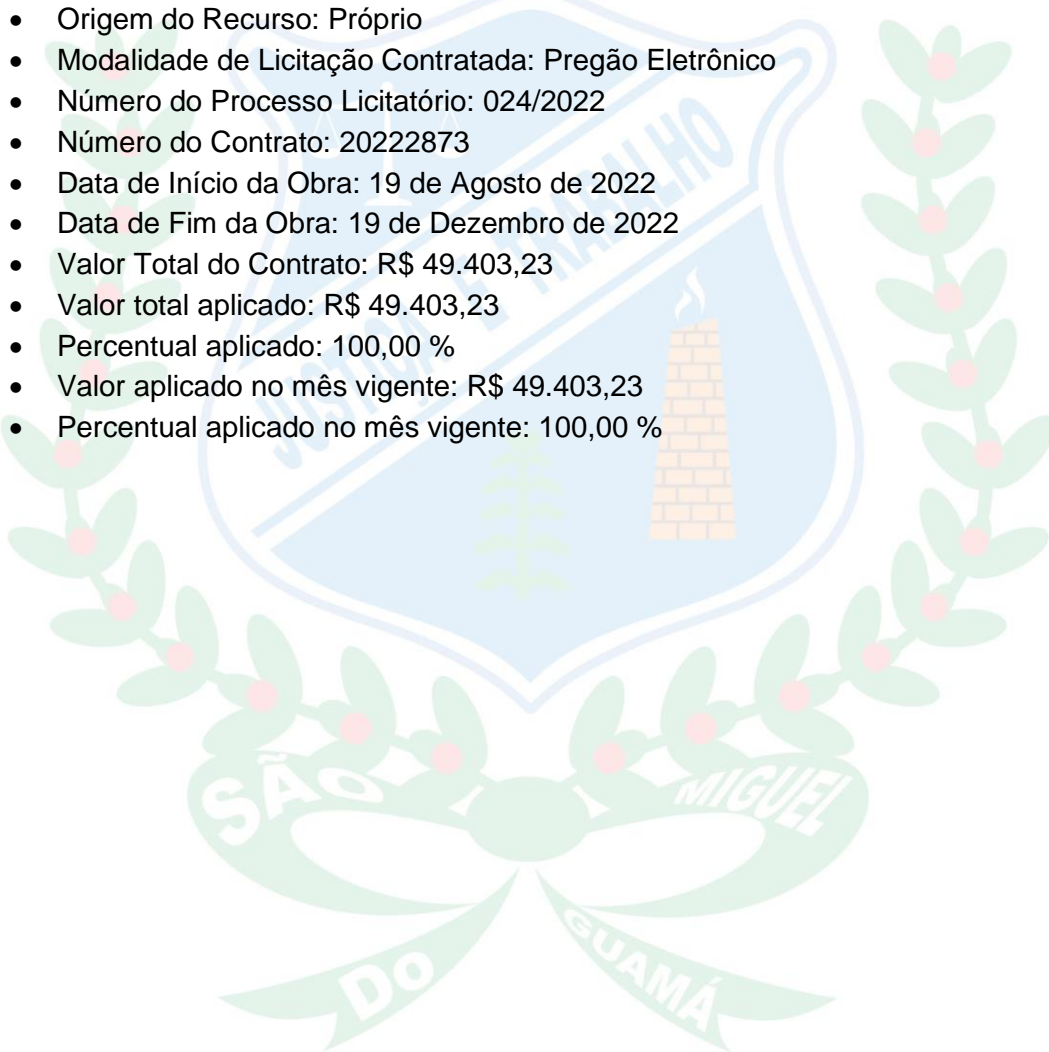




- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Passagem Felipe Brito (EMEF Raimunda Pinho).
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222765
- Data de Início da Obra: 06 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 904.659,52
- Valor do Aditivo: R\$ 337.244,40
- Percentual do aditivo: 37,28 %
- Valor Total com Aditivo: 1.241.903,92
- Valor total aplicado: R\$ 1.241.903,92
- Percentual aplicado: 127,16 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 337.244,40
- Percentual aplicado no mês vigente: 27,16 %






- Objeto da Obra: Reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação das demandas da secretaria de educação – escolas.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Fernando Cruz (EMEF Padre Leandro Pinheiro).
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão Eletrônico
- Número do Processo Licitatório: 024/2022
- Número do Contrato: 20222773
- Data de Início da Obra: 10 de Maio de 2022
- Data de Fim da Obra: 10 de Fevereiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.122.215,47
- Valor do Aditivo: R\$ 390.791,64
- Percentual do Aditivo: 34,82 %
- Valor Total com Aditivo: R\$ 1.513.007,11
- Valor total aplicado: R\$ 1.373.087,49
- Percentual aplicado: 122,36 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 250.872,02
- Percentual aplicado no mês vigente: 22,36 %

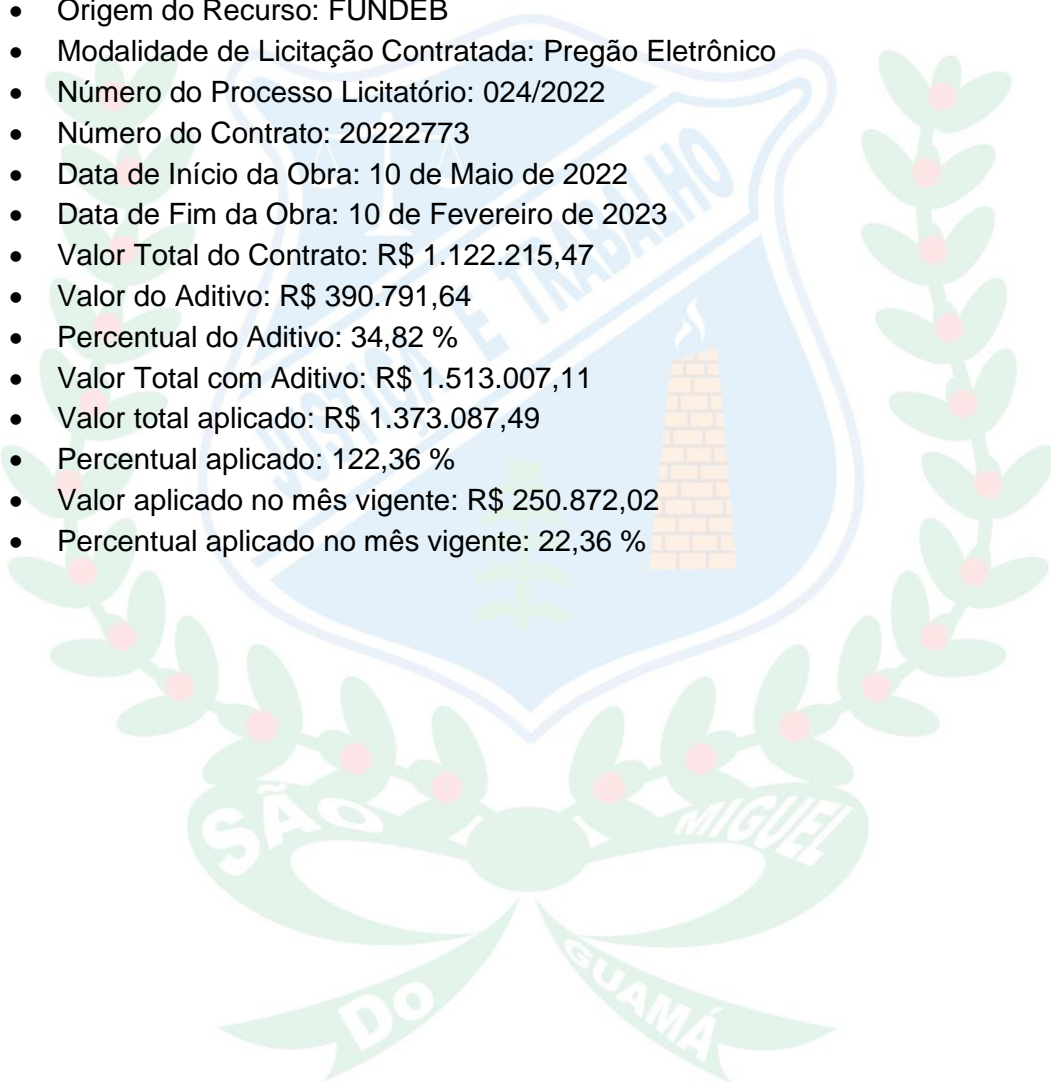




- Objeto da Obra: Reforma do Posto de Saúde do Perpétuo Socorro.
- Nome do Contratado: Konkreta Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Rua Frei Miguel Com Agostinho Siqueira.
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-001
- Número do Contrato: 20221647
- Data de Início da Obra: 10 de Março de 2022
- Data de Fim da Obra: 06 de Setembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 461.271,93
- Valor total aplicado: R\$ 325.565,72
- Percentual aplicado: 70,58 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 100.695,66
- Percentual aplicado no mês vigente: 21,83 %

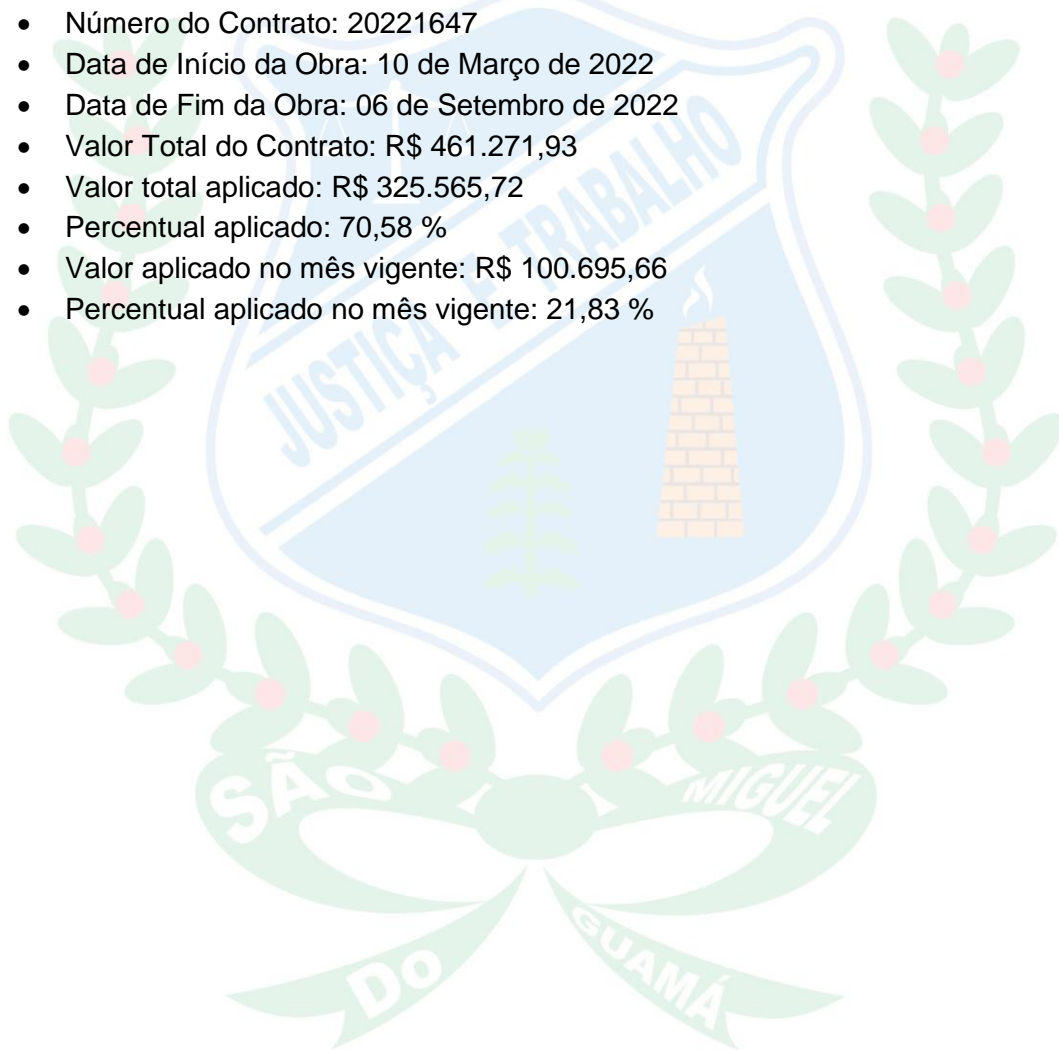




- Objeto da Obra: Construção do Prédio da EMEF Raimunda de Oliveira Machado – São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Transterra Logística e Empreendimentos LTDA.
- Local de Execução da Obra: Av Cipriano Mendes – sn.
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 050/2021
- Número do Contrato: 20217818
- Data de Início da Obra: 22 de Novembro de 2021
- Data de Fim da Obra: 22 de Novembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 1.655.510,74
- Valor total aplicado: R\$ 616.843,31
- Percentual aplicado: 37,26 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 124.163,31
- Percentual aplicado no mês vigente: 7,50 %








- Objeto da Obra: Construção da EMEF DR Antônio do Carmo Barbosa, zona rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Adiel Reis Erelí.
- Local de Execução da Obra: Comunidade Santo Antônio
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 02/2022-005
- Número do Contrato: 20222845
- Data de Início da Obra: 21 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 19 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 791.998,72
- Valor total aplicado: R\$ 110.087,82
- Percentual aplicado: 13,90 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 110.087,82
- Percentual aplicado no mês vigente: 13,90 %

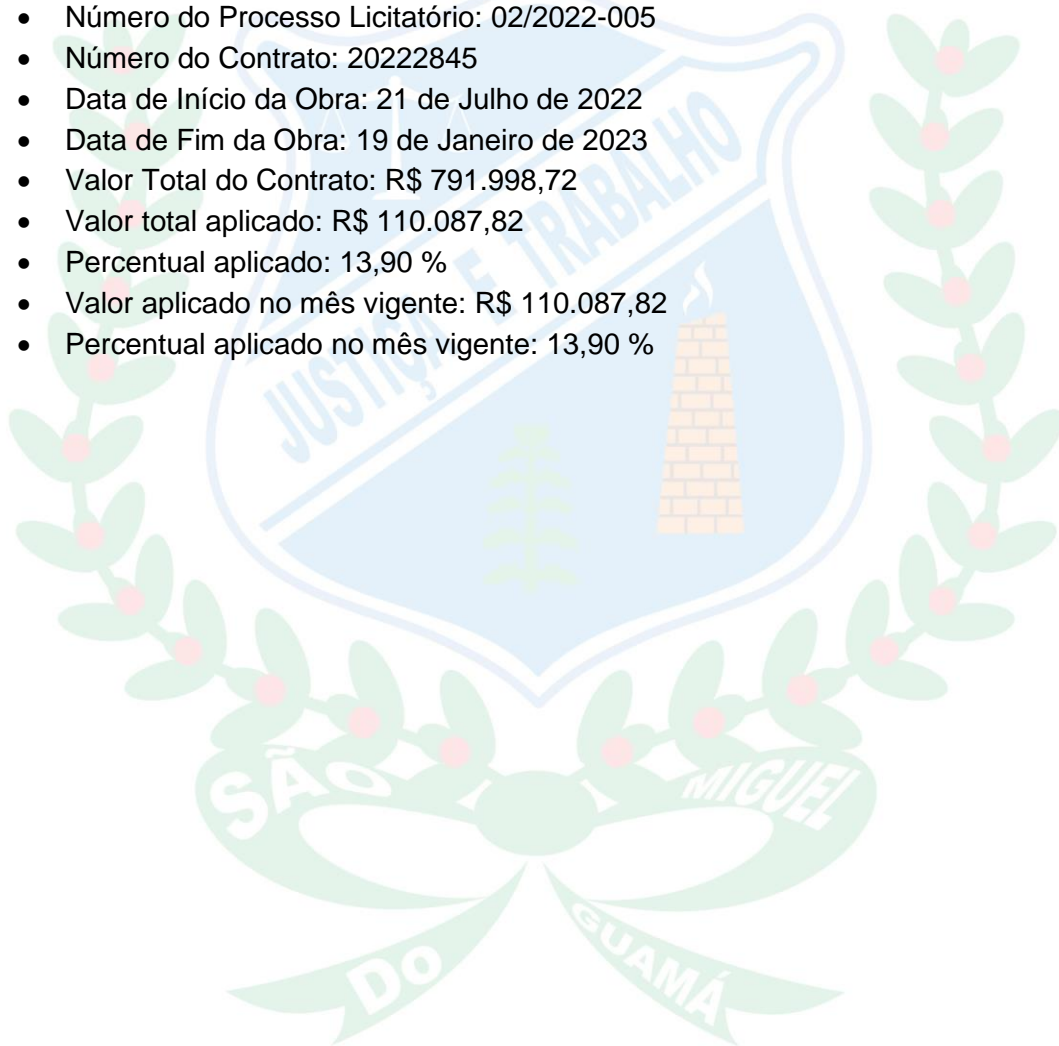




- Objeto da Obra: Construção da EMEF Matilde de Júlia Castro, zona rural do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: W M Construções e Serviços LTDA.
- Local de Execução da Obra: Comunidade da Fronteira
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 02/2022-005
- Número do Contrato: 20222846
- Data de Início da Obra: 21 de Julho de 2022
- Data de Fim da Obra: 19 de Janeiro de 2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 778.140,54
- Valor total aplicado: R\$ 97.656,64
- Percentual aplicado: 12,55 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 97.656,64
- Percentual aplicado no mês vigente: 12,55 %

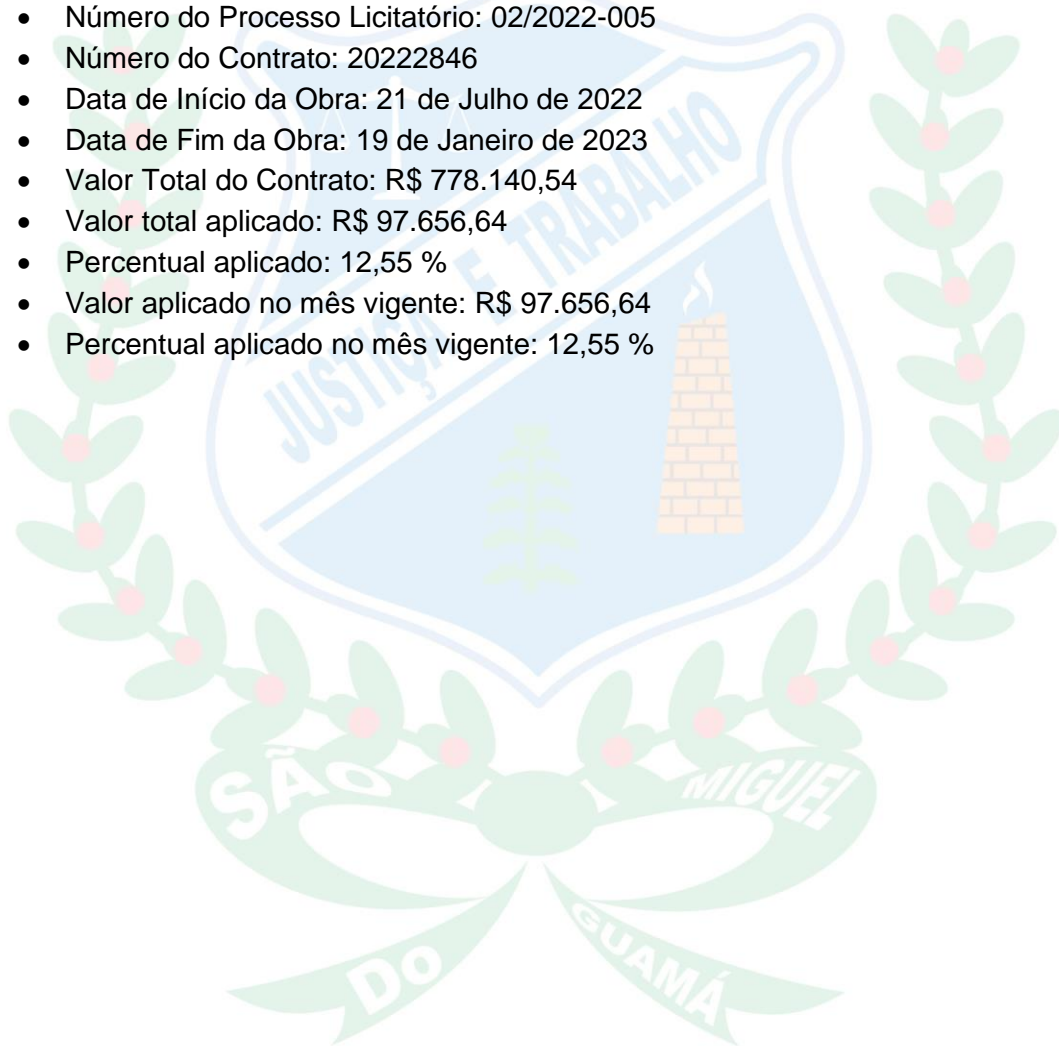



- Objeto da Obra: Revitalização da orla do Rio Guamá (2ª Etapa)
- Nome do Contratado: M & B Engenharia LTDA
- Local de Execução da Obra: Orla do Rio Guamá
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-006
- Número do Contrato: 20222803
- Data de Início da Obra: 21 de Junho de 2021
- Data de Fim da Obra: 21 de dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 968.890,03
- Valor total aplicado: R\$ 379.514,23
- Percentual aplicado: 39,17 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 129.637,49
- Percentual aplicado no mês vigente: 13,38 %

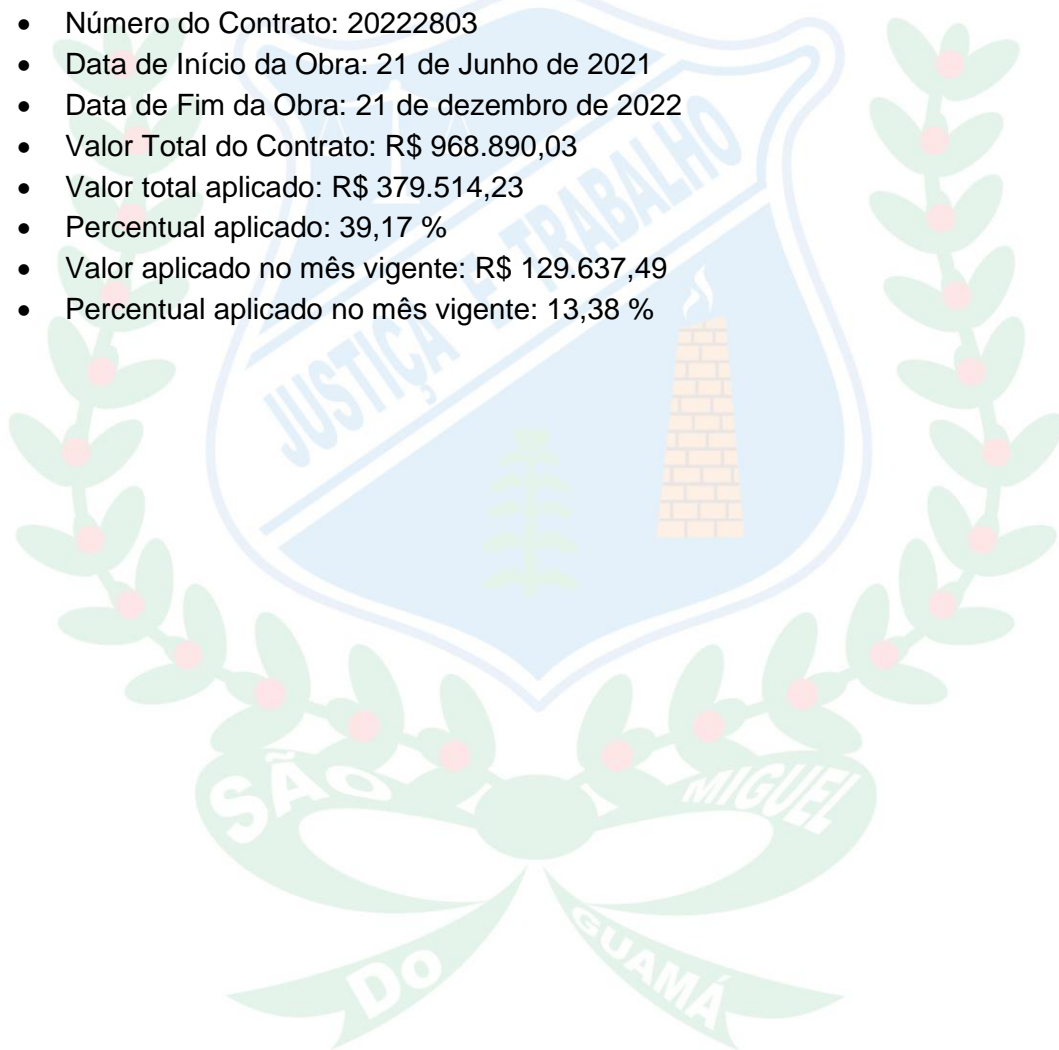




- Objeto da Obra: Recuperação Asfáltica de vias urbanas de São Miguel do Guamá de acordo com convênio SEDOP nº 121/2022 celebrado entre SEDOP e Prefeitura de São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Raimundo Guerreiro e outras ruas – São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Governo do Estado – SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-005
- Número do Contrato: 20222884
- Data de Início da Obra: 26 de Agosto de 2022
- Data de Fim da Obra: 25 de Fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 5.265.354,40
- Valor total aplicado: R\$ 1.213.664,19
- Percentual aplicado: 23,05 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.213.664,19
- Percentual aplicado no mês vigente: 23,05 %





- Objeto da Obra: Recuperação Asfáltica de vias urbanas de São Miguel do Guamá de acordo com convênio SEDOP nº 114/2022 celebrado entre SEDOP e Prefeitura de São Miguel do Guamá
- Nome do Contratado: Império Pavimentações e Locações Eireli.
- Local de Execução da Obra: Bairro Perpétuo Socorro, São Manoel e outras vias – São Miguel do Guamá.
- Origem do Recurso: Governo do Estado – SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-004
- Número do Contrato: 20222883
- Data de Início da Obra: 25 de Agosto de 2022
- Data de Fim da Obra: 25 de Fevereiro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.647.717,64
- Valor total aplicado: R\$ 769.813,67
- Percentual aplicado: 46,72 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 769.813,67
- Percentual aplicado no mês vigente: 46,72 %

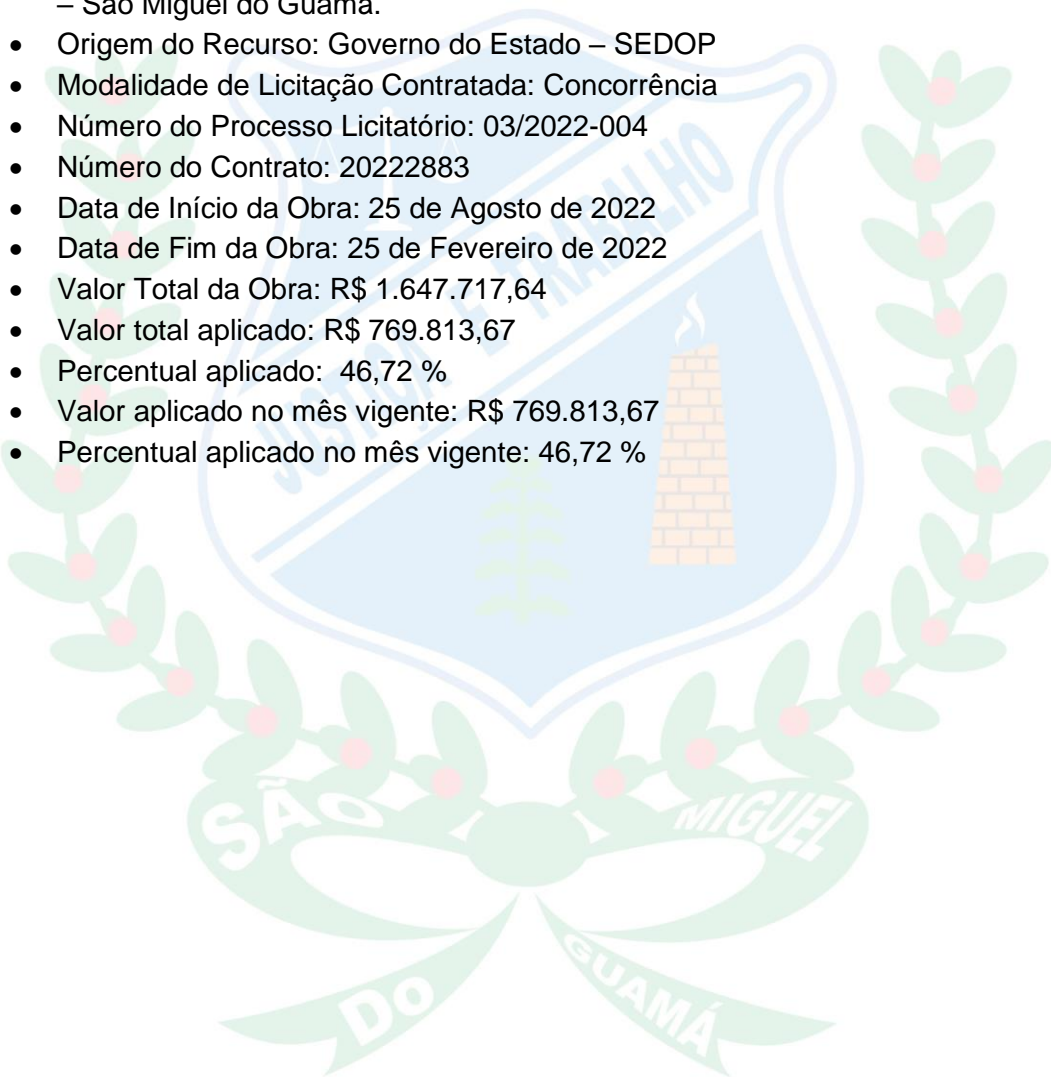



- Objeto da Obra: Pavimentação em bloquetes de vias urbanas do município de São Miguel do Guamá.
- Nome do Contratado: Mais Brasil Construtora Eireli.
- Local de Execução da Obra: Diversas Ruas do Bairro da Portelinha e Rua Feliciano da Costa
- Origem do Recurso: Emenda Parlamentar
- Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência
- Número do Processo Licitatório: 03/2022-006
- Número do Contrato: 20222881
- Data de Início da Obra: 19 de Agosto de 2022
- Data de Fim da Obra: 19 de Dezembro de 2022
- Valor Total do Contrato: R\$ 700.099,77
- Valor total aplicado: R\$ 402.047,28
- Percentual aplicado: 57,00 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 402.047,77
- Percentual aplicado no mês vigente: 57,00 %

